

프로젝트 관리

BASIC_INTERNATIONAL

2023.07

Table of Contents

1. Project Management
2. Basic Method

Chapter 1

Project Management


프로젝트란?




라틴어에서 유래,
미래를 향해(pro-) 던지다(-jacere)의 합성어

어떤 목적을 위해서 던지다.

Pro - 미리 토는 ~을 위해서



Ject - 던지다 토는 해보다



인류 역사 속의 프로젝트?

쿠프왕의 대피라미드

- ✓ 4천 7백년 전 건설
- ✓ 넓이: 227m
- ✓ 높이: 148m
- ✓ 돌하나의 평균 무게: 2.5 톤
- ✓ 동원 인력: 10만 명
- ✓ 제작 기간: 20년



만리장성

- ✓ 기원전 220년 건설
- ✓ 길이: 5,000~6,000km
- ✓ 동원 인력: 150만 명
- ✓ 제작 기간: 1,000년



현대의 프로젝트?

유일한 제품, 서비스 또는 결과를 창출
하기 위하여 수행하는 **한시적인 활동**

A PROJECT IS A TEMPORARY ENDEAVOR UNDERTAKEN TO CREATE
A UNIQUE PROJECT, SERVICE, OR RESULT

프로젝트의 목표 달성을 위하여 수행되는 **고유한 프로세스**
의 집합으로 구성되며, 프로세스는 **시작일과 종료일이**
정해져 있고 조정되고 통제 되는 활동으로 이루어진다.

A PROJECT CONSISTS OF A UNIQUE SET OF PROCESSES CONSISTING OF
COORDINATED AND CONTROLLED ACTIVITIES WITH START AND END DATES,
PERFORMED TO ACHIEVE PROJECT OBJECTIVES

프로젝트의 세가지 특징

Temporary

프로젝트는 명확한 시작과 종료가 있다.

Unique

프로젝트는 유일한 Product 이나 Service 를 만든다.

Progressive Elaboration

프로젝트는 계획수립과정 등은 점진적으로 구체화된다.

Project와 Operation의 차이

Project

사업의 목적 달성을 위한 일시적(Temporary)이며, 유일한(Unique) 업무

Operation

사업의 목적 달성을 위한 지속적(On-Going)이며, 반복적(Repetitive)인 업무

Project와 Operation의 차이



공통점

1. 사람이 수행한다.
2. 제한된 자원에 제약을 받는다.
3. 계획, 실행 및 통제된다.

Project

1. Temporary(일시적)
2. Unique(유일성)
3. Progressive Elaboration(점진적 구체화)

Operation

1. On-Going(지속적)
2. Repetitive(반복적)

프로젝트 관리란?

프로젝트 관리는 프로젝트 요구사항을 충족시키기 위 하여 **지식, 기능, 도구 및 기법**을 프로젝트 활동 에 적용시키는 것


THE APPLICATION OF KNOWLEDGE, SKILLS, TOOLS, AND TECHNIQUES TO PROJECT
ACTIVITIES TO MEET PROJECT REQUIREMENTS

프로젝트 관리의 구성 요소

1. 요구사항(Requirement)의 정의 및 식별
2. 명확하고 달성 가능한 프로젝트 목표 수립
3. 품질, 범위, 일정, 원가에 대한 경쟁적 요구에 대한 균형
4. 다양한 이해관계자들의 서로 다른 관심과 기대에 대한 사양
(Specification), 계획(Plan), 접근 방법(Approach)을 적용


프로젝트 관리의 제약 조건

- ✓ 프로젝트의 범위, 일정, 원가는 서로 상충 관계로, 어느 한 가지가 변경될 경우 다른 요소에 영향을 미친다.
- ✓ 3가지 요소 사이의 균형이 프로젝트의 품질에 영향을 준다.

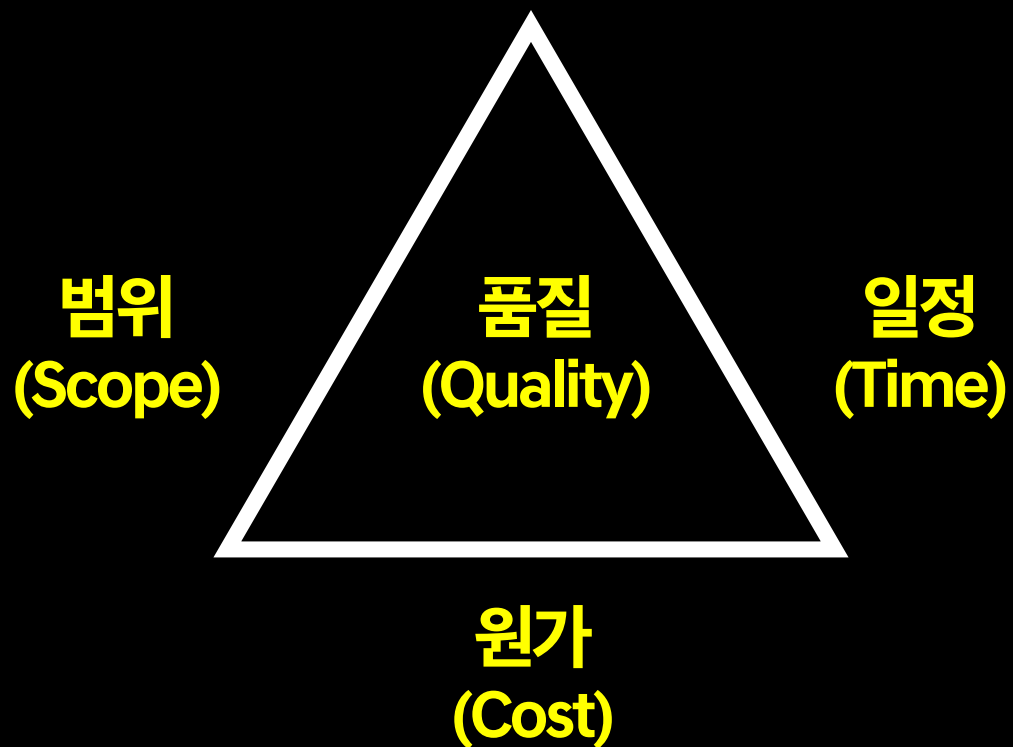

프로젝트 관리에 필요한 전문 지식

1. **프로젝트관리 지식 체계**
(The Project Management Body of Knowledge)
2. **응용 분야의 지식, 표준, 법규**
(Application area knowledge, standards, and regulations)
3. **프로젝트 환경에 대한 이해**
(Understanding the project environment)
4. **일반적인 관리 지식 및 기술**
(General management knowledge and skills)
5. **대인관계 기술**
(Interpersonal Skills)

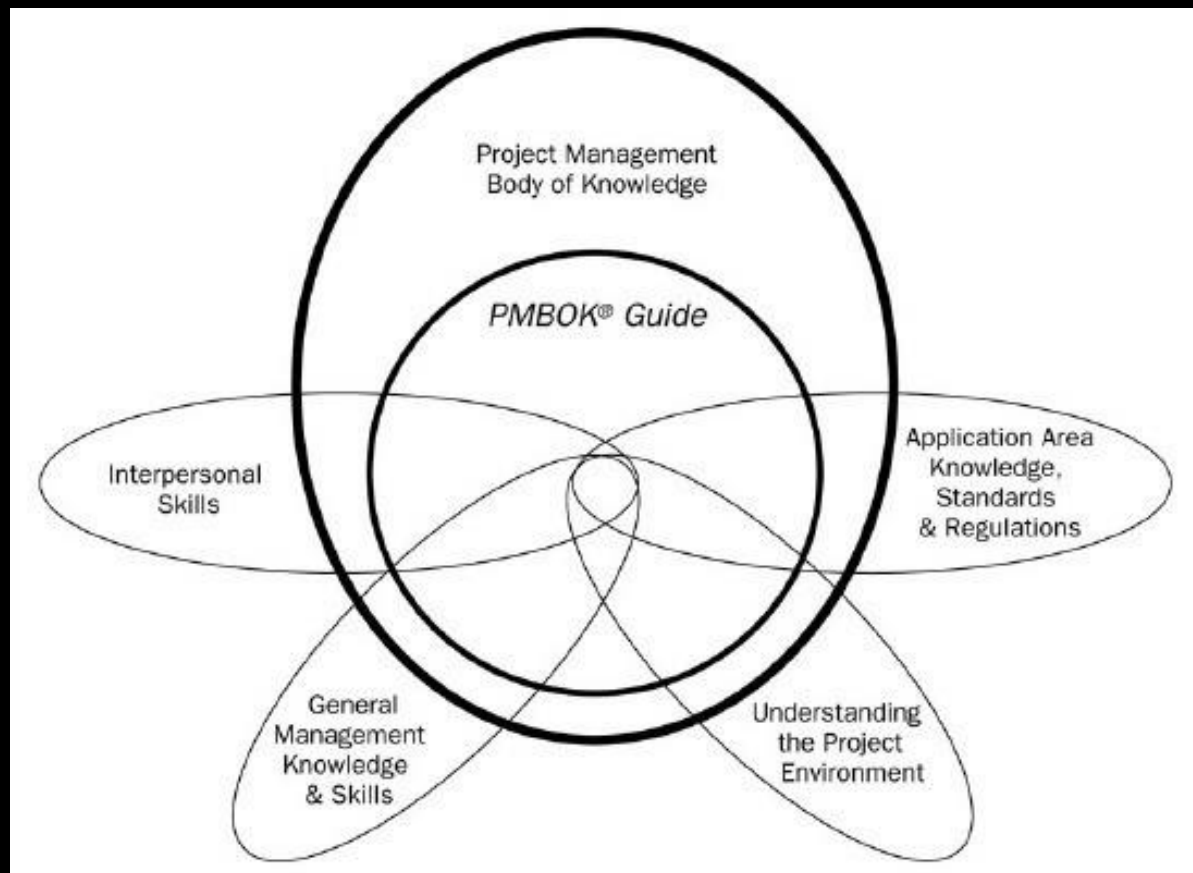

1. 대표적인 프로젝트 관리 지식 체계

- ✓ PMI의 PMBOK Guide
- ✓ ISO 21500
- ✓ PRINCE2

PMBOK Guide

- ✓ 미국 PMI에서 1983년 발간을 시작하여 계속된
개정을 거쳐 현재 7판 (2019년) 까지 발간
- ✓ 10개의 지식영역과 5개의 프로세스 그룹에 따
라 47개의 논리적으로 연결된 프로세스로 구성

지식영역	프로세스 그룹					프로세스 수
	착수 (Initiating)	기획 (Planning)	실행 (Executing)	감시및통제 (Monitoring & Controlling)	종료 (Closing)	
통합관리	프로젝트헌장 개발	프로젝트관리 계획개발	프로젝트작업 지시/관리	프로젝트작업 감시/통제 통합변경통제	프로젝트 또는 단계 종료	6
범위 관리		범위관리계획 요구사항수집 범위정의 WBS작성		범위검증 범위통제		6
일정 관리		일정관리계획 활동정의 활동순서배열 활동자원산정 활동기간산정 일정개발		일정통제		7
원가관리		원가관리계획 원가산정 예산편성		원가통제		4
품질 관리		품질계획	품질보증수행	품질통제		3
인적자원관리		인적자원관리 계획	프로젝트팀확보 프로젝트팀개발 프로젝트팀관리			4
의사소통관리		의사소통관리 계획	의사소통관리	의사소통통제		3
위험 관리		위험관리계획 위험식별 정성적위험분석 정량적위험분석 위험대응계획		위험통제		6
조달관리		조달관리계획	조달수행	조달통제	조달종료	4
이해관계자 관리	이해관계자식 별	이해관계자관 리계획	이해관계자참 여관리	이해관계자참 여통제		4
프로세스 수	2	24	8	11	2	47

ISO 21500

- ✓ 국제표준화기구(ISO)에 의해 개발된 프로젝트 관리 국제표준(37개국에서 참여하여 2012년 9월1일에 발표)
- ✓ PMBOK Guide와 유사하게 10개 주제 그룹과 5개의 프로세스그룹에 따라 논리적으로 연결된 39개의 프로세스들로 구성
- ✓ 우리나라는 2013년 11월에 ISO 21500 이행 가이드 개발(기술표준원)

주제그룹	프로세스 그룹					프로세스 수
	착수 (Initiating)	기획 (Planning)	실행 (Implementing)	통제 (Controlling)	종료 (Closing)	
통합관리	프로젝트헌장 개발	프로젝트관리 계획개발	프로젝트작업 지시	프로젝트작업 통제 변경통제	프로젝트 또는 단계 종료 교훈수집	7
범위 관리		범위정의 WBS작성 활동정의		범위통제		4
일정 관리		활동순서배열 활동기간산정 일정개발		일정통제		4
원가관리		원가산정 예산편성		원가통제		3
품질 관리		품질관리계획	품질보증수행	품질통제		3
자원 관리	프로젝트팀편성	자원선정 프로젝트조직 정의	프로젝트팀개발	자원통제 프로젝트팀관리		6
의사소통 관리		의사소통관리 계획	정보배포	의사소통관리		3
위험 관리		위험식별 위험평가	위험대처	위험통제		4
조달관리		조달관리계획	공급자선정	조달관리		3
이해관계자 관리	이해관계자식별		이해관계자관리			2
프로세스 수	3	16	7	11	2	39

PRINCE2

- ✓ **PRINCE : Projects IN Controlled Enviroments(통제된 환경에서의 프로젝트)의 약자**
- ✓ **1989년 영국의 OGC(Office of Government Commerce)에서 개발되어 1996년 PRINCE2 로개정**
- ✓ **원래는 IT 프로젝트관리를 위한 영국정부의 표준으로 개발되었으나 IT 이외의 프로젝트에도 확대 적용**
- ✓ **프로세스기반 프로젝트 관리 방법으로 8개의 프로세스 45개의 활동으로 구성**

프로세스	관리 활동	활동의 수
프로젝트 준비 (Starting up a Project: SU)	- 프로젝트 위원회 중역과 프로젝트관리자 임명(SU1) - 프로젝트관리팀 설계(SU2) - 프로젝트관리팀 임명(SU3) - 프로젝트 보고 준비(SU4) - 프로젝트 접근방안 정의(SU5) - 착수 단계 계획(SU6)	6
프로젝트 지휘 (Directing a Project: DP)	- 착수 승인(DP1) - 프로젝트 승인(DP2) - 단계 또는 예외 계획 승인(DP3) - 애드혹 지휘(DP4) - 프로젝트 종료 확인(DP5)	5
프로젝트 착수 (Initiating a Project: IP)	- 품질계획(IP1) - 프로젝트계획(IP2) - 비즈니스케이스와 리스크 정의(IP3) - 프로젝트 통제 준비(IP4) - 프로젝트 파일 준비(IP5) - PID 취합(IP6)	6
기획 (Planning: PL)	- 계획 설계(PL1) - 제품 정의 및 분석(PL2) - 활동과 의존관계 식별(PL3) - 추정(PL4) - 일정계획(PL5) - 리스크 분석(PL6) - 계획 완료(PL7)	7
단계 통제 (Controlling a Stage: CS)	- 워크패키지(Work Package) 승인(CS1) - 진척도 평가(CS2) - 프로젝트 이슈 취합(CS3) - 프로젝트 이슈 검토(CS4) - 단계 상태 검토(CS5) - 주요사항 보고(CS6) - 시정조치(CS7) - 프로젝트 이슈 해소(CS8) - 완성된 워크패키지 인수(CS9)	9
산출물 인도관리 (Managing Product Delivery: MP)	- 워크패키지 승인(MP1) - 워크패키지 실행(MP2) - 워크패키지 인도(MP3)	3
단계 경계관리 (Managing Stage Boundaries: SB)	- 단계 계획(SB1) - 프로젝트계획 수정(SB2) - 프로젝트 비즈니스케이스 수정(SB3) - 리스크 로그 수정(SB4) - 단계 종료 보고(SB5) - 예외 계획 생성(SB6)	6
프로젝트 종료 (Closing a Project: CP)	- 프로젝트 해산(CP1) - 후속조치 식별(CP2) - 프로젝트 평가(CP3)	3
전체 활동의 수		45

2. 적용 분야에 대한 지식

- ✓ 소프트웨어 개발, 건설 엔지니어링과 같이 프로젝트와 관련된 기술적 구성요소 (technical element)
- ✓ 정부 계약, 커뮤니티 개발 또는 새로운 제품 개발과 같은 관리 기법 (management specialization)
- ✓ 각 응용 분야별 표준, best practices, 규정 등의 지식
- ✓ 정부가 강제하는 법규 요건

3. 프로젝트 환경의 이해

- ✓ 프로젝트에 영향을 미치는 조직 문화적, 사회적 환경
- ✓ 국제적, 정치적 환경
- ✓ 프로젝트가 영향 받는, 또는 프로젝트 의해 영향 미치는 물리적 환경의 이해

4. 일반적인 기업경영 지식


- ✓ 재무 및 회계, 구매 및 조달, 계약 및 상법, 제조 및 유통전략 기획과 운영 기획, 조직구조 / 조직 행위 / 직원관리 / 보상 / 복지, 건강 및 안전 실무, 정보기술

5. 대인관계 기술

- ✓ 효과적인 의사소통 (정보 교류)
- ✓ 조직에의 영향 (일이 되게 하는 능력)
- ✓ 리더십과 동기부여 (비전, 전략 개발과 이의 달성을 위한 동기부여)
- ✓ 협상과 갈등관리 (합의를 이끌어내기 위한 협의)
- ✓ 문제 해결 (문제 정의 / 대안 식별과 분석 / 의사결정의 조합)

프로그램(Program) 관리란?


- ✓ 프로그램(program)은 상호 관련된 프로젝트들의 집합으로, 각 프로젝트를 개별적으로 관리해서는 얻을 수 없는 편익과 통제를 통합적 관리를 통해 얻을 수 있음

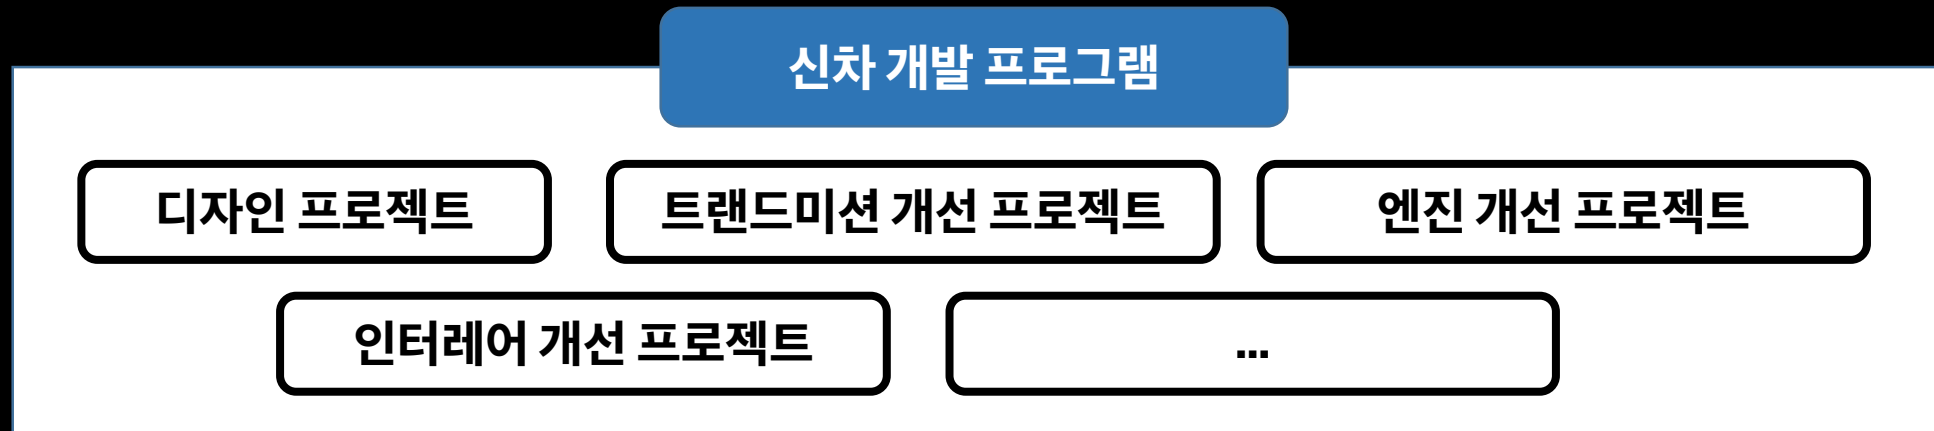

포트폴리오(Portfolio) 관리란?

- ✓ 포트폴리오는 효율적 관리를 목적으로 기업의 **전략적 목표를 달성하는데 필요한 프로젝트나 프로그램들을 모아 놓은 집합체**
- ✓ 프로그램과 달리, 포트폴리오에 포함된 프로젝트나 프로그램들은 반드시 서로 관련되어 있을 필요는 없음
- ✓ 포트폴리오 관리의 목적은 기업의 전략적 목표 달성을 위해 제안된 프로젝트나 프로그램의 최적 조합과 순서를 결정하고 자원을 할당하고 성과를 평가하는 것




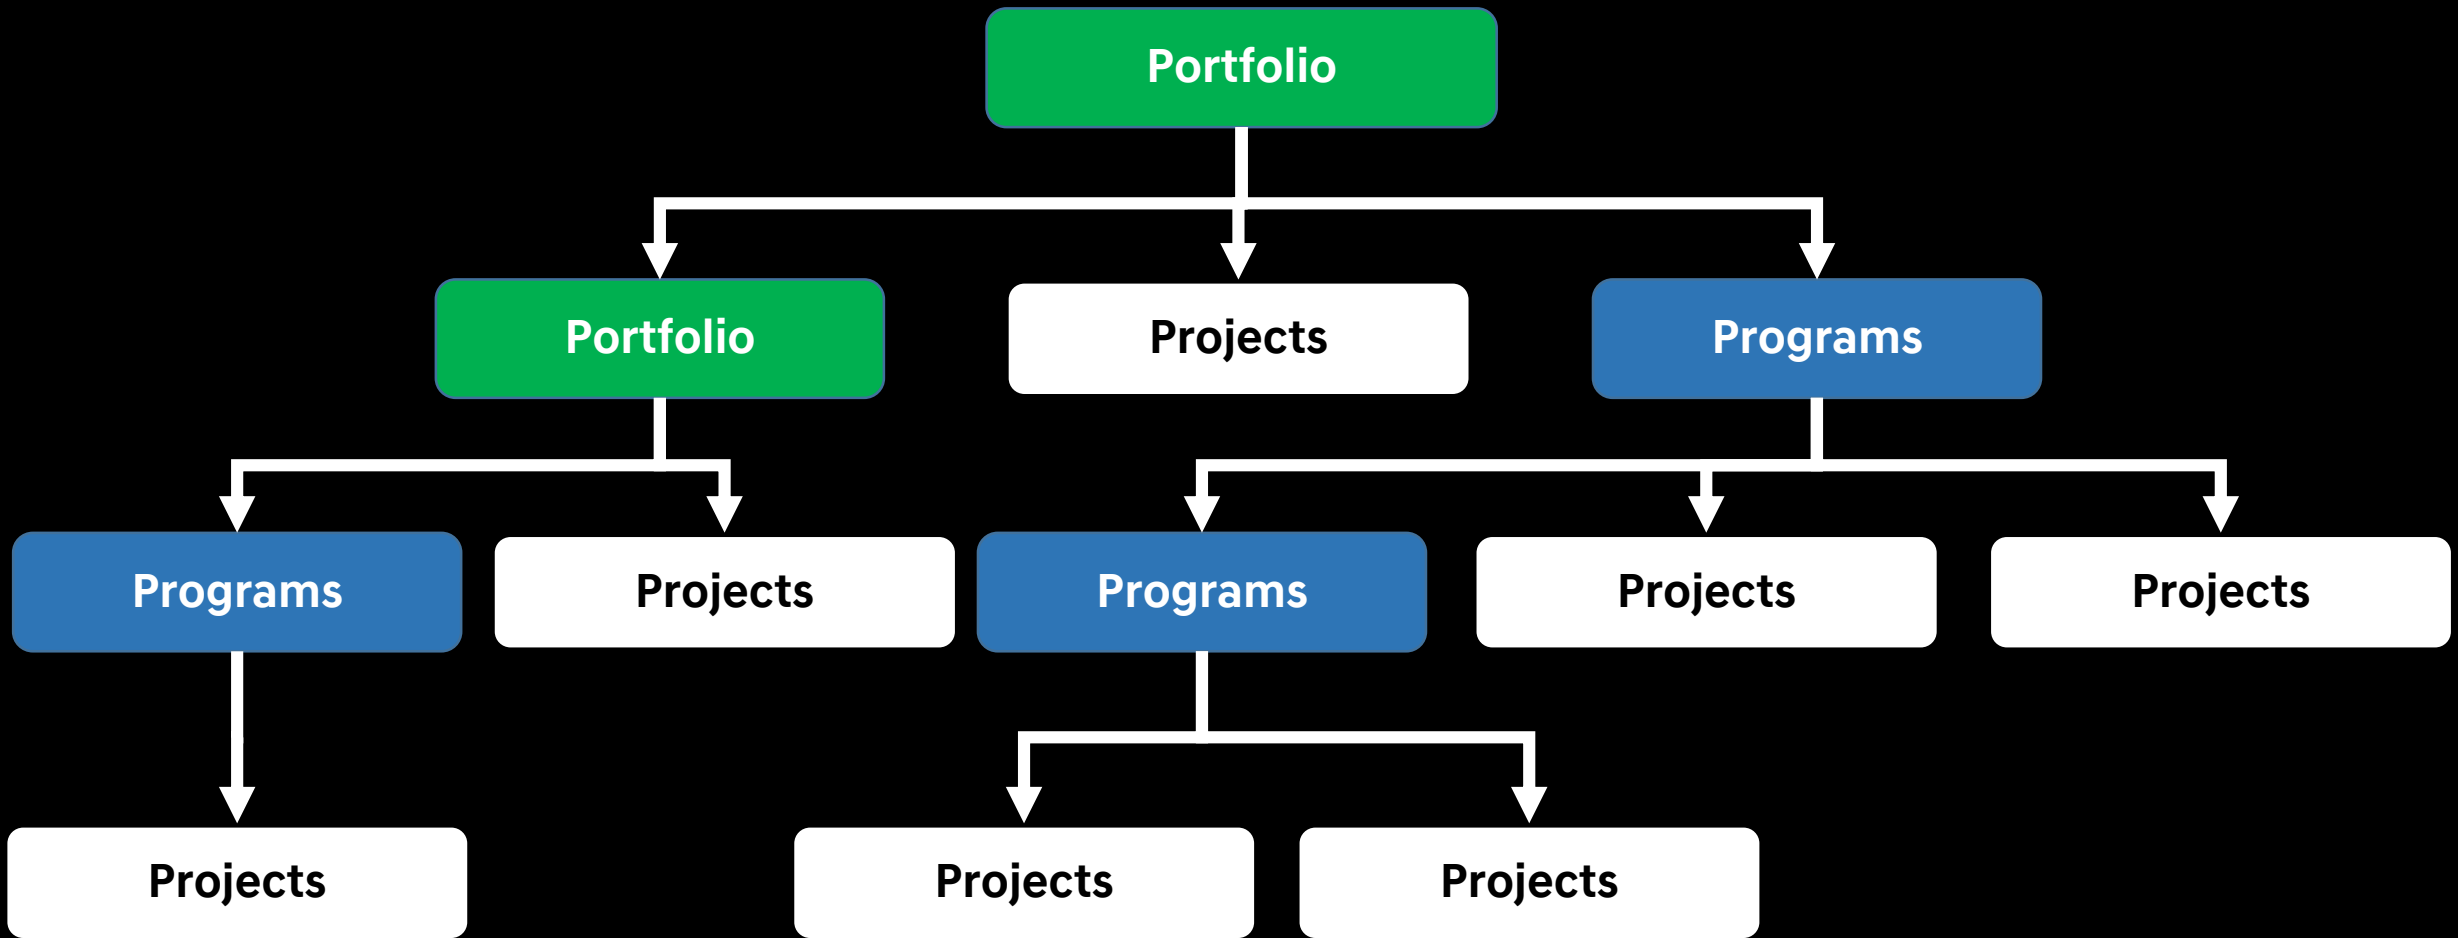


프로젝트 관리 오피스 (PMO)

- ✓ PMO는 같은 영역 하에 있는 프로젝트들의 관리를 조정(Coordinate)하고 집중화(Centralize)하기 위한 조직 단위
- ✓ PMO는 프로젝트들의 조정, 기획, 우선 순위화, 실행에 초점을 두며, 그것을 상위 조직 또는 고객의 사업 목표에 일치시키는 역할
- ✓ 일부 PMO는 각 프로젝트 착수 동안, 권한을 위임 받으며, 지속적인 사업 목표를 유지하기 위해 프로젝트를 중단할 수 있는 권한 보유


프로젝트 관리의 장점




업무와 목표를 한
곳에서 관리합니다



팀 효율성을 개선합니다





혼란을 줄이고 효율성을
높입니다







커뮤니케이션을 조율합니다


Chapter 2



BasicIT-Method

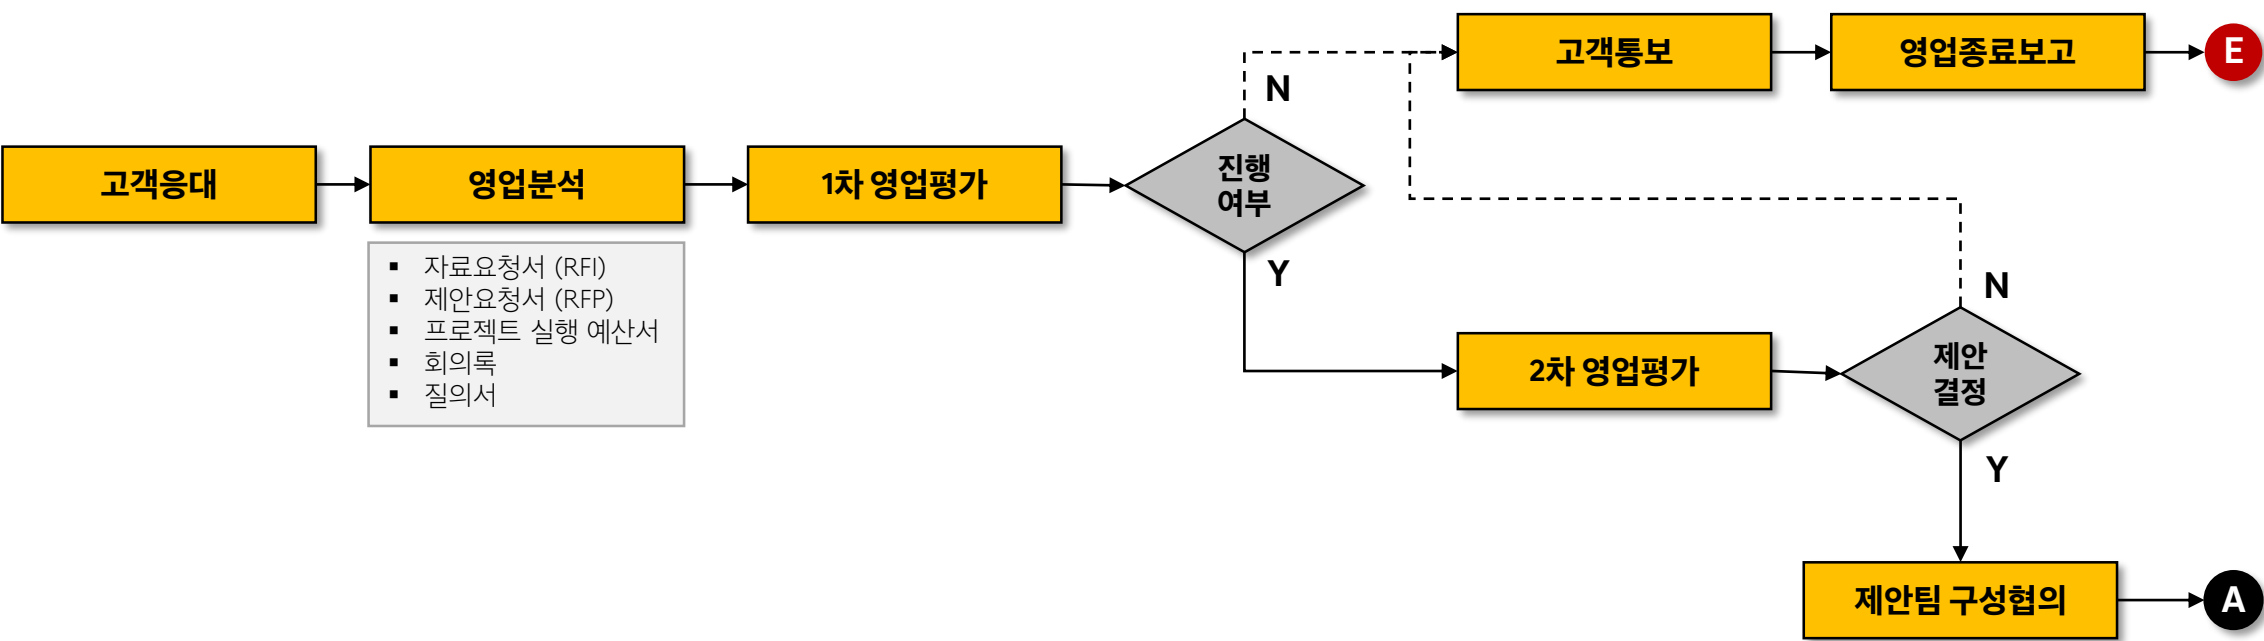


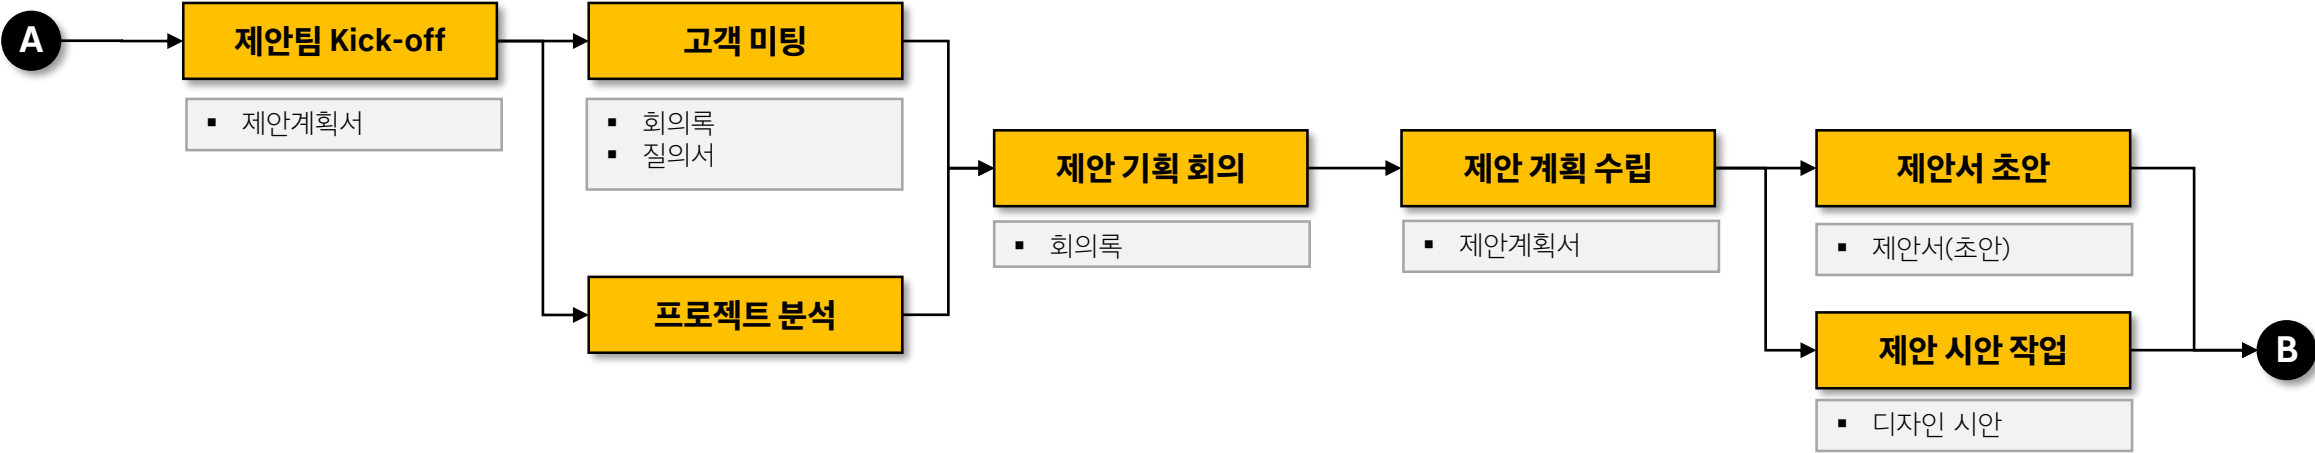


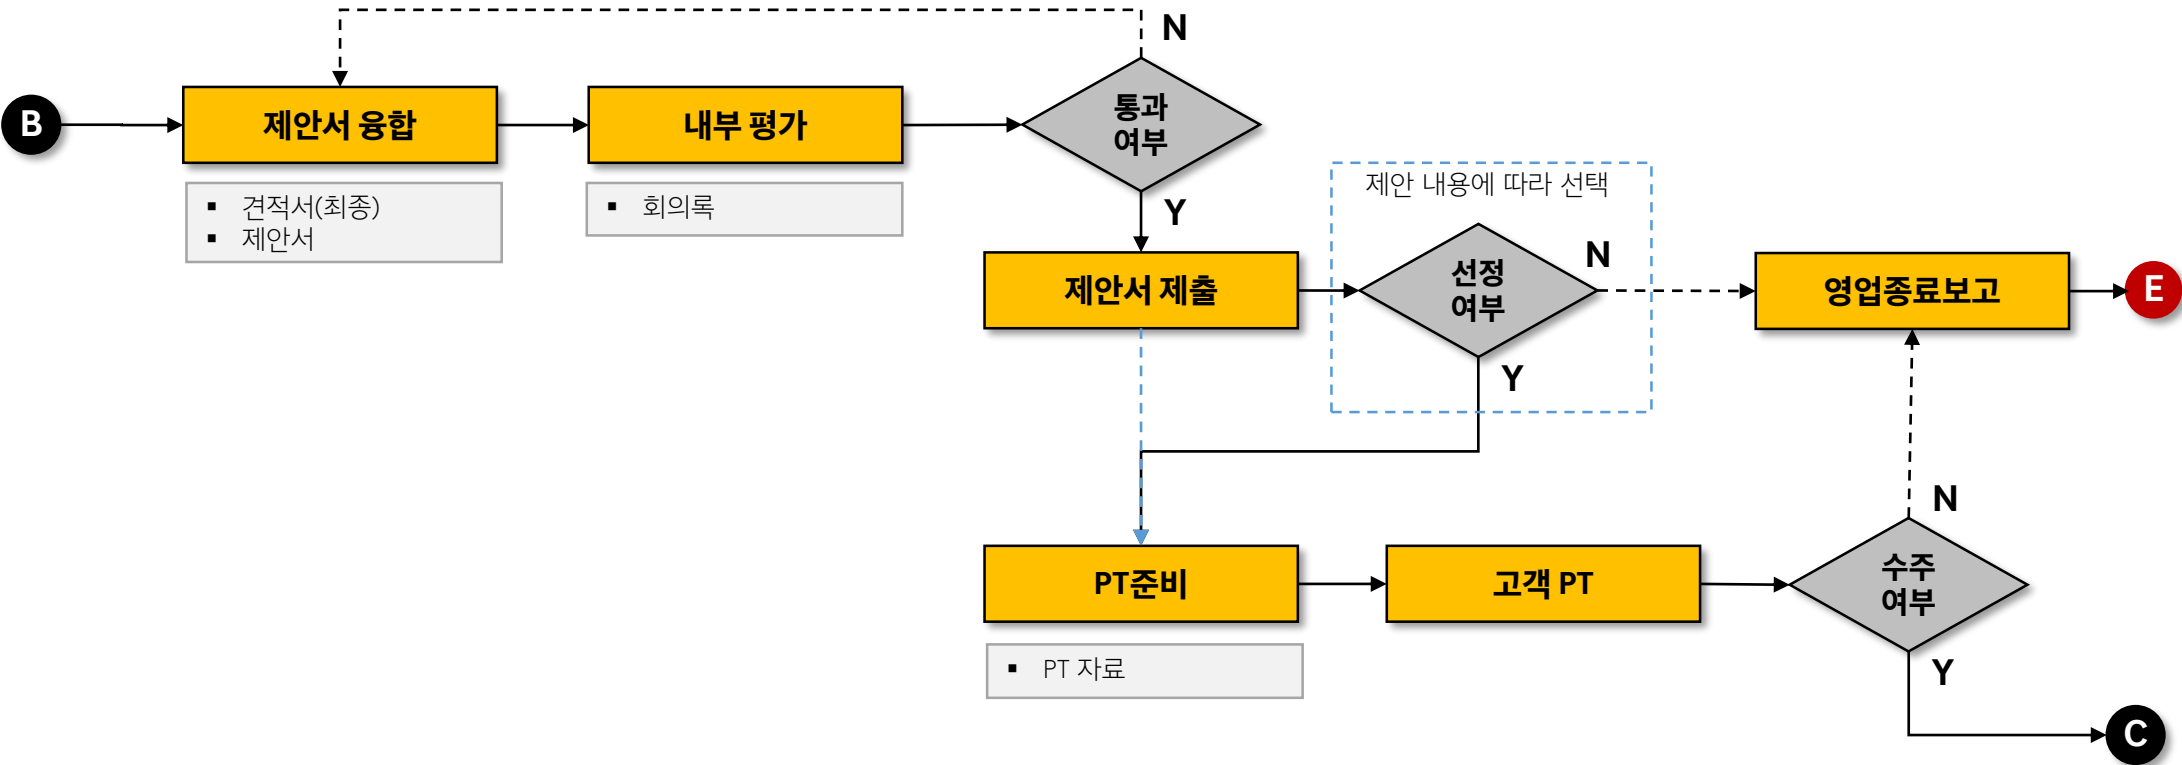


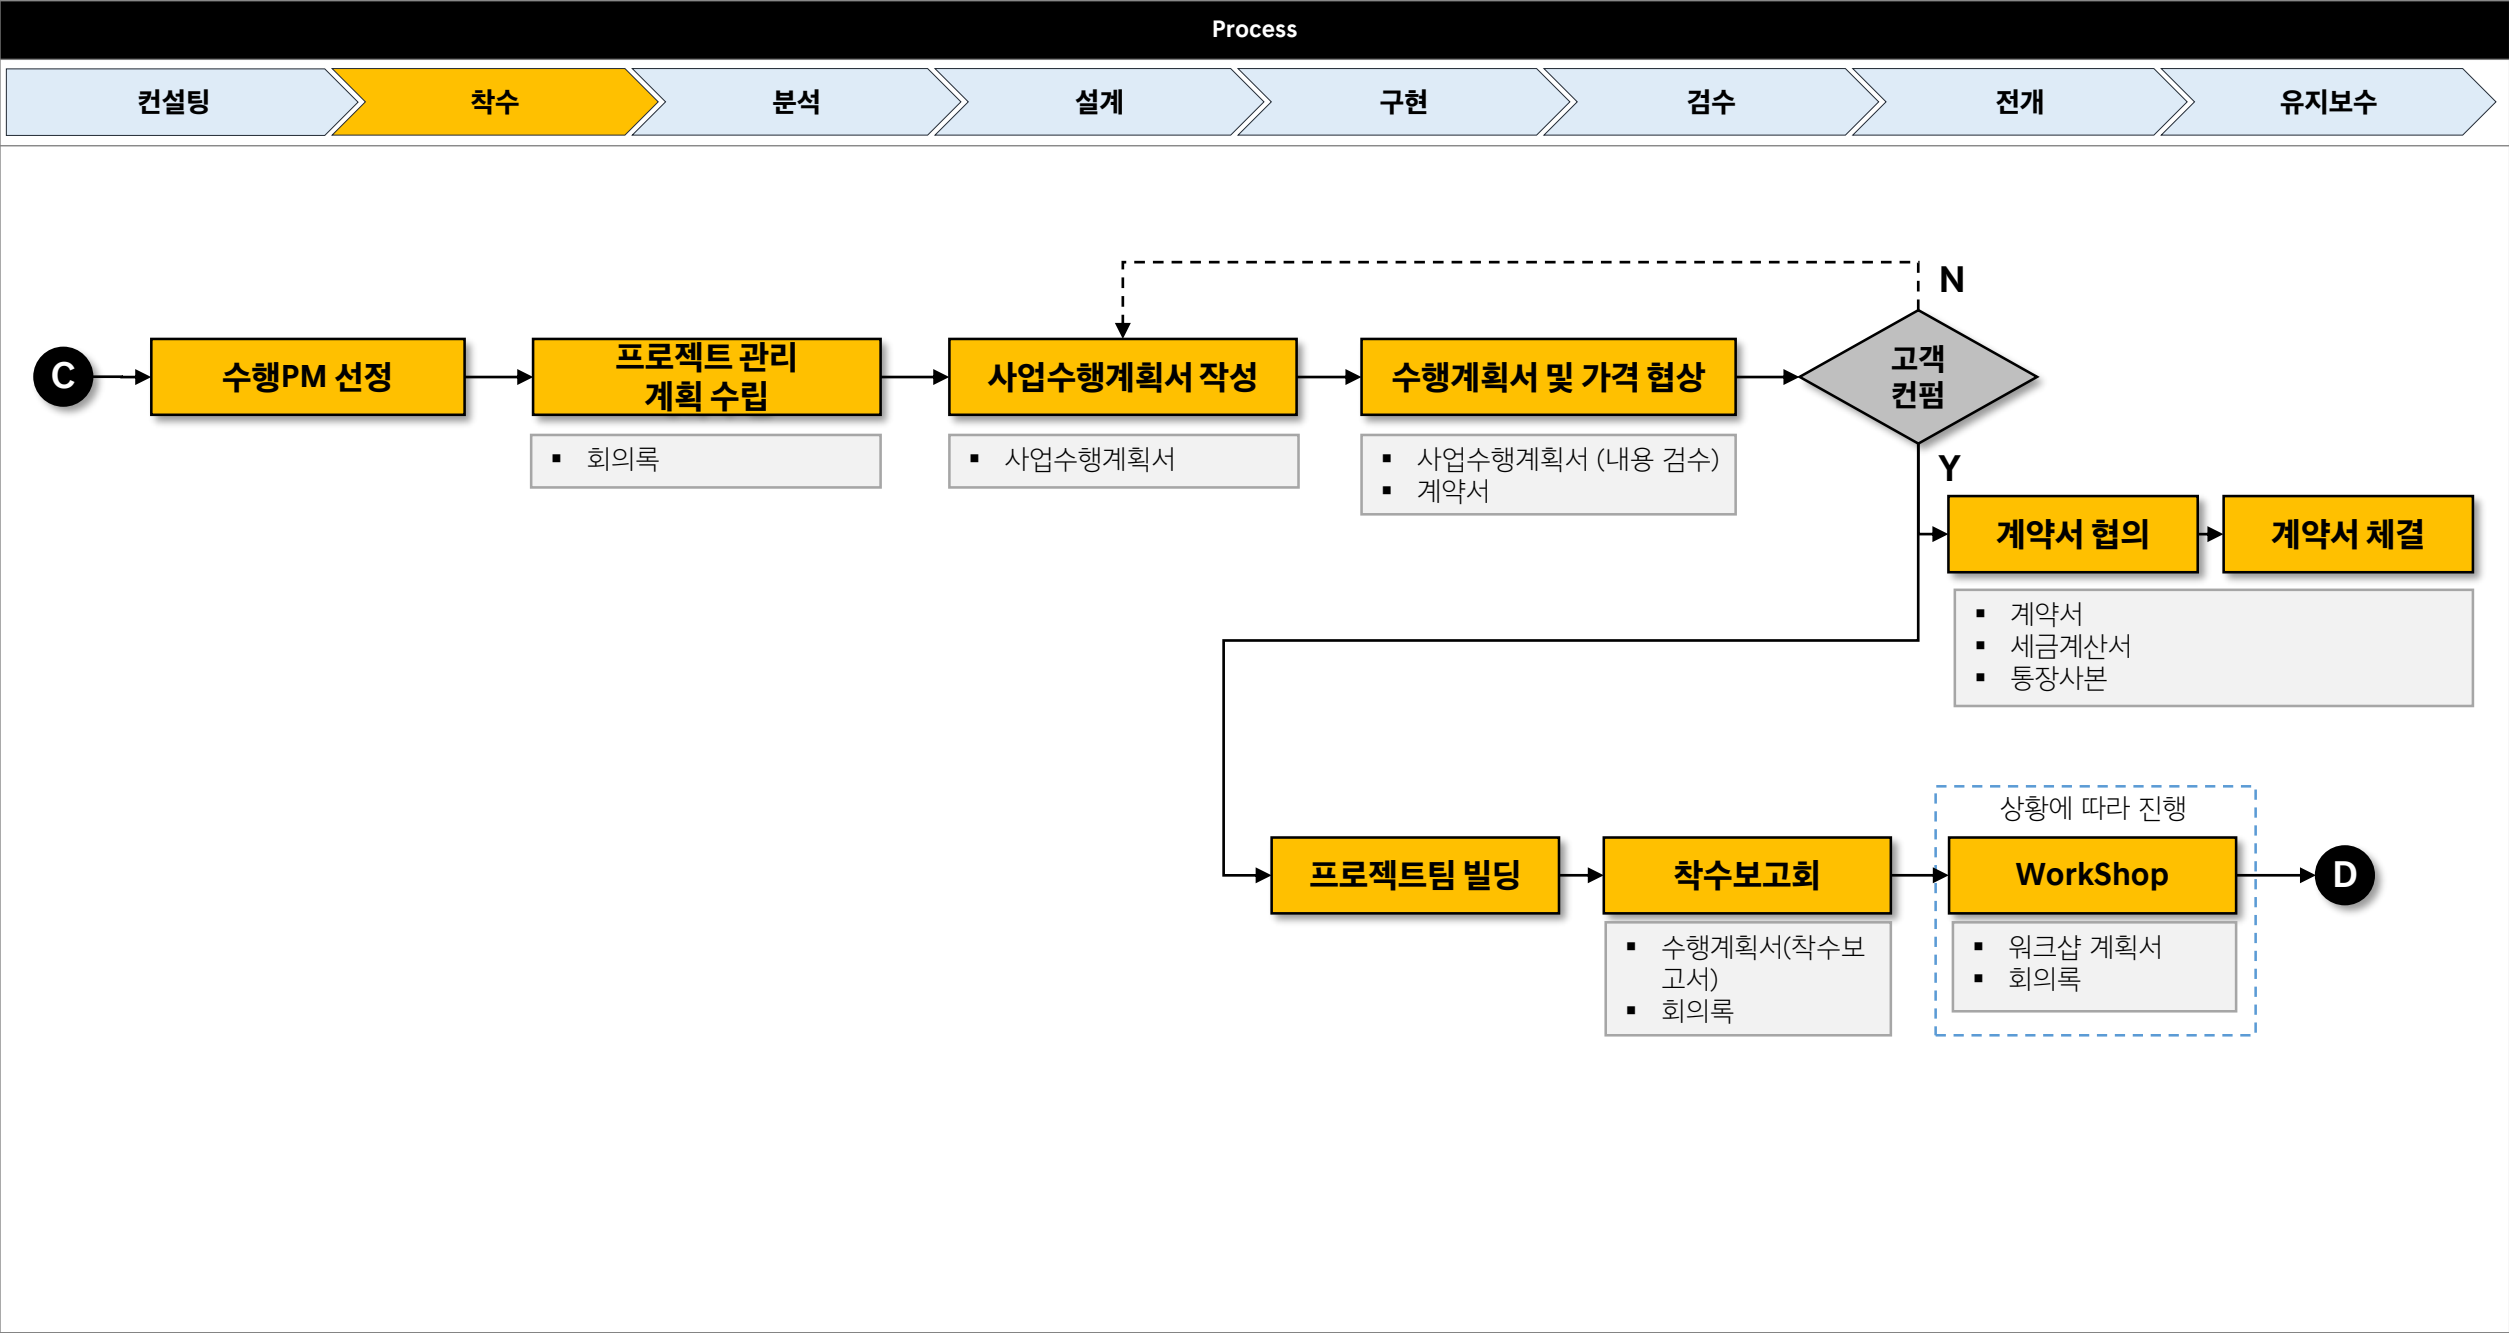


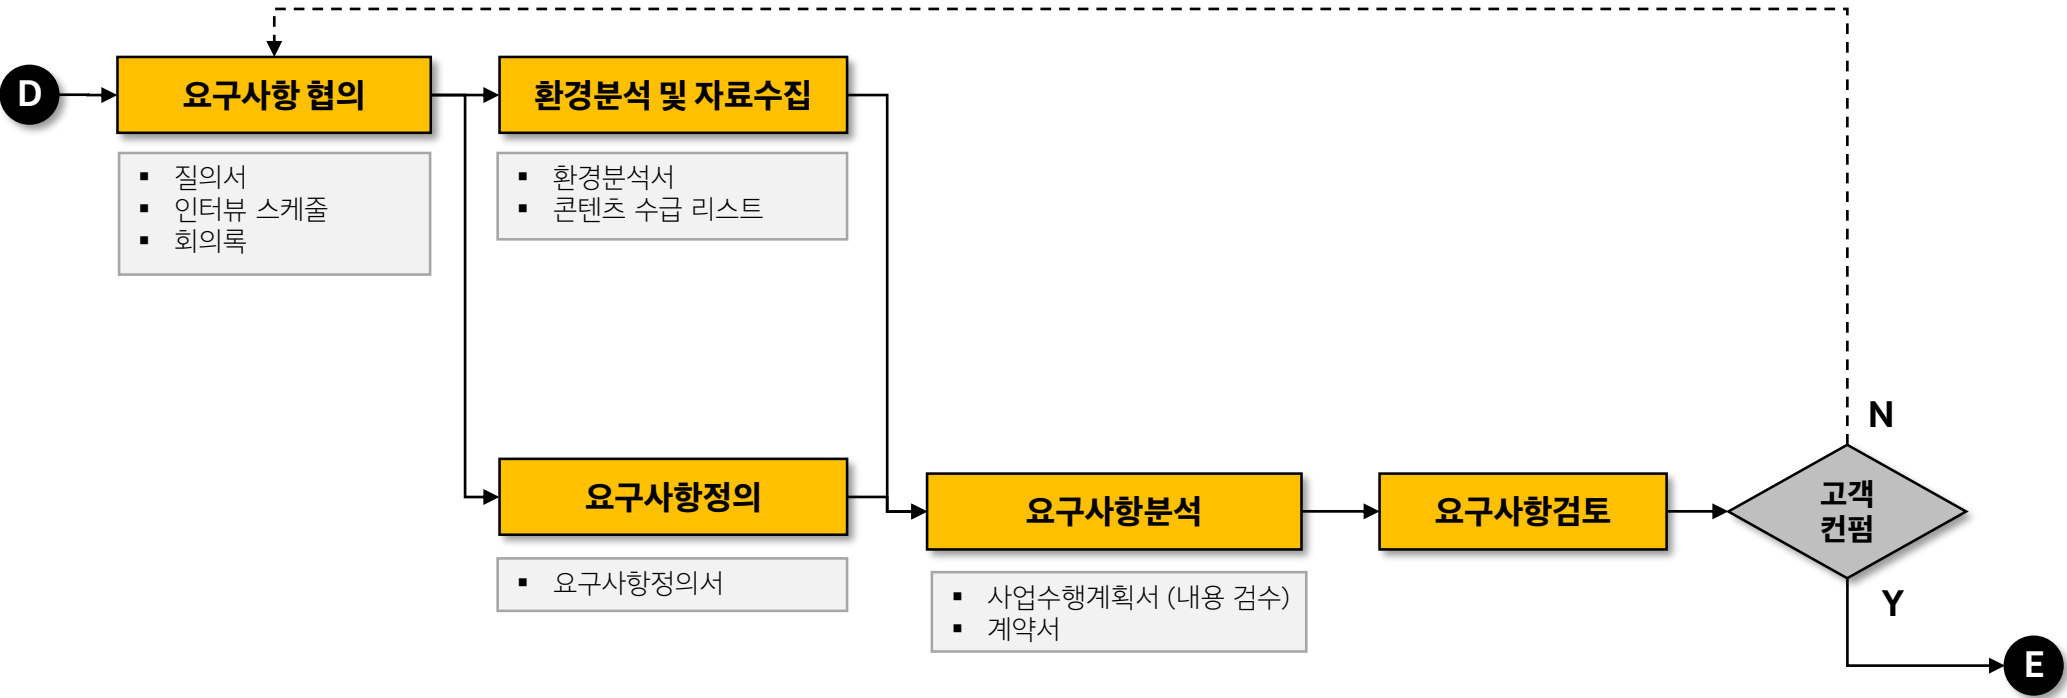



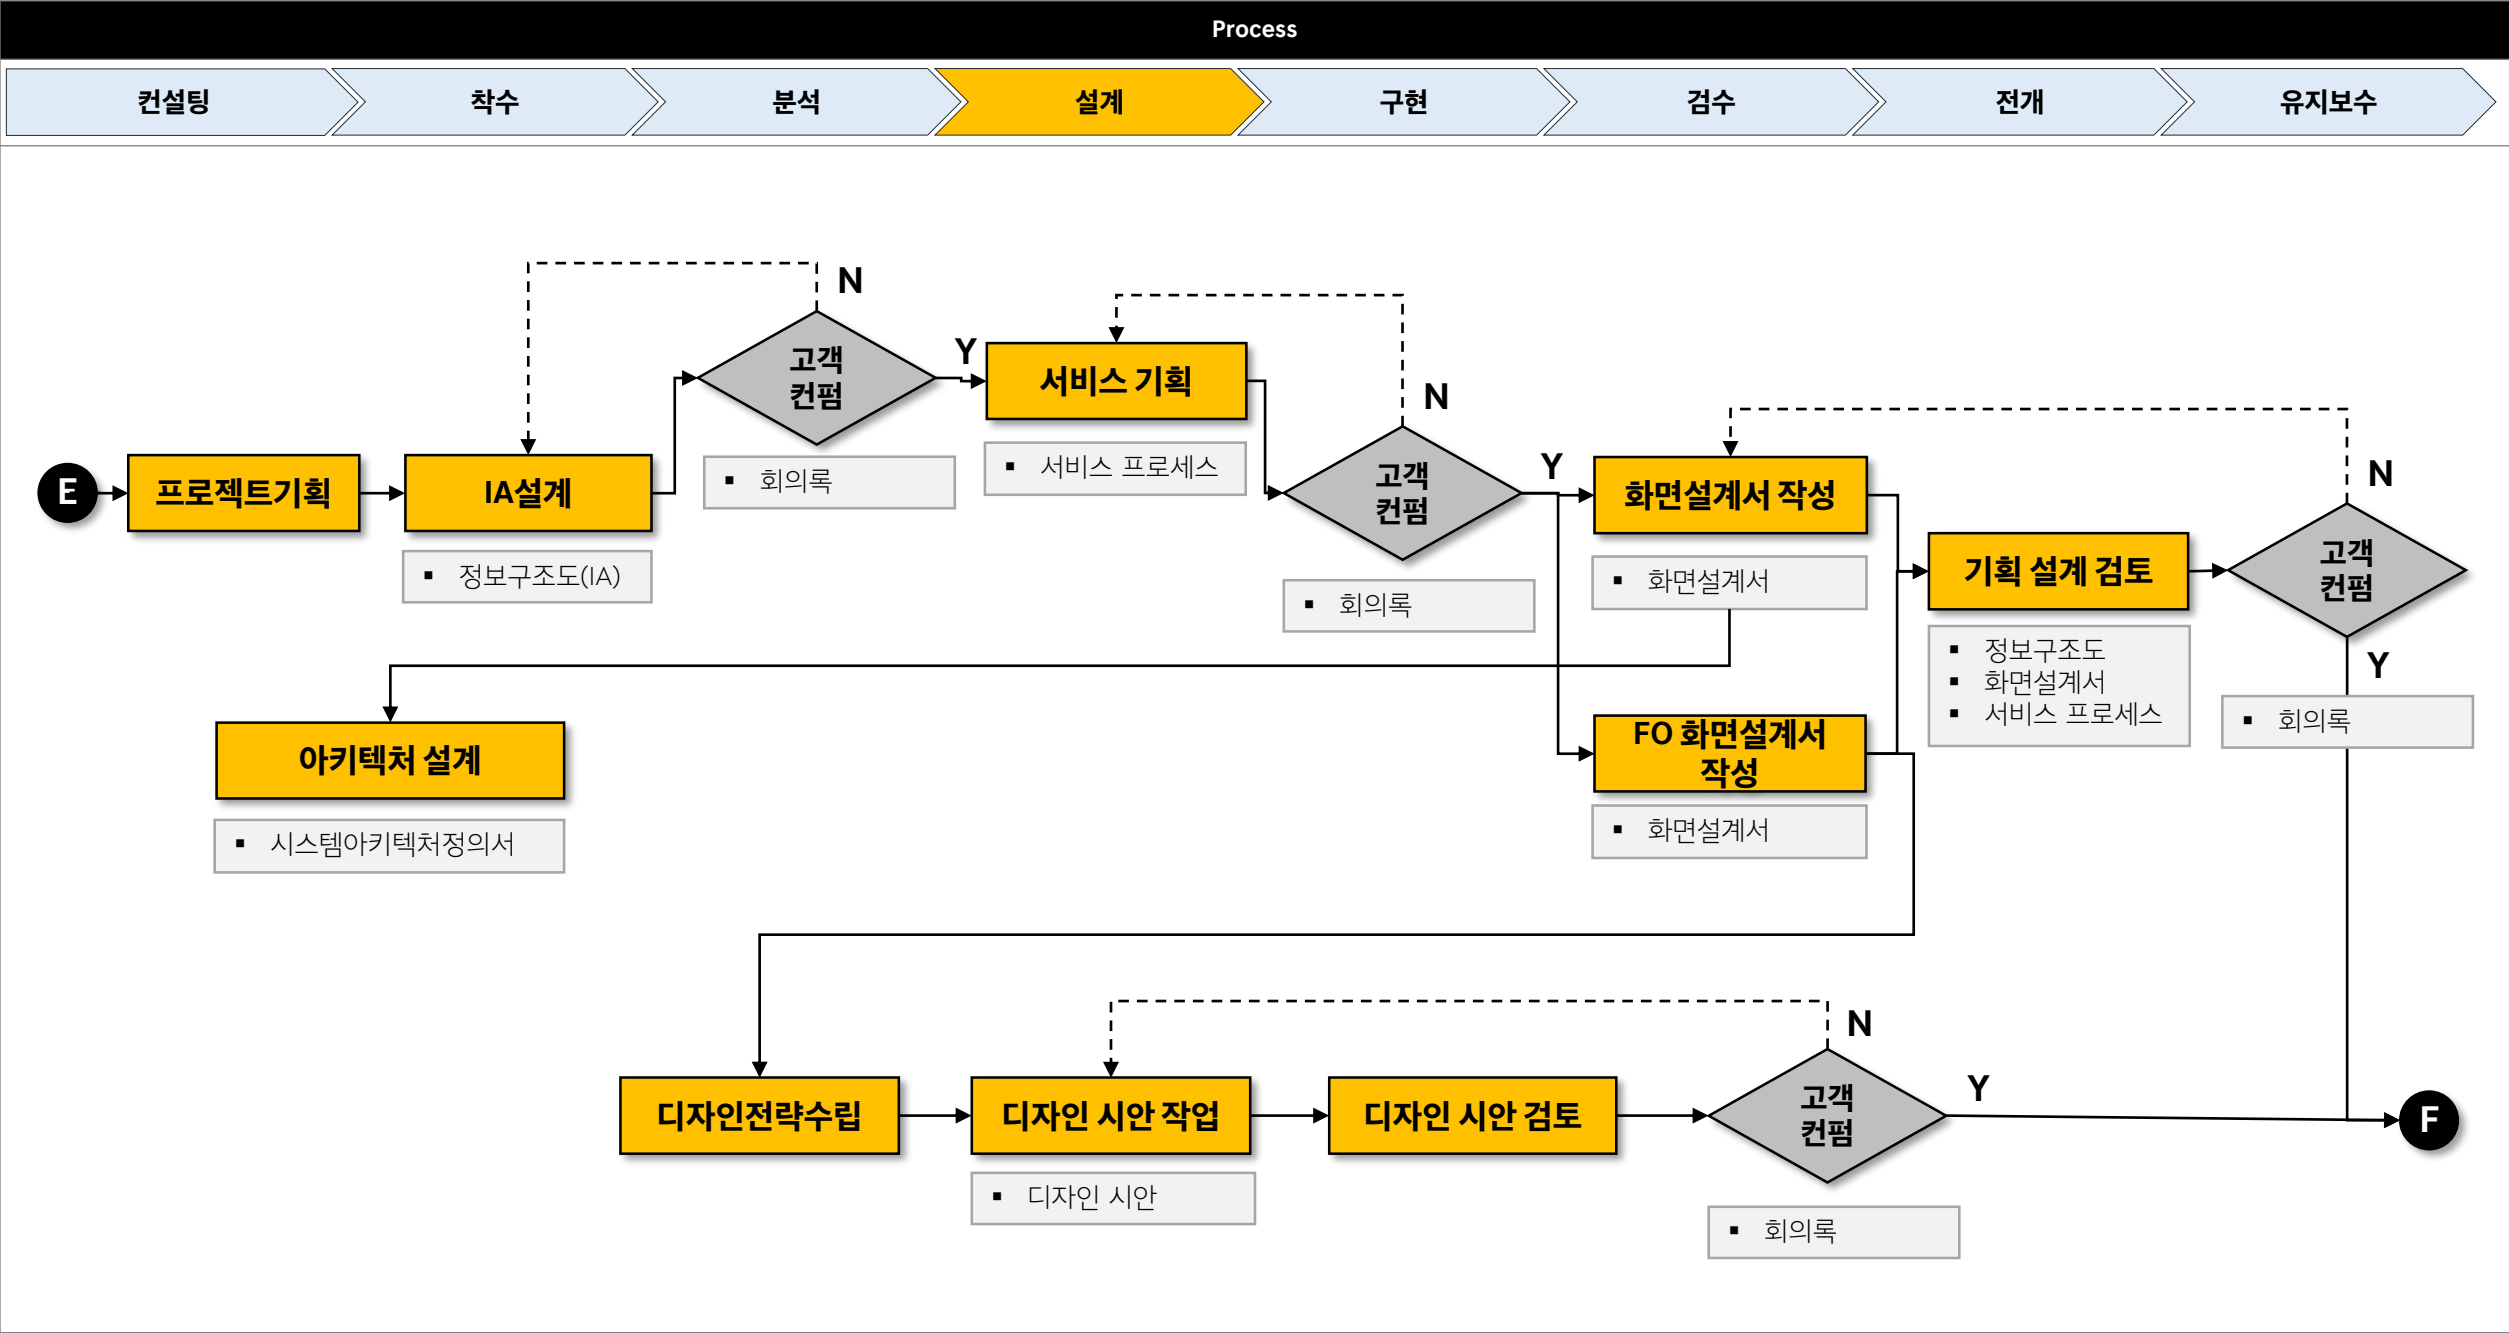


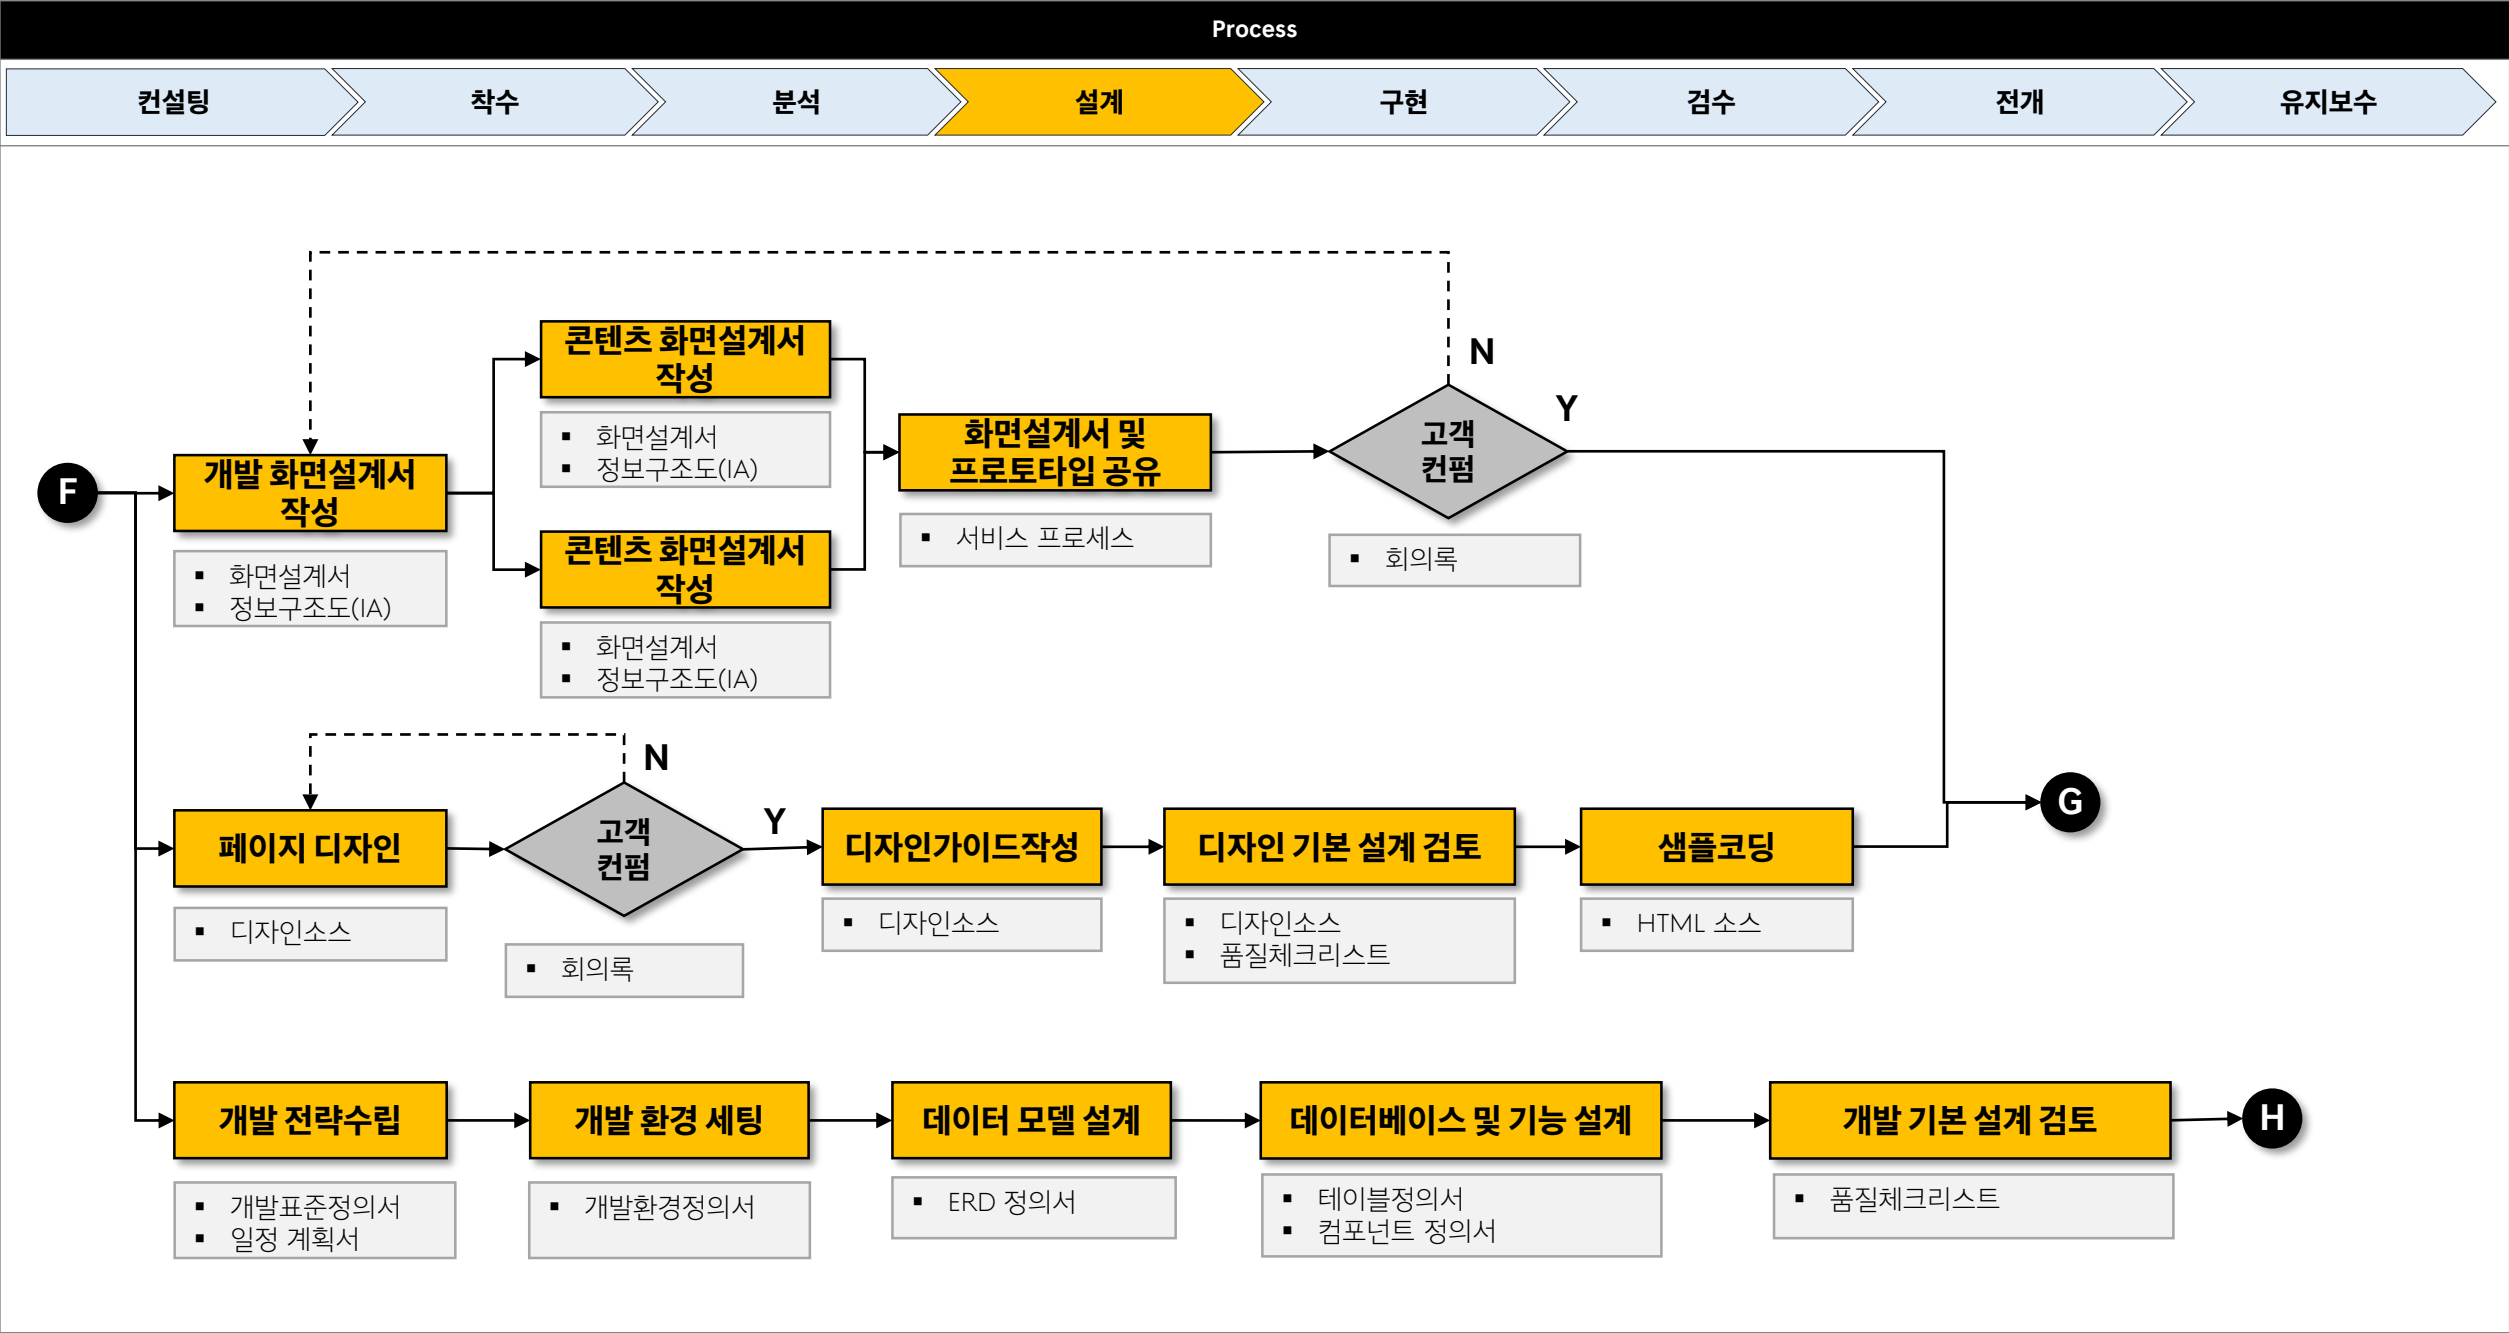



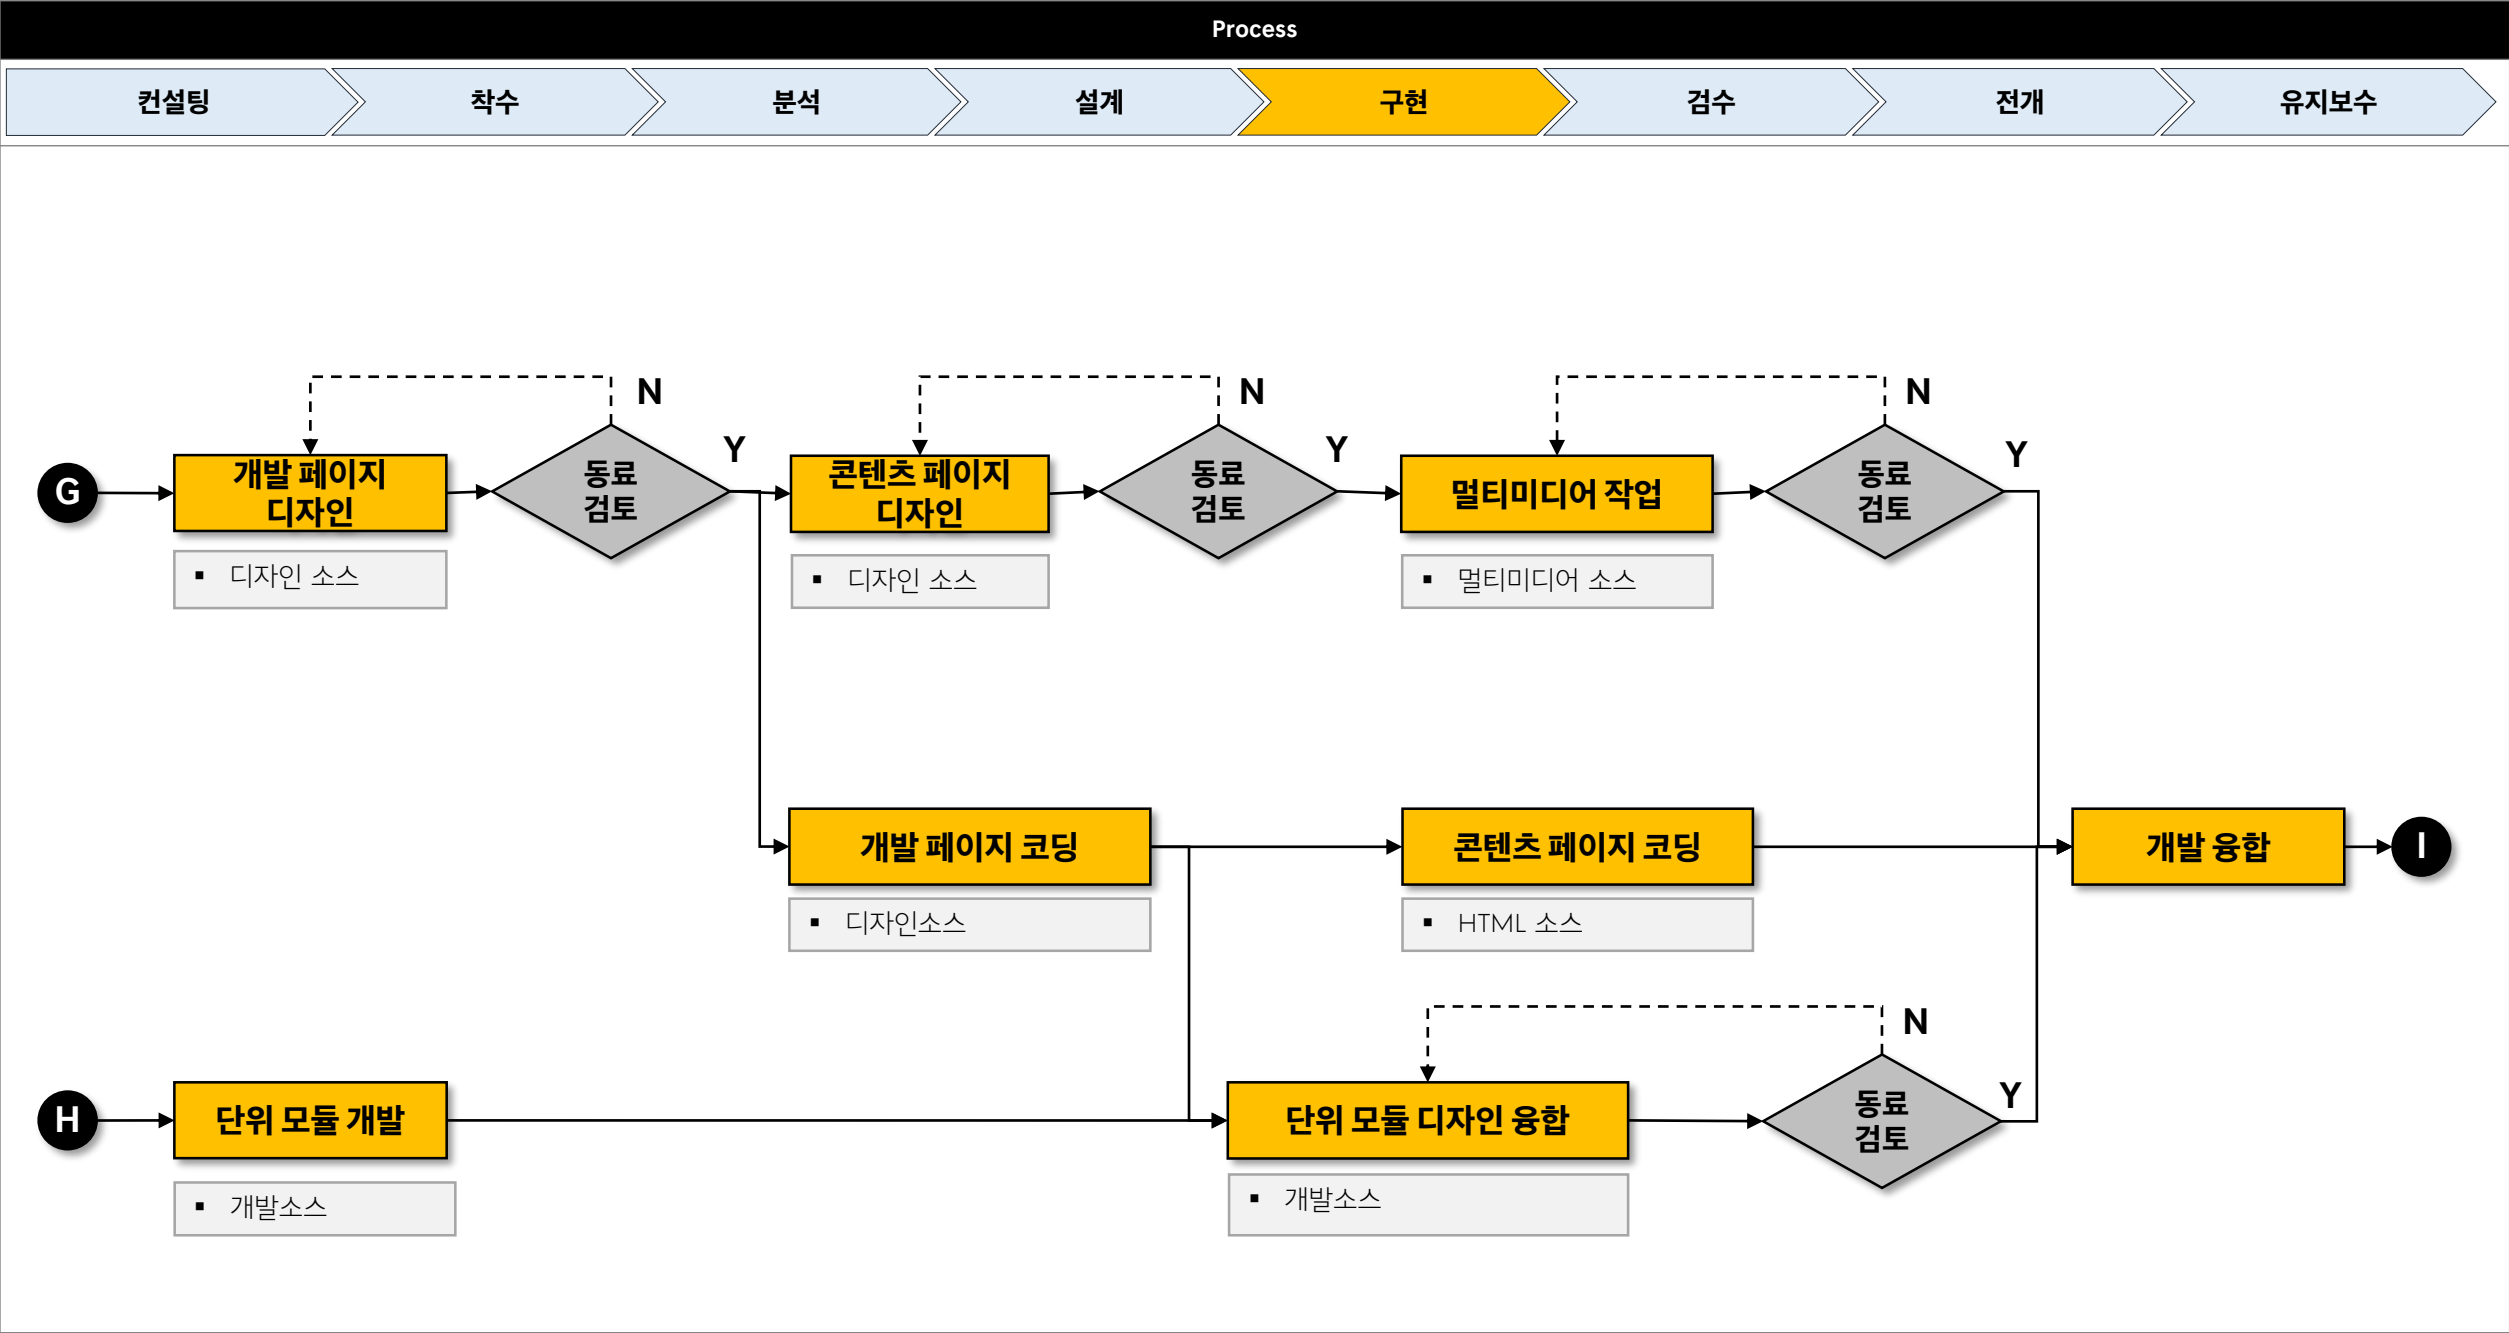


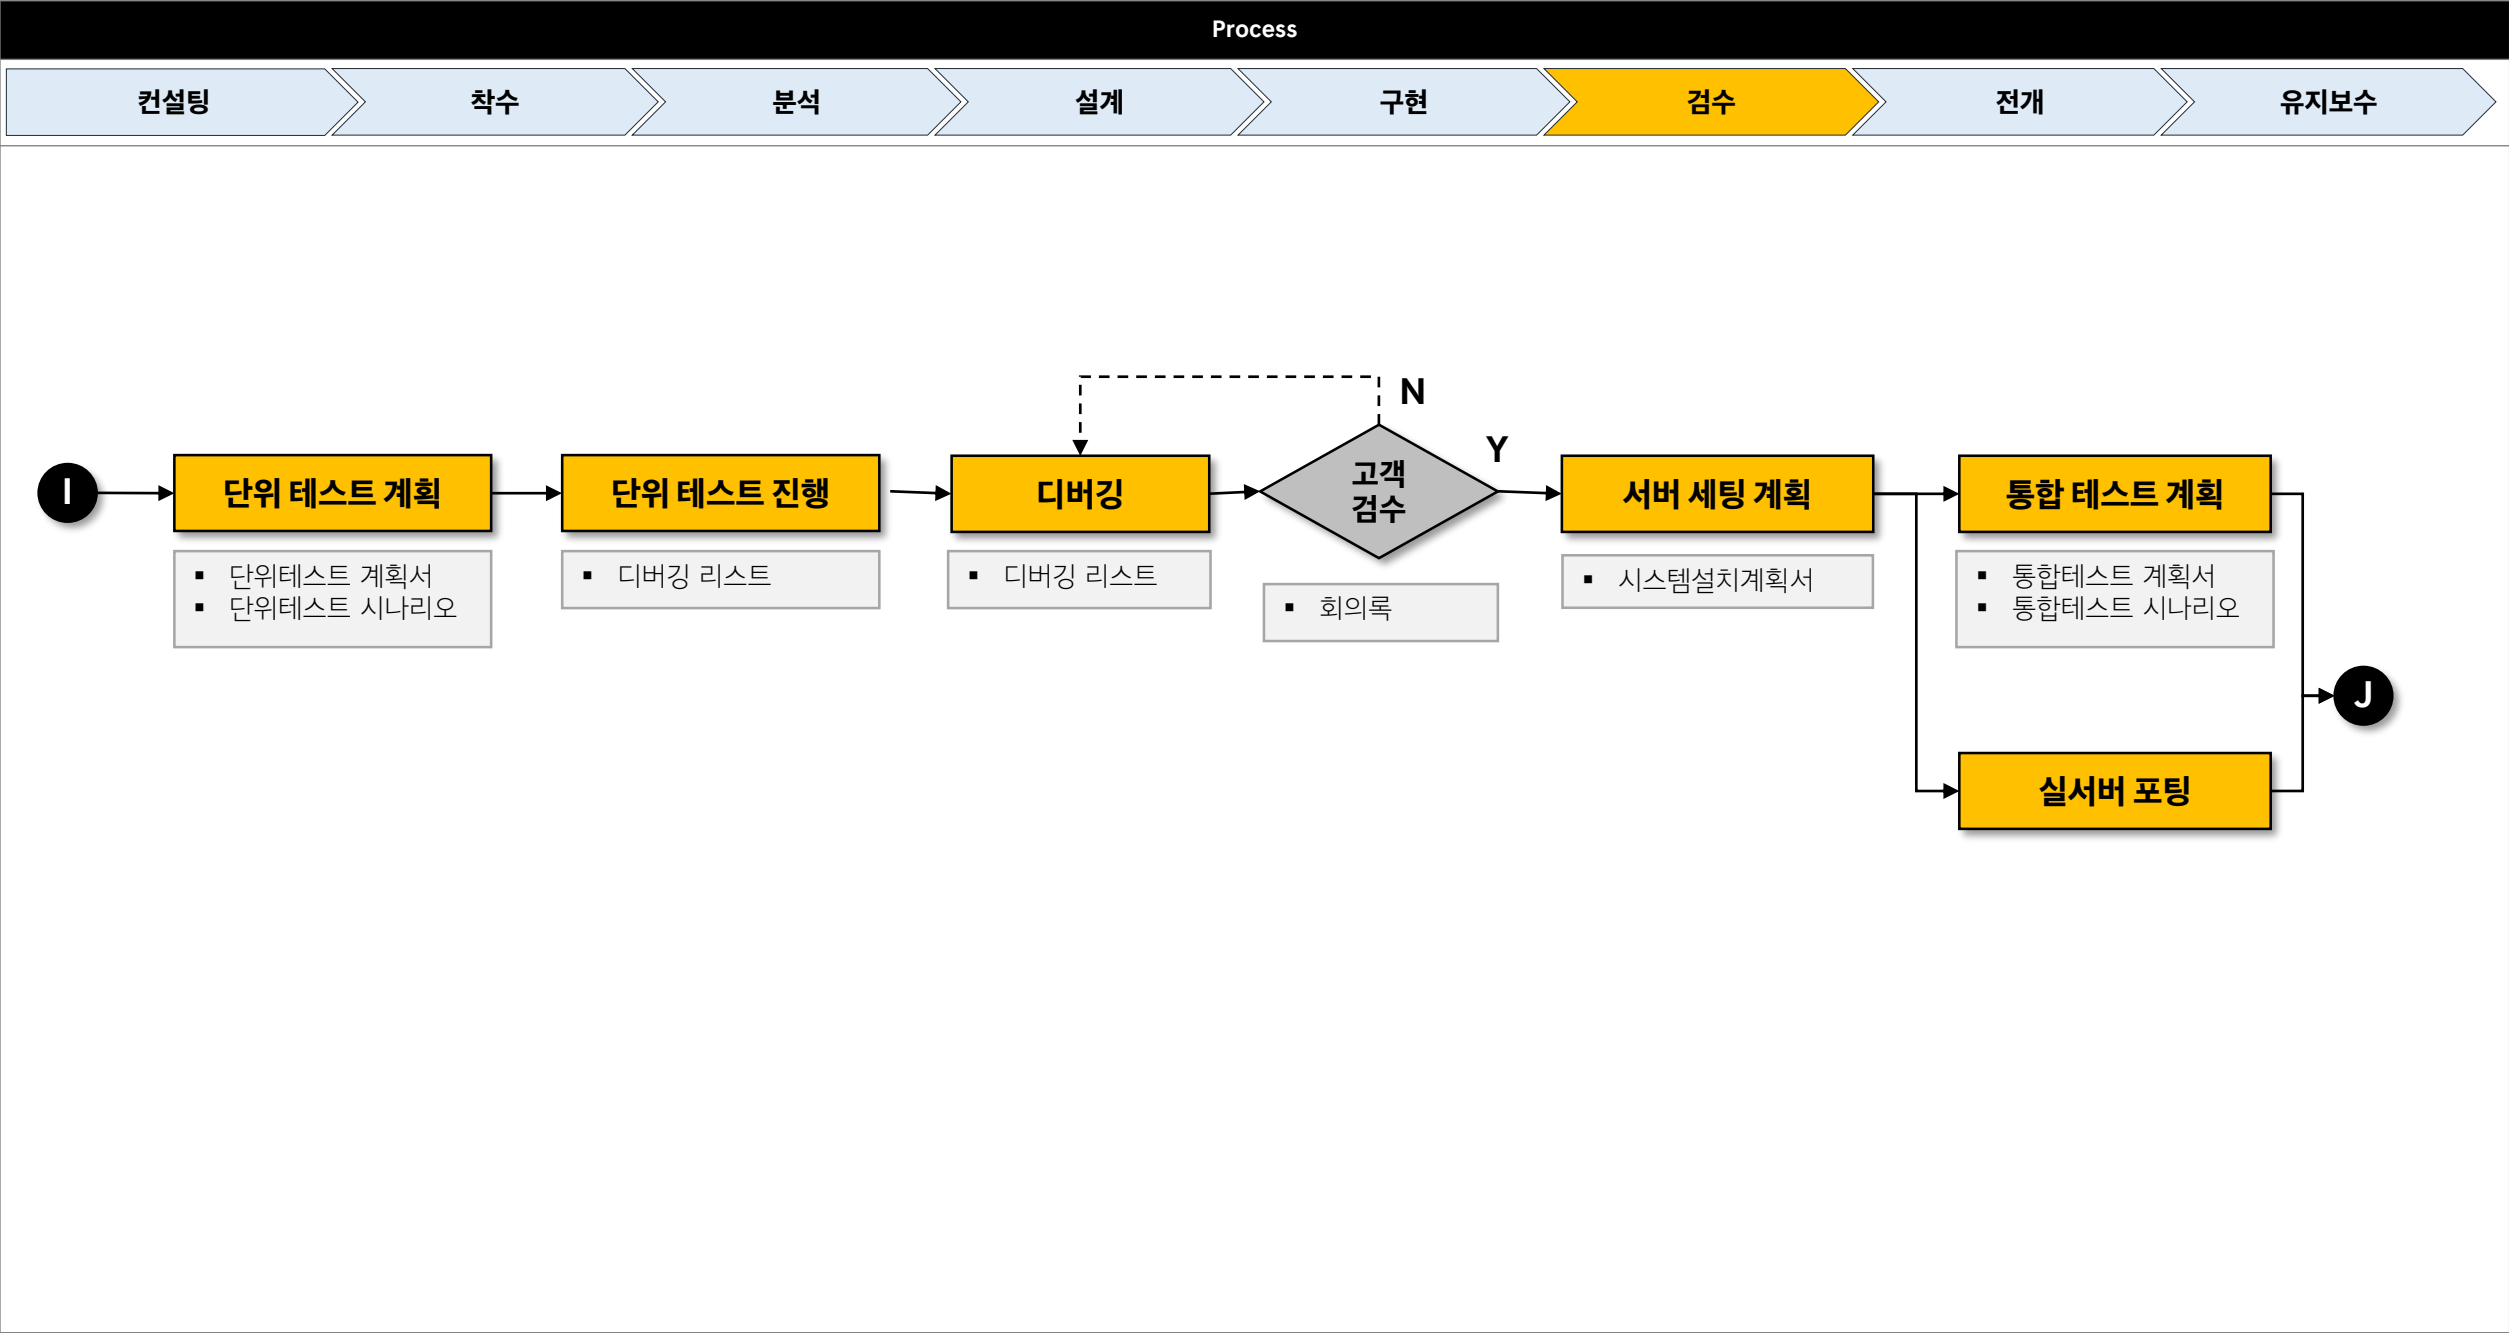

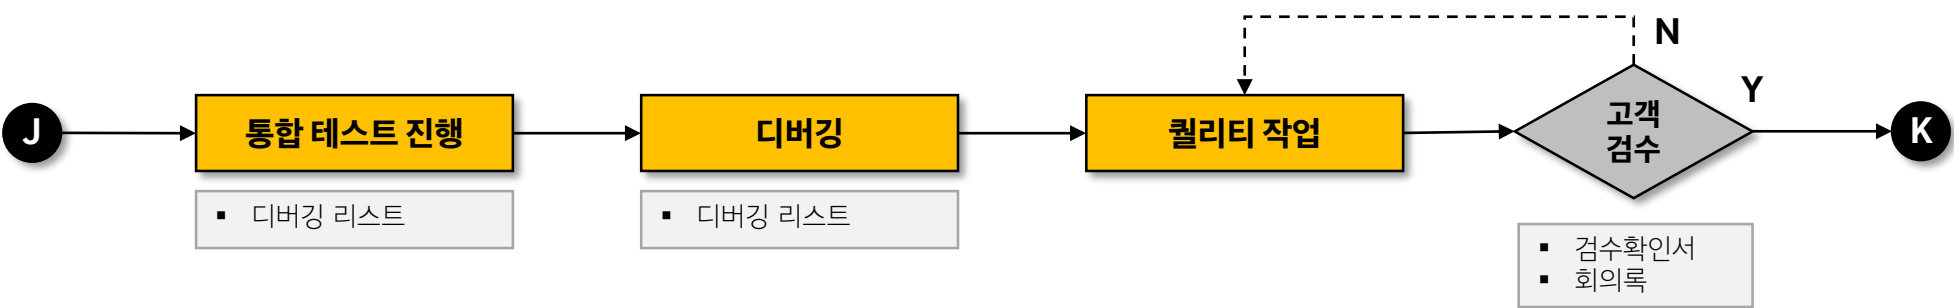


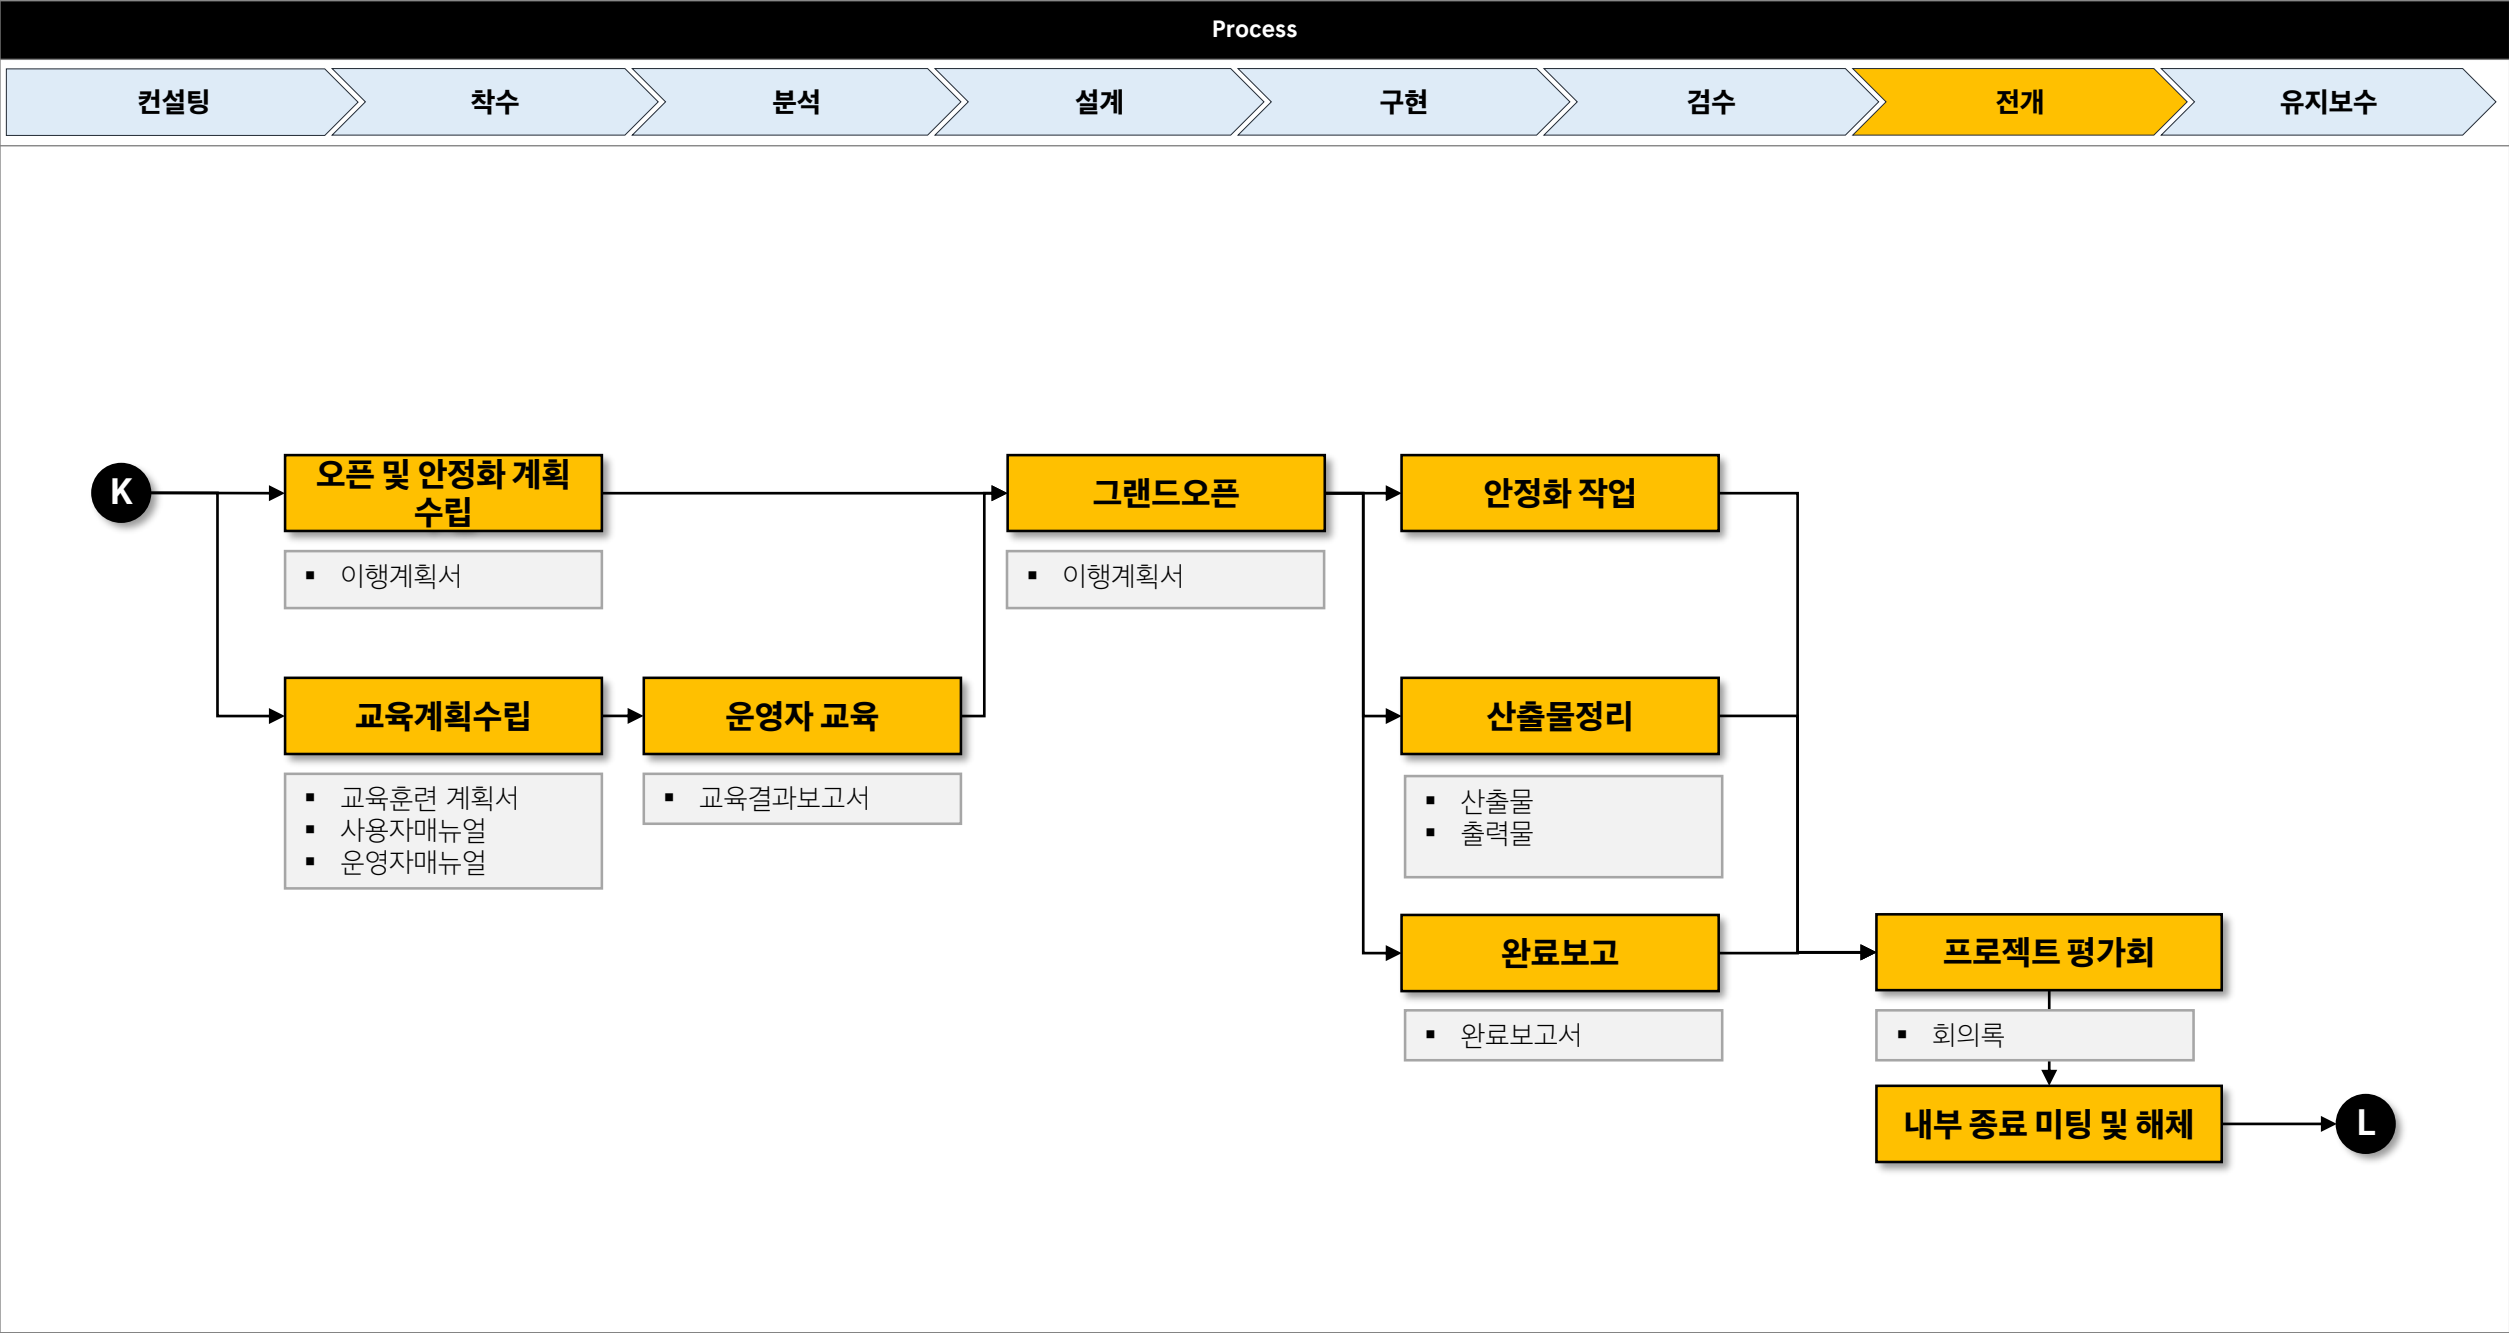

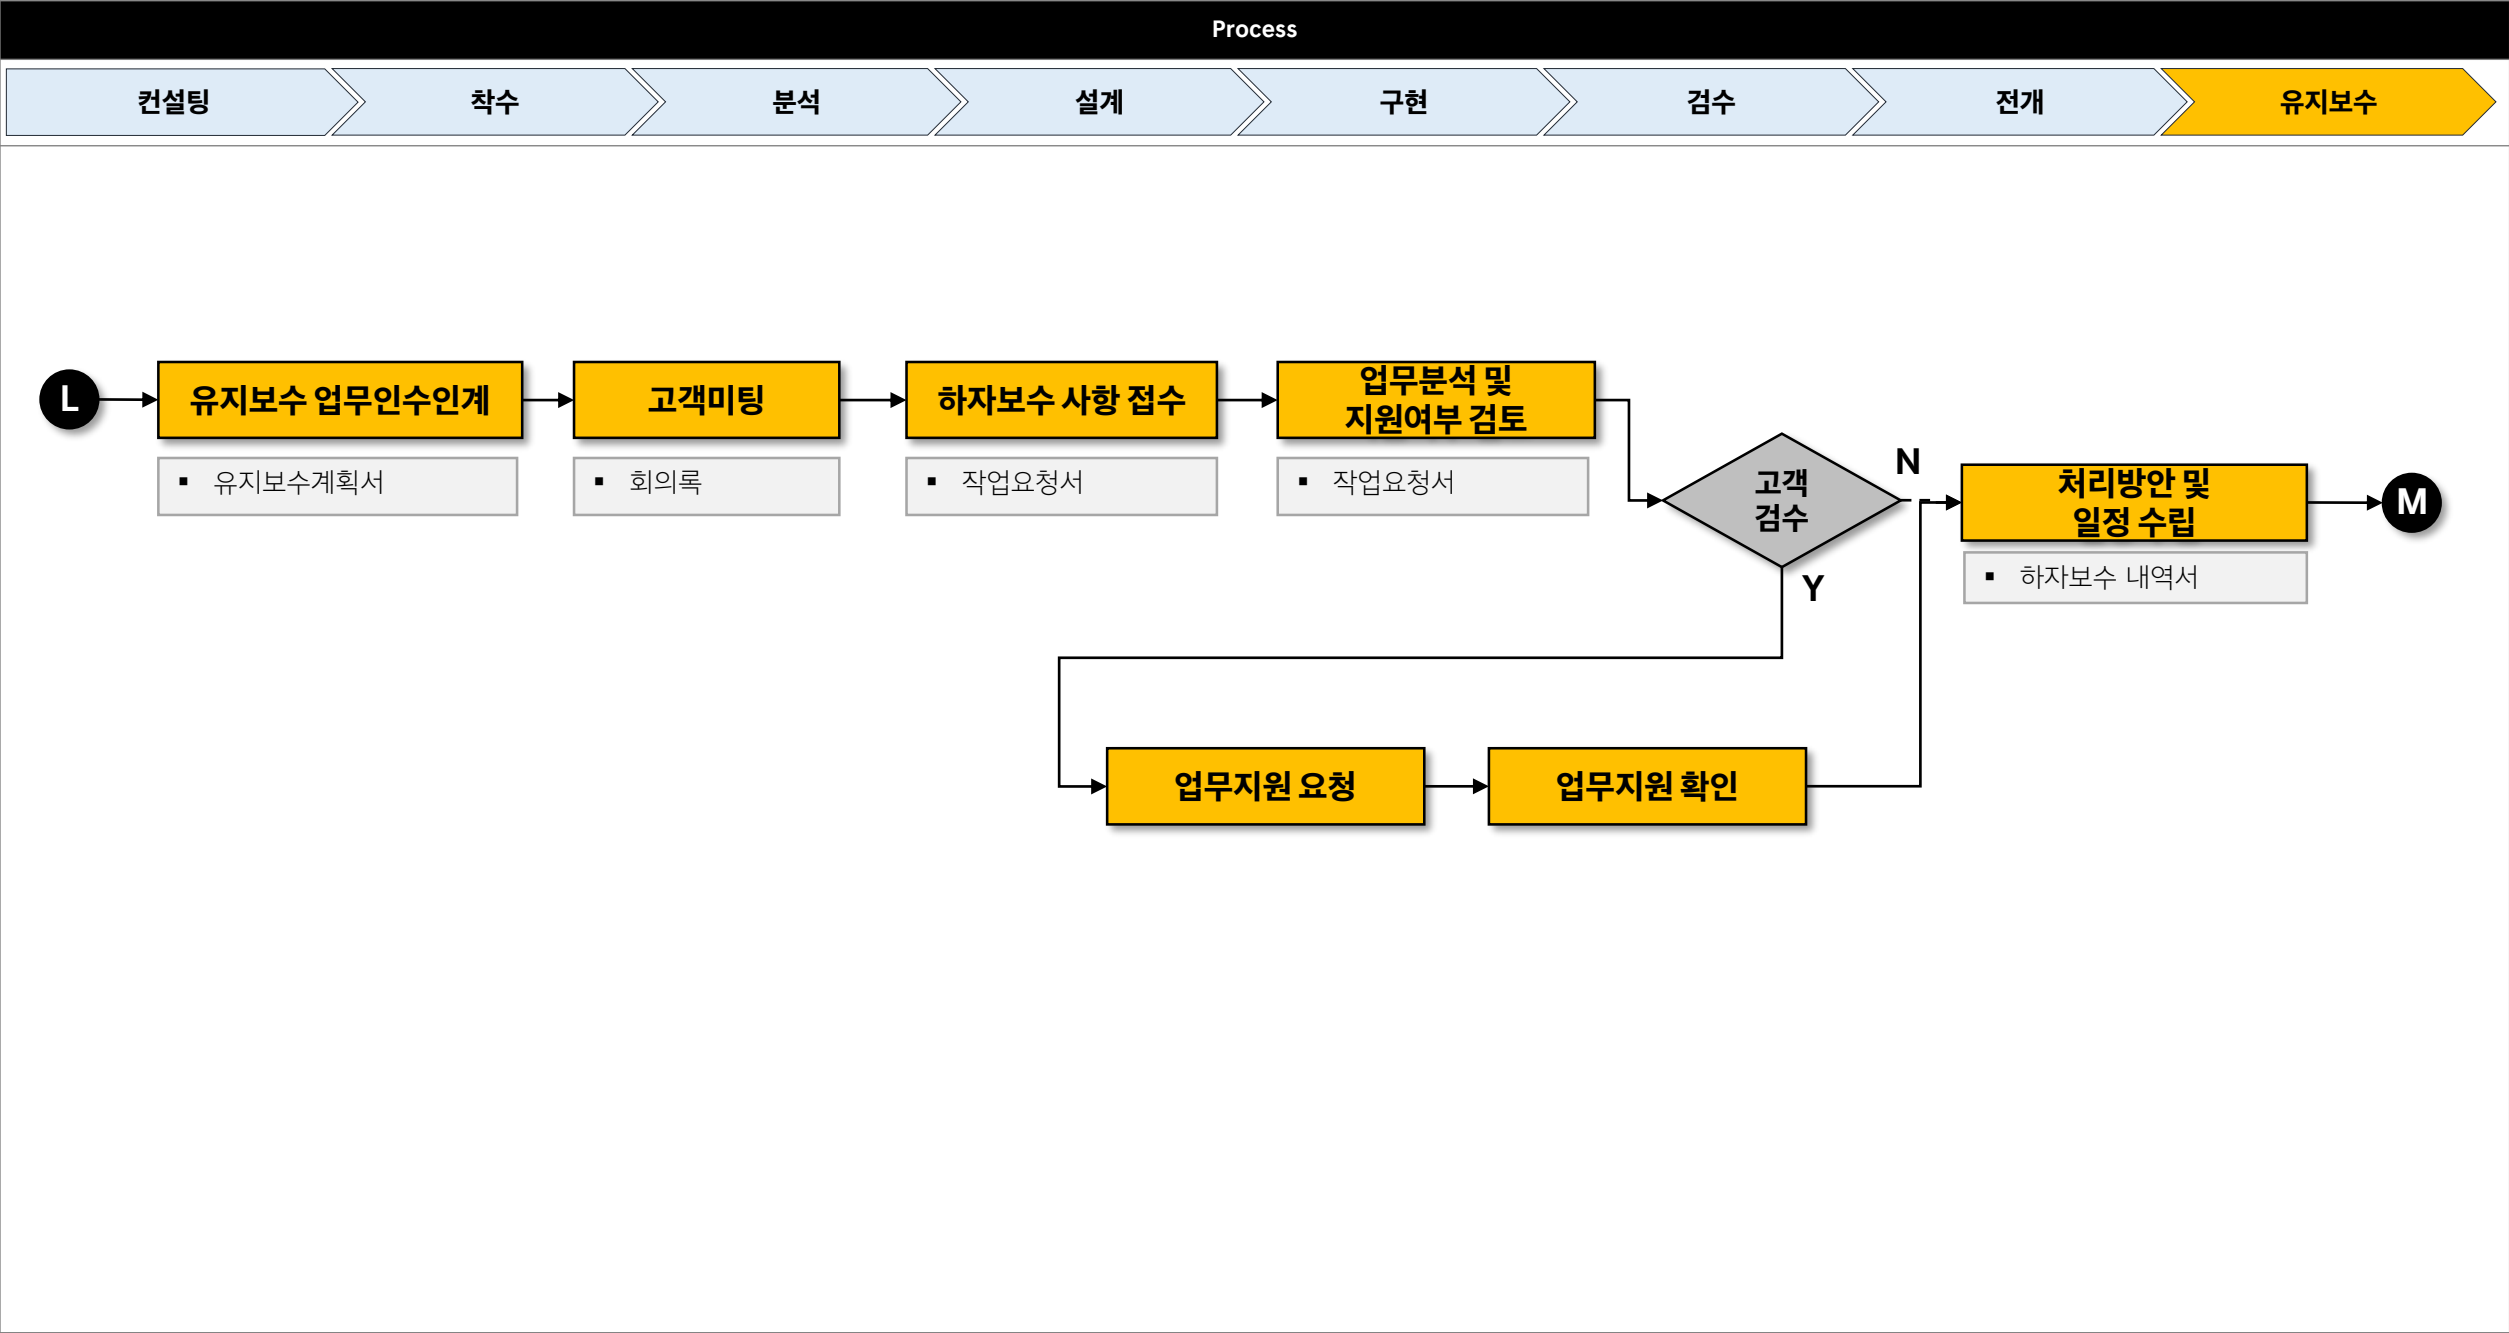


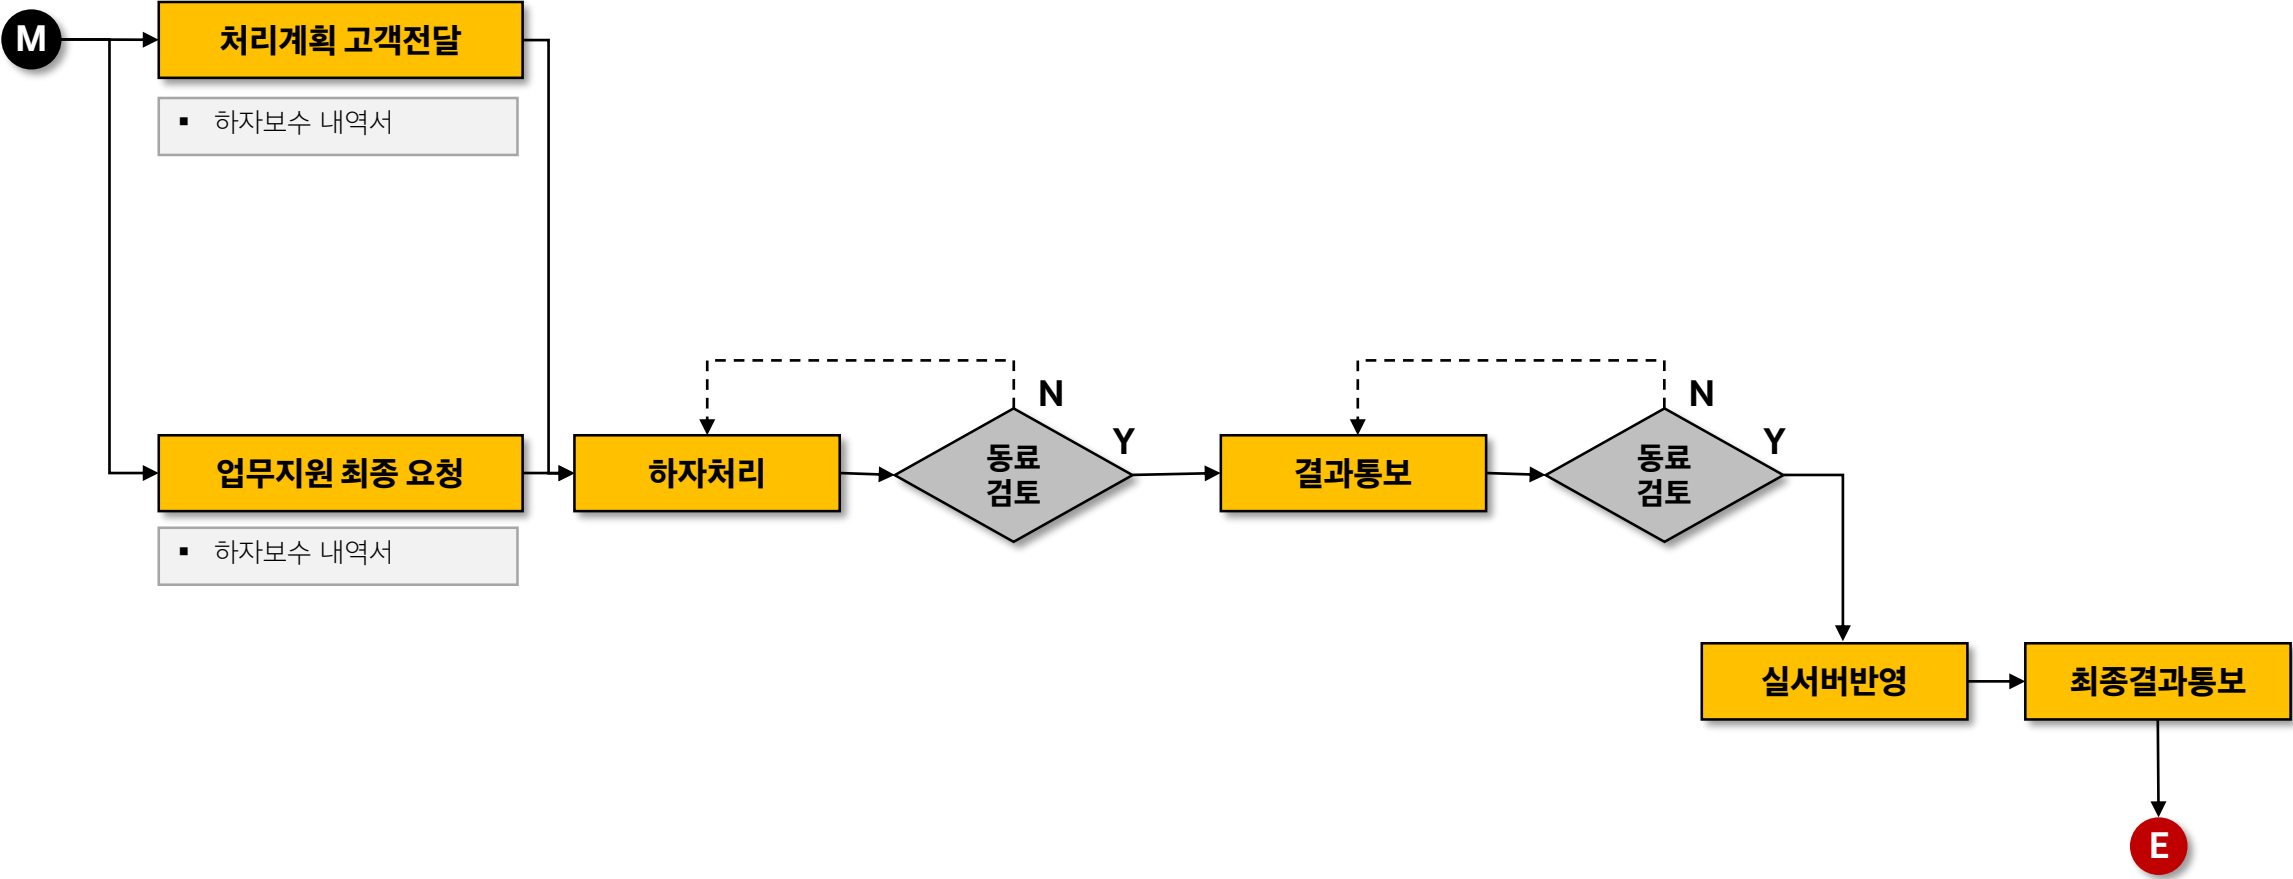


통합관리 Integration Management	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리
--------------------------------	------	------	------	------	------	--------	------

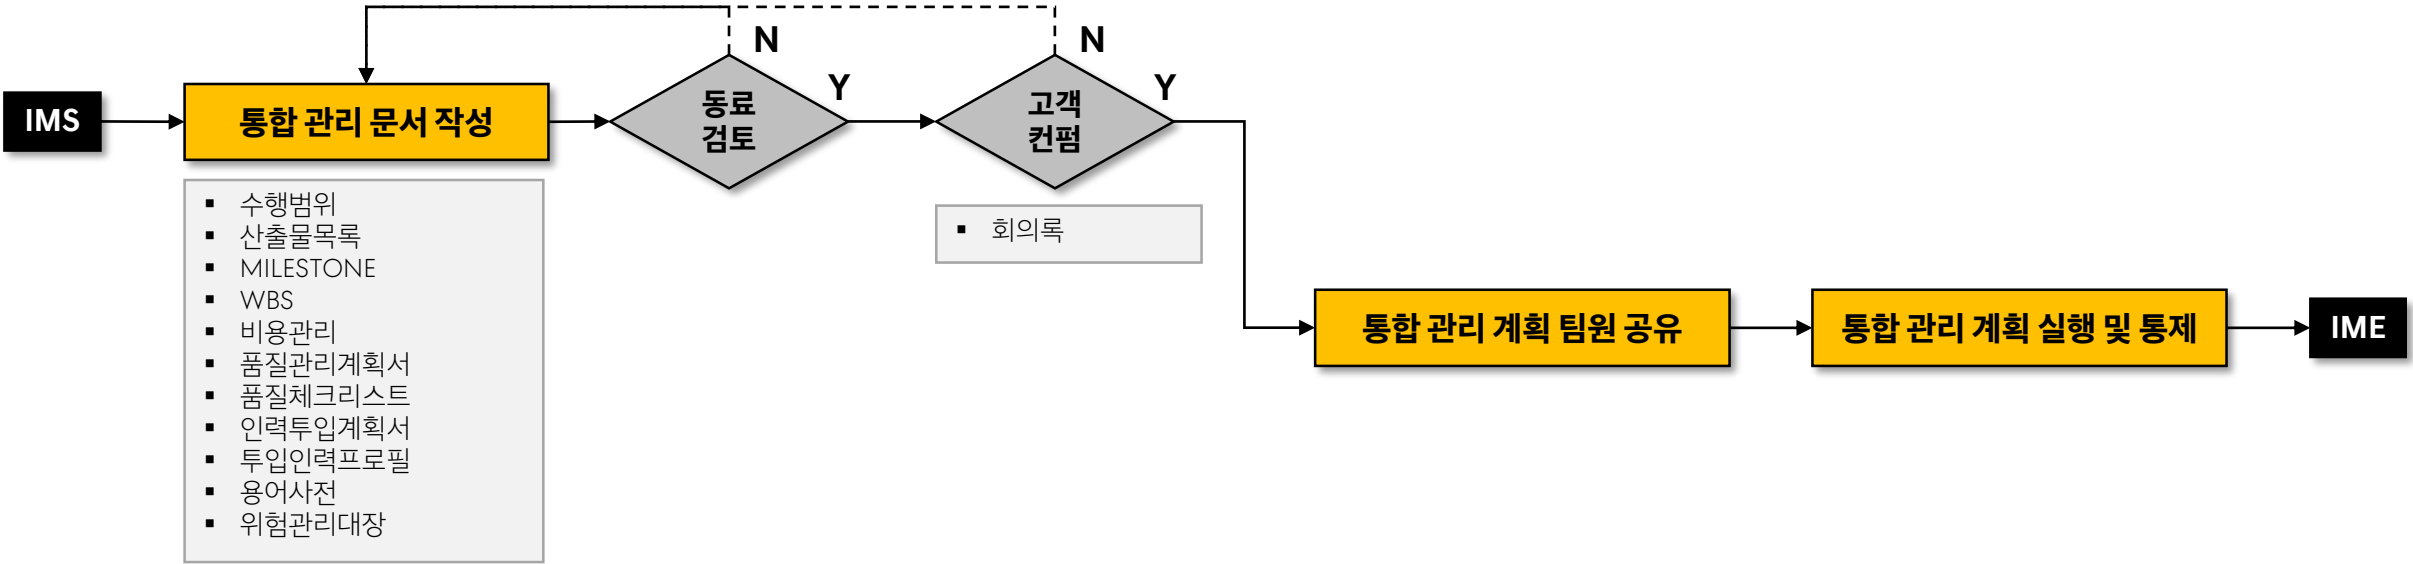


통합관리	범위관리 Scope Management	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리
------	--------------------------	------	------	------	------	--------	------

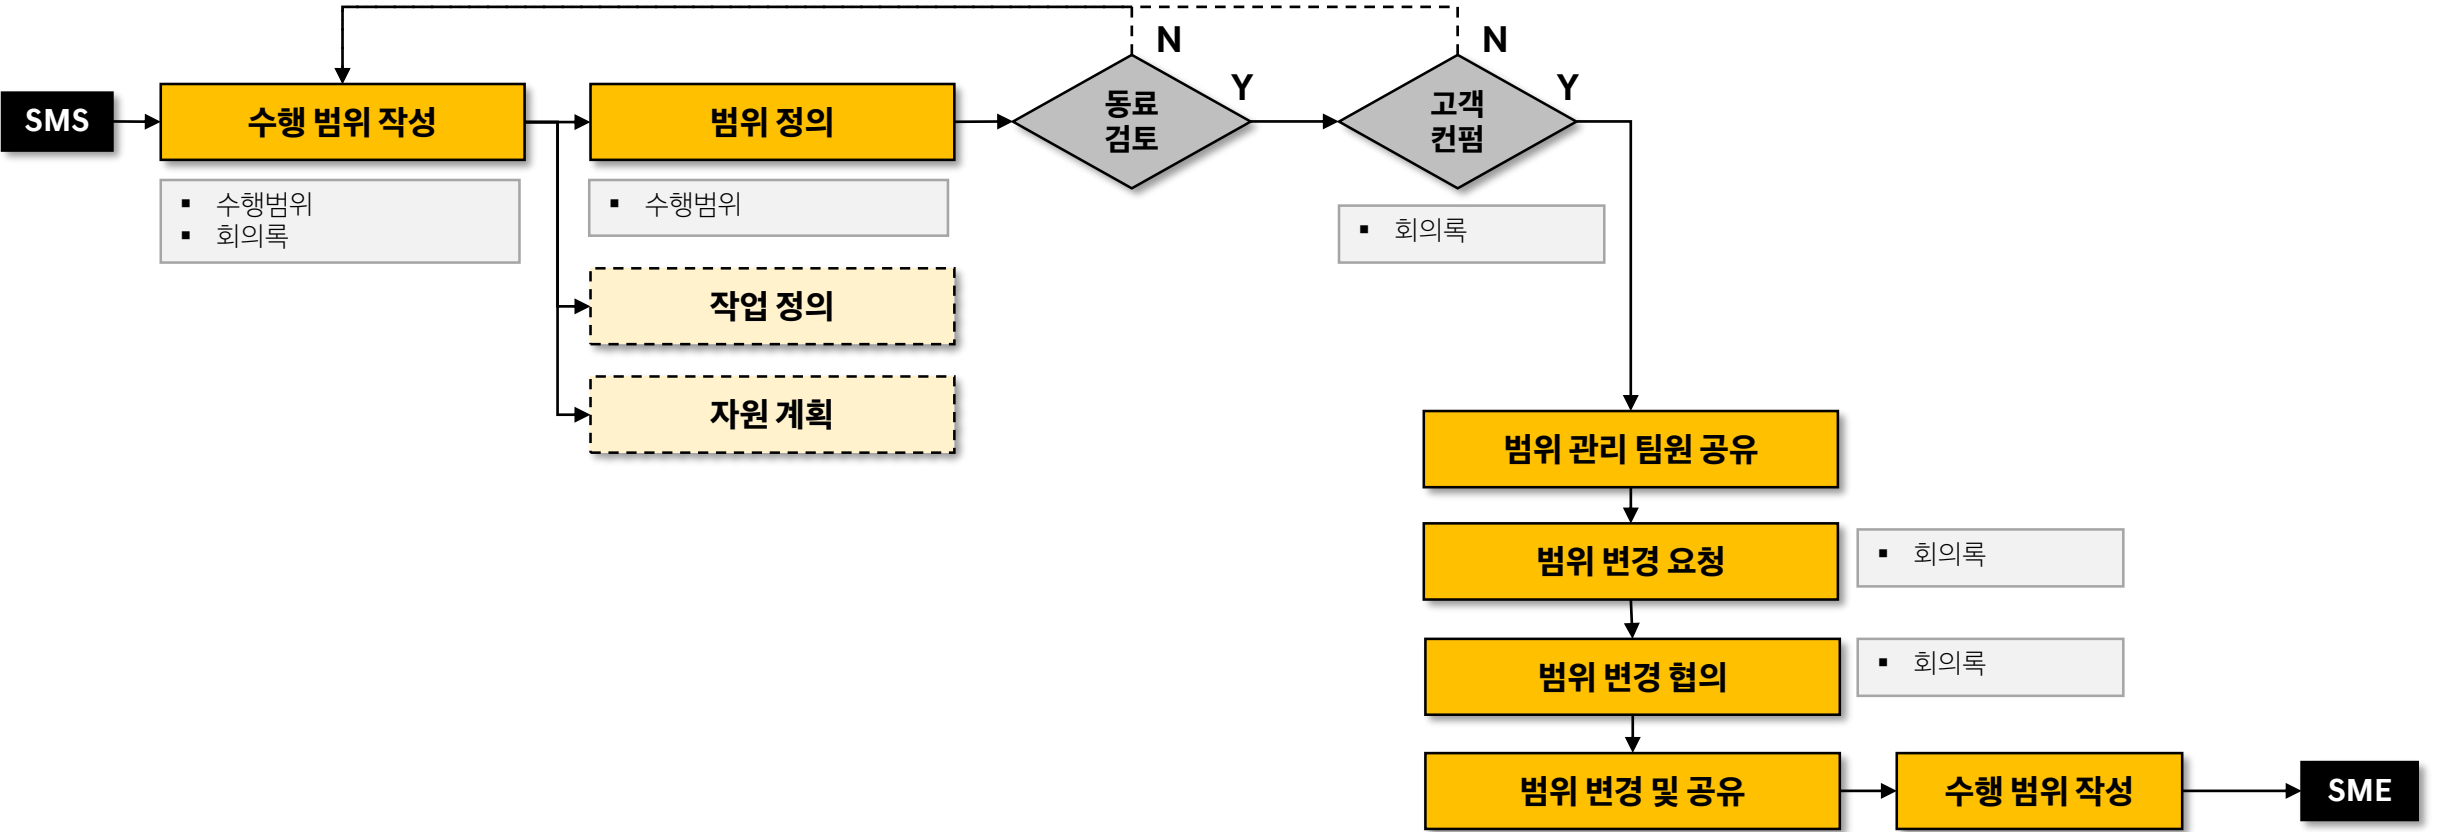


BasicIT-Method - 관리

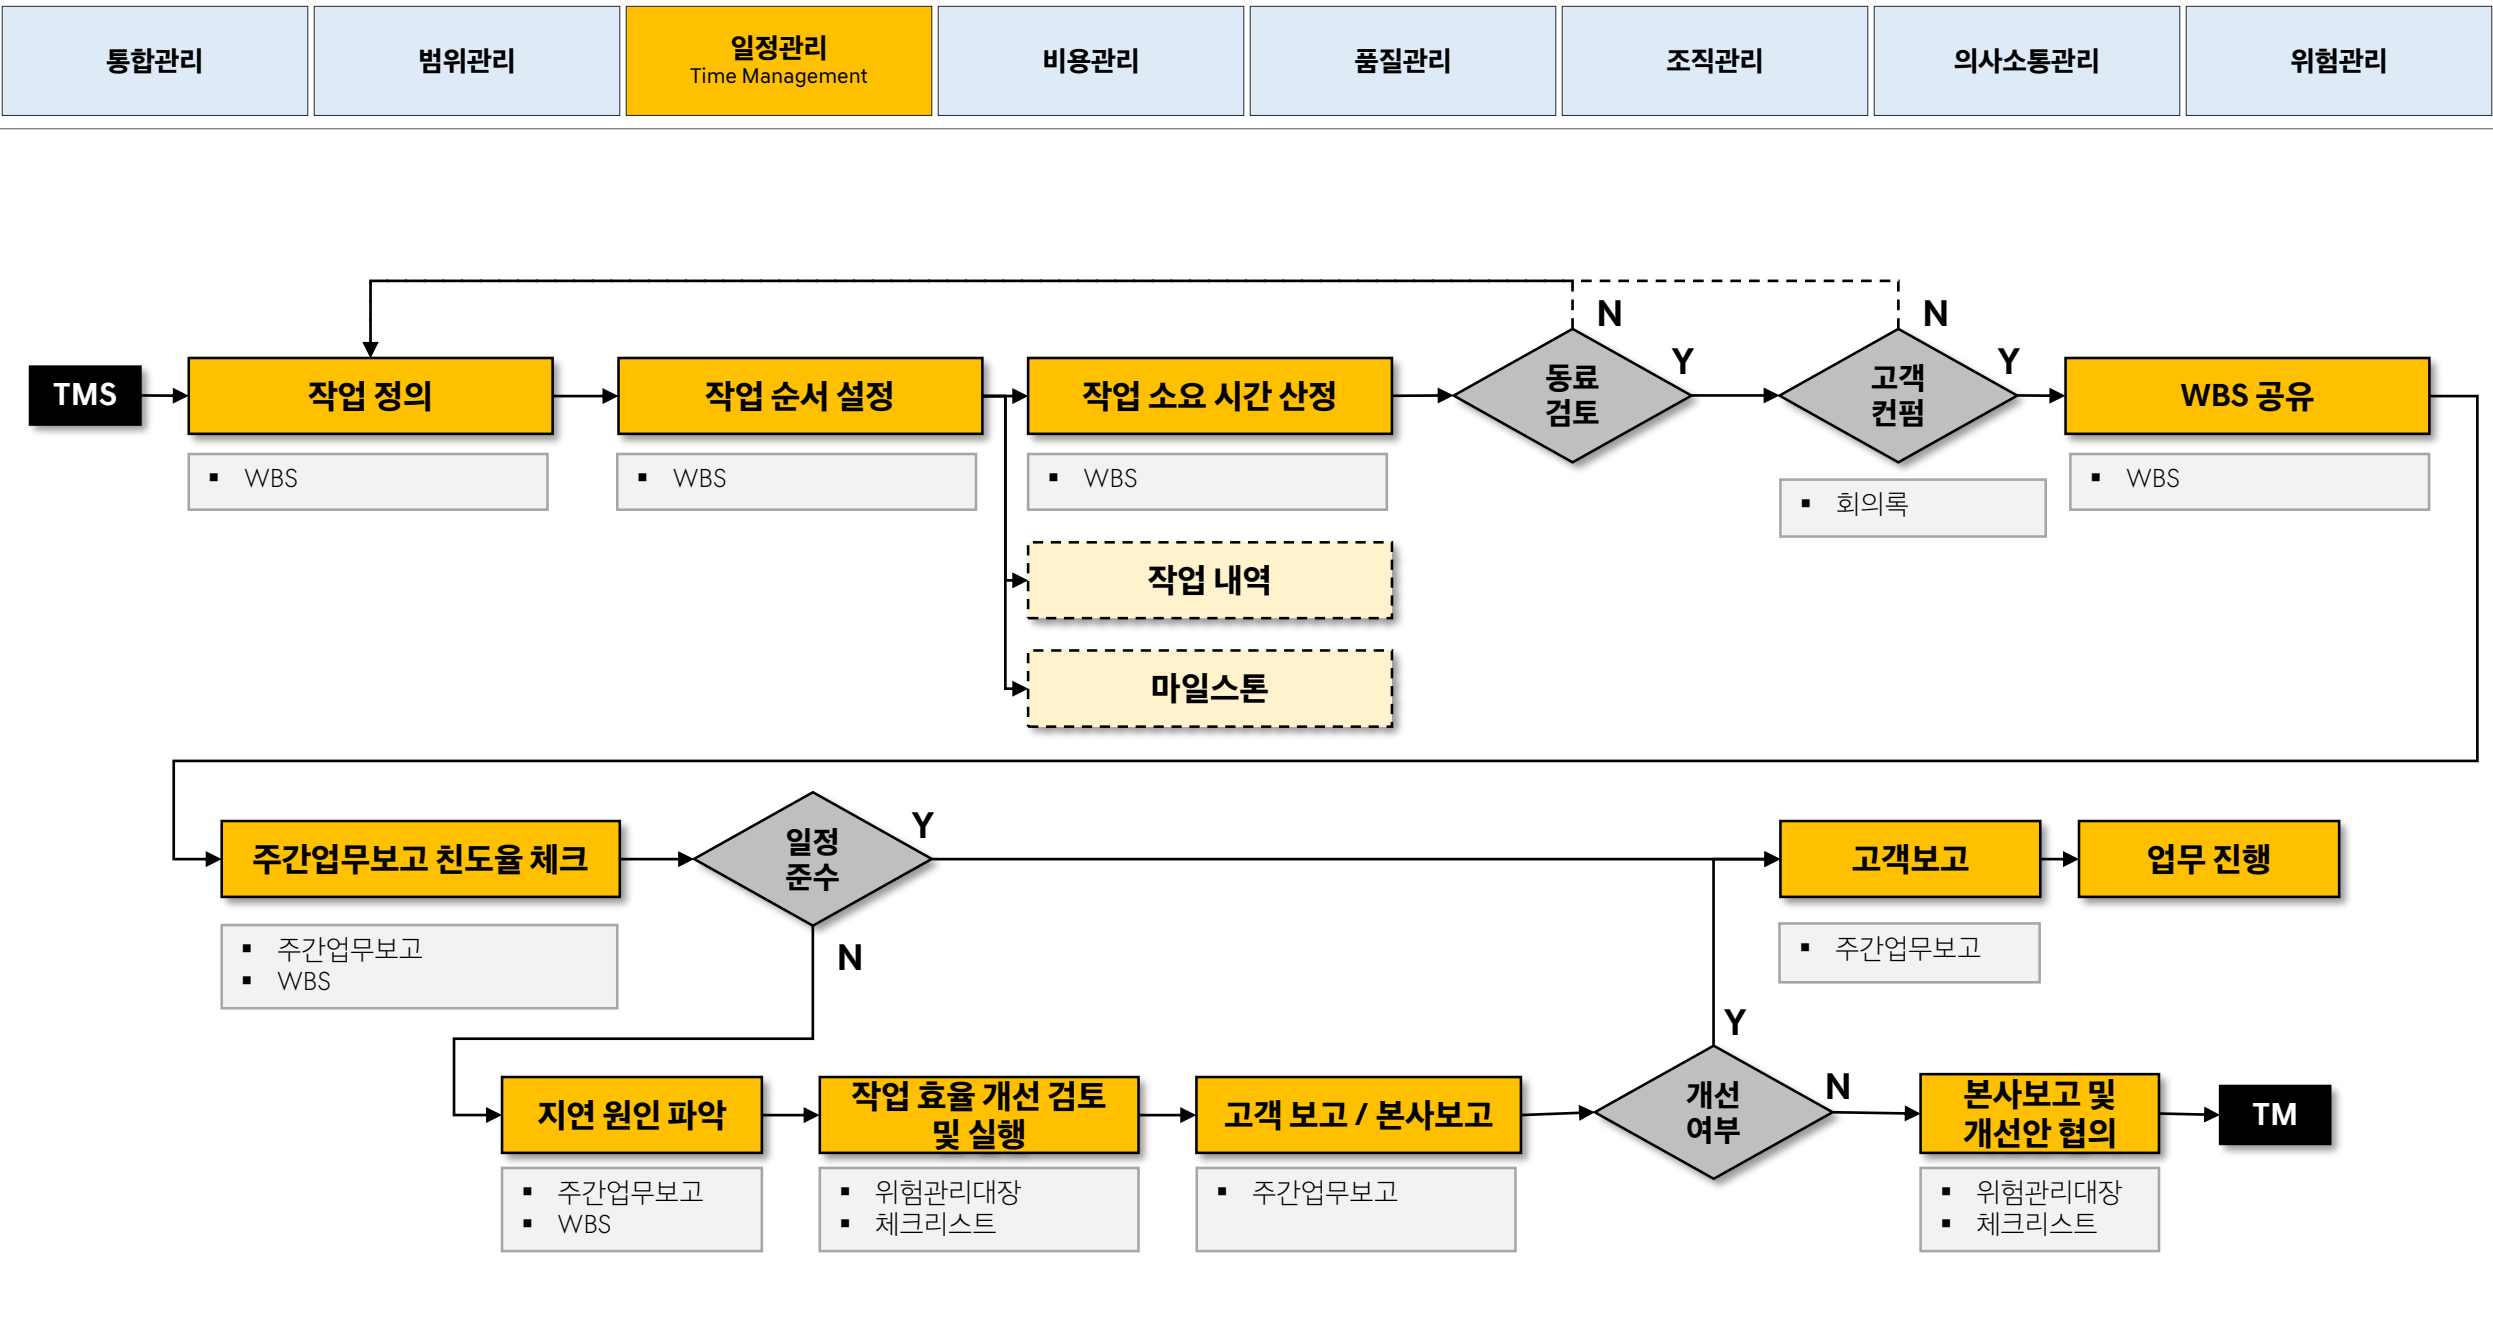


통합관리	범위관리	일정관리 Time Management	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리
------	------	-------------------------	------	------	------	--------	------

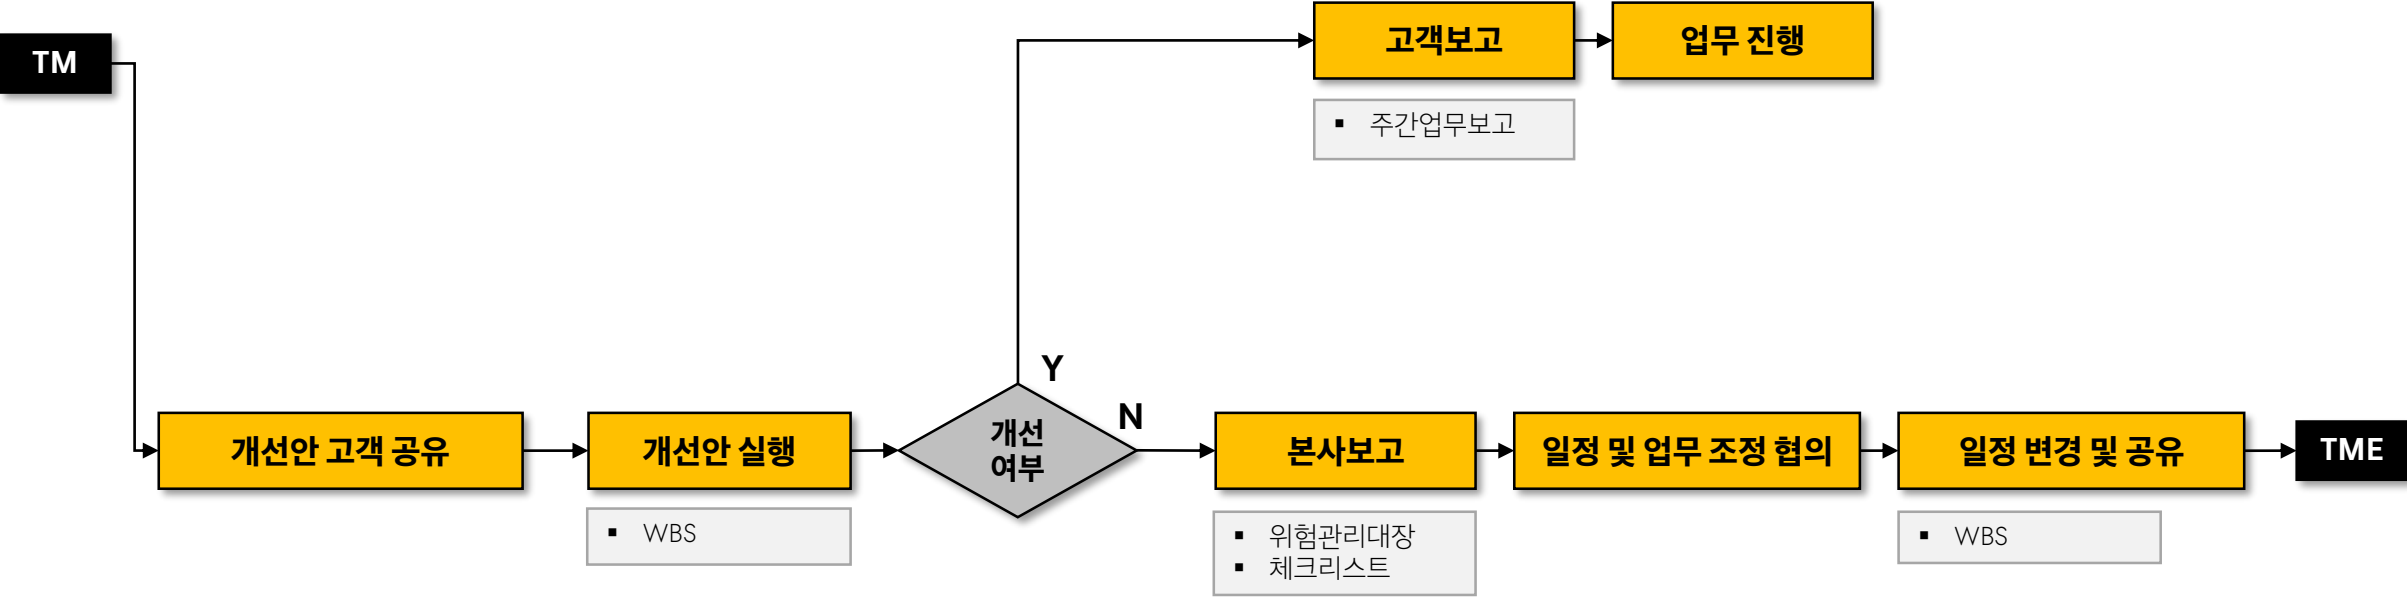


BasicIT-Method - 관리

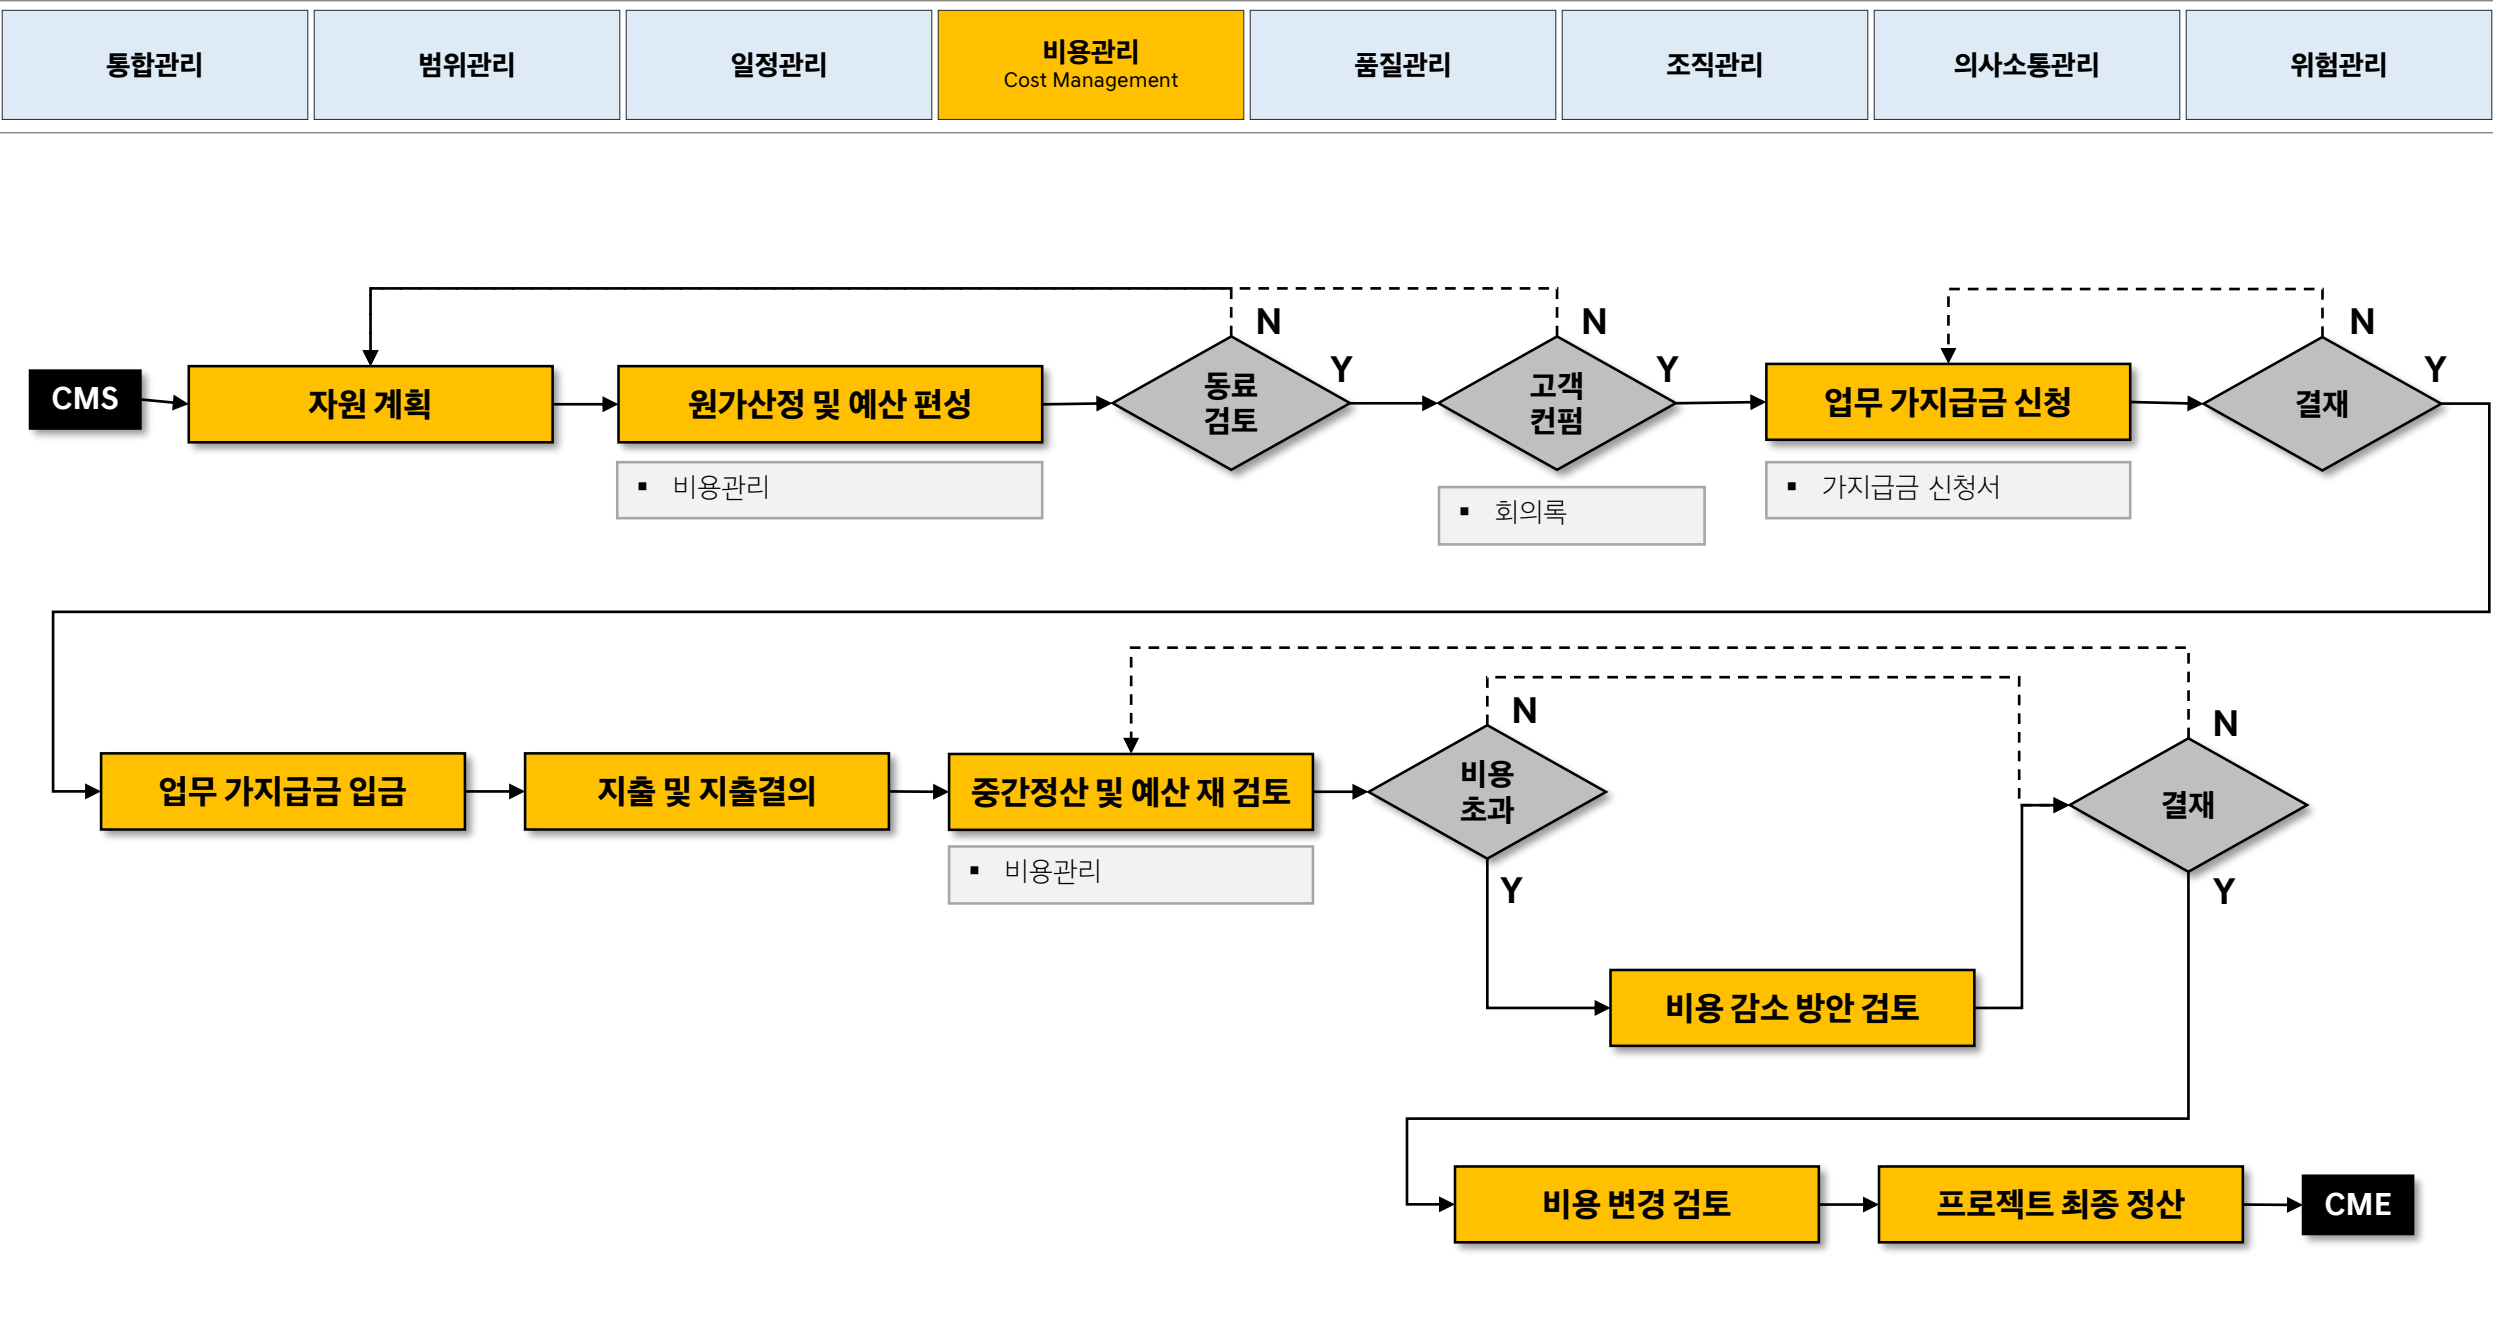

BasicIT-Method - 관리

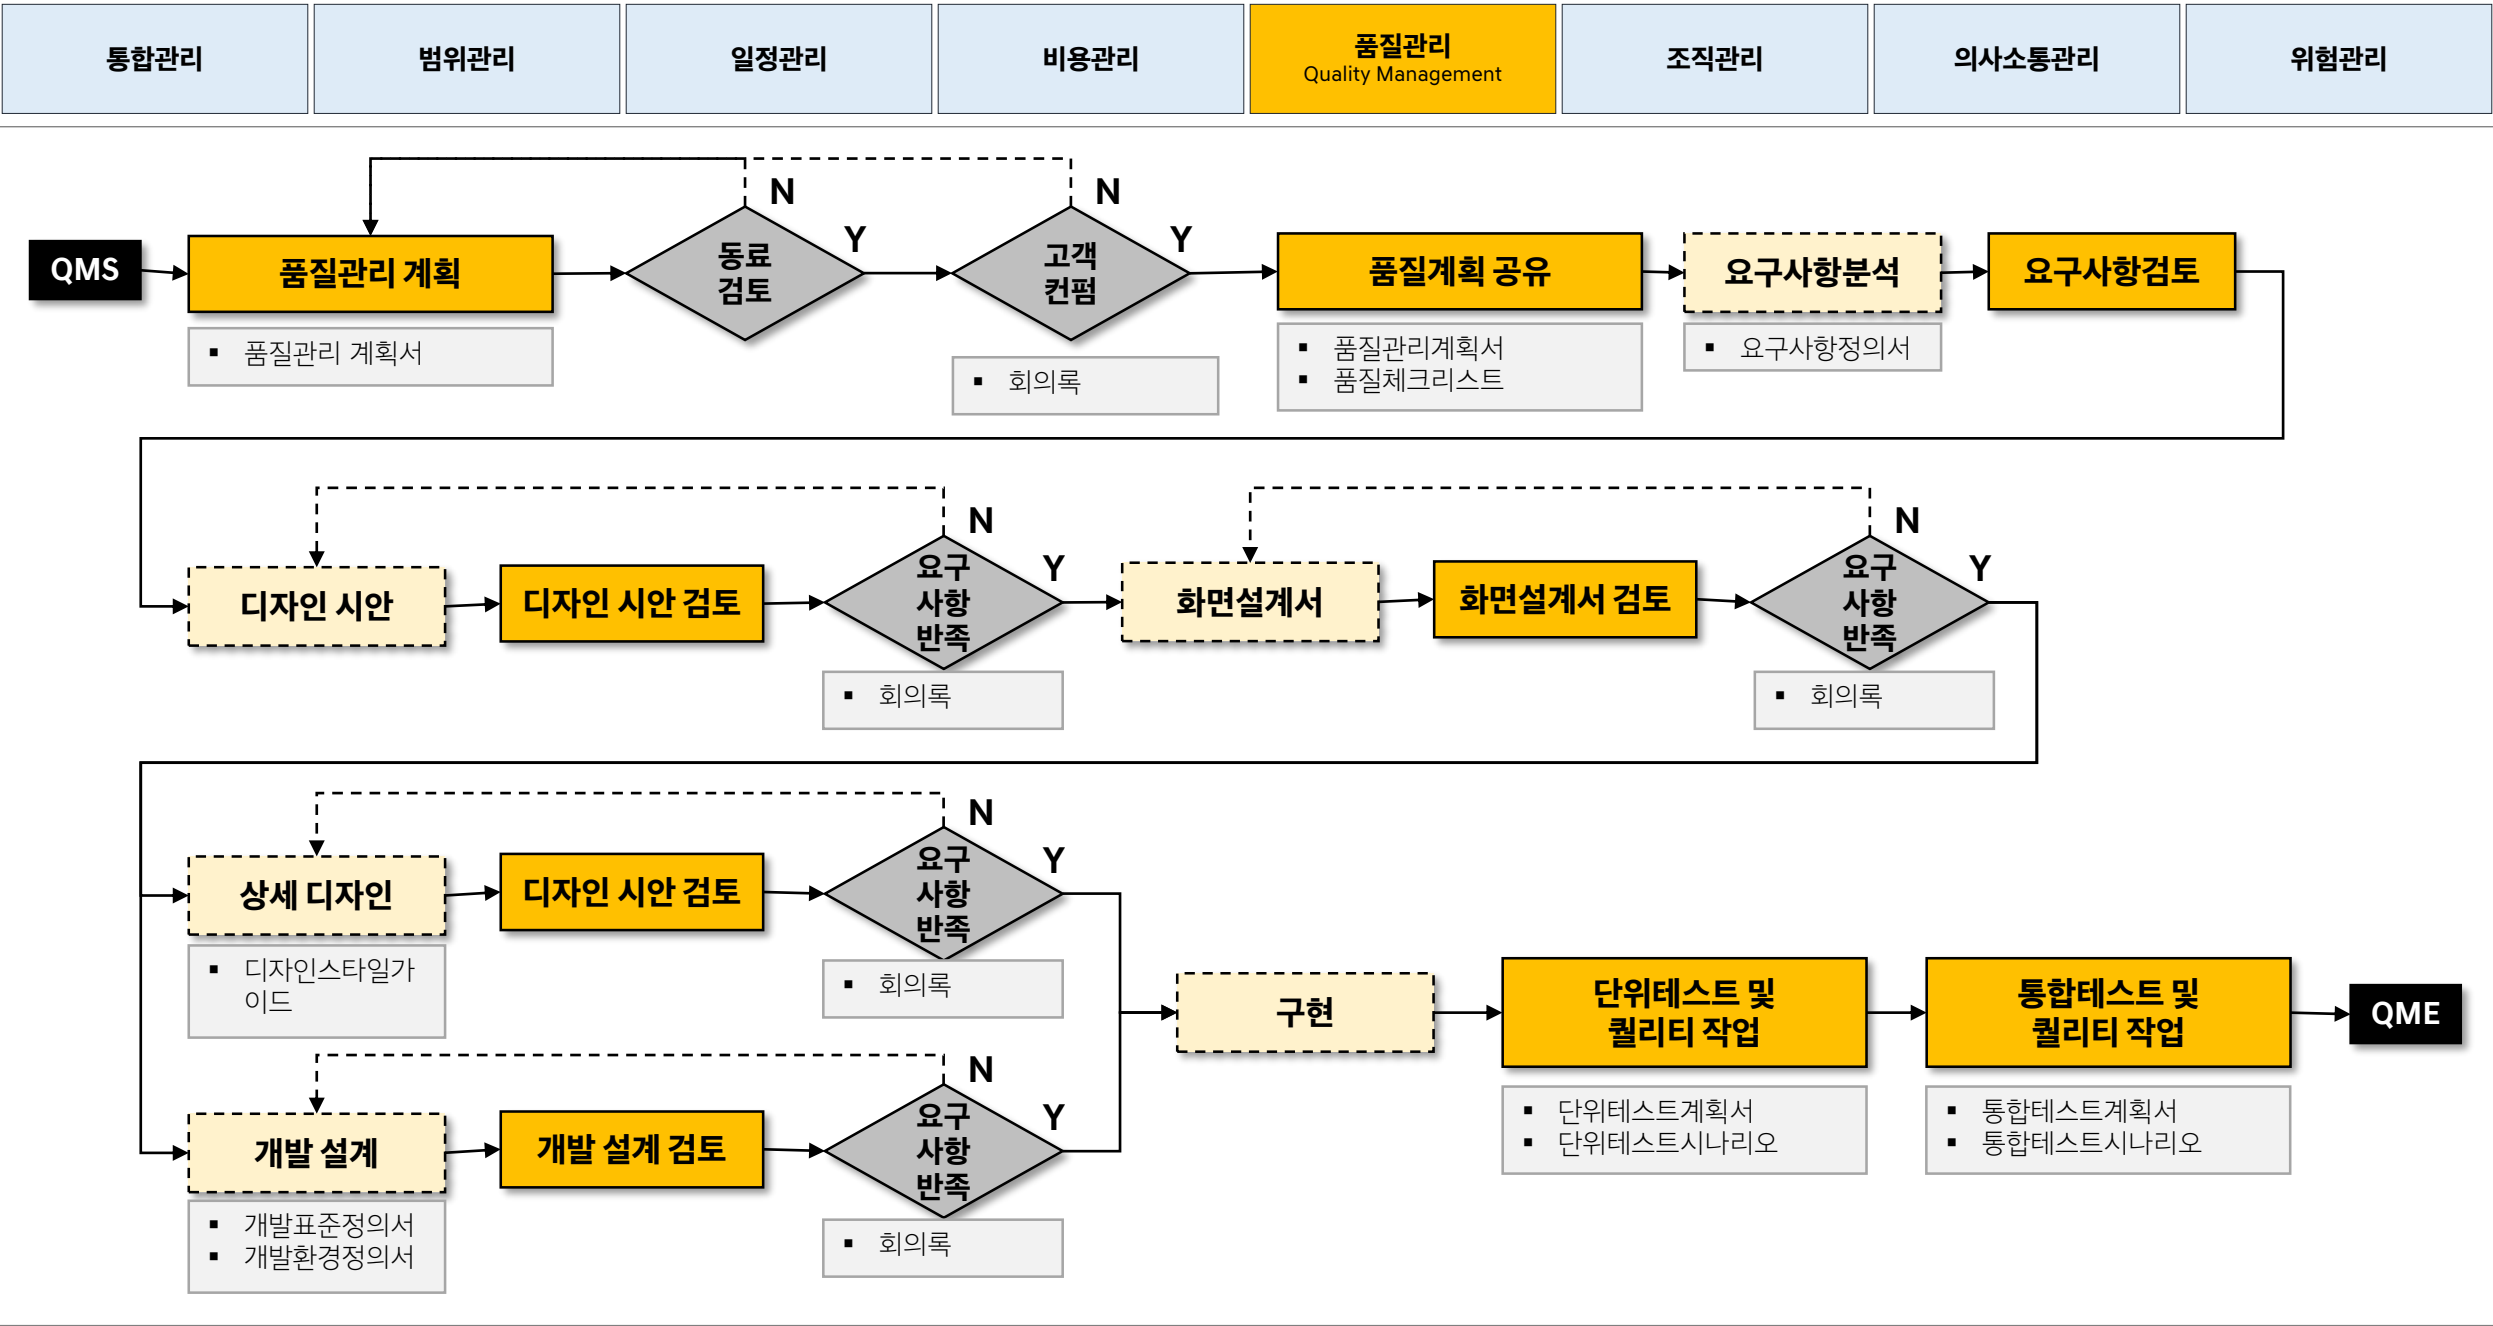


통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리 Human Resource Management	의사소통관리	위험관리
------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	------

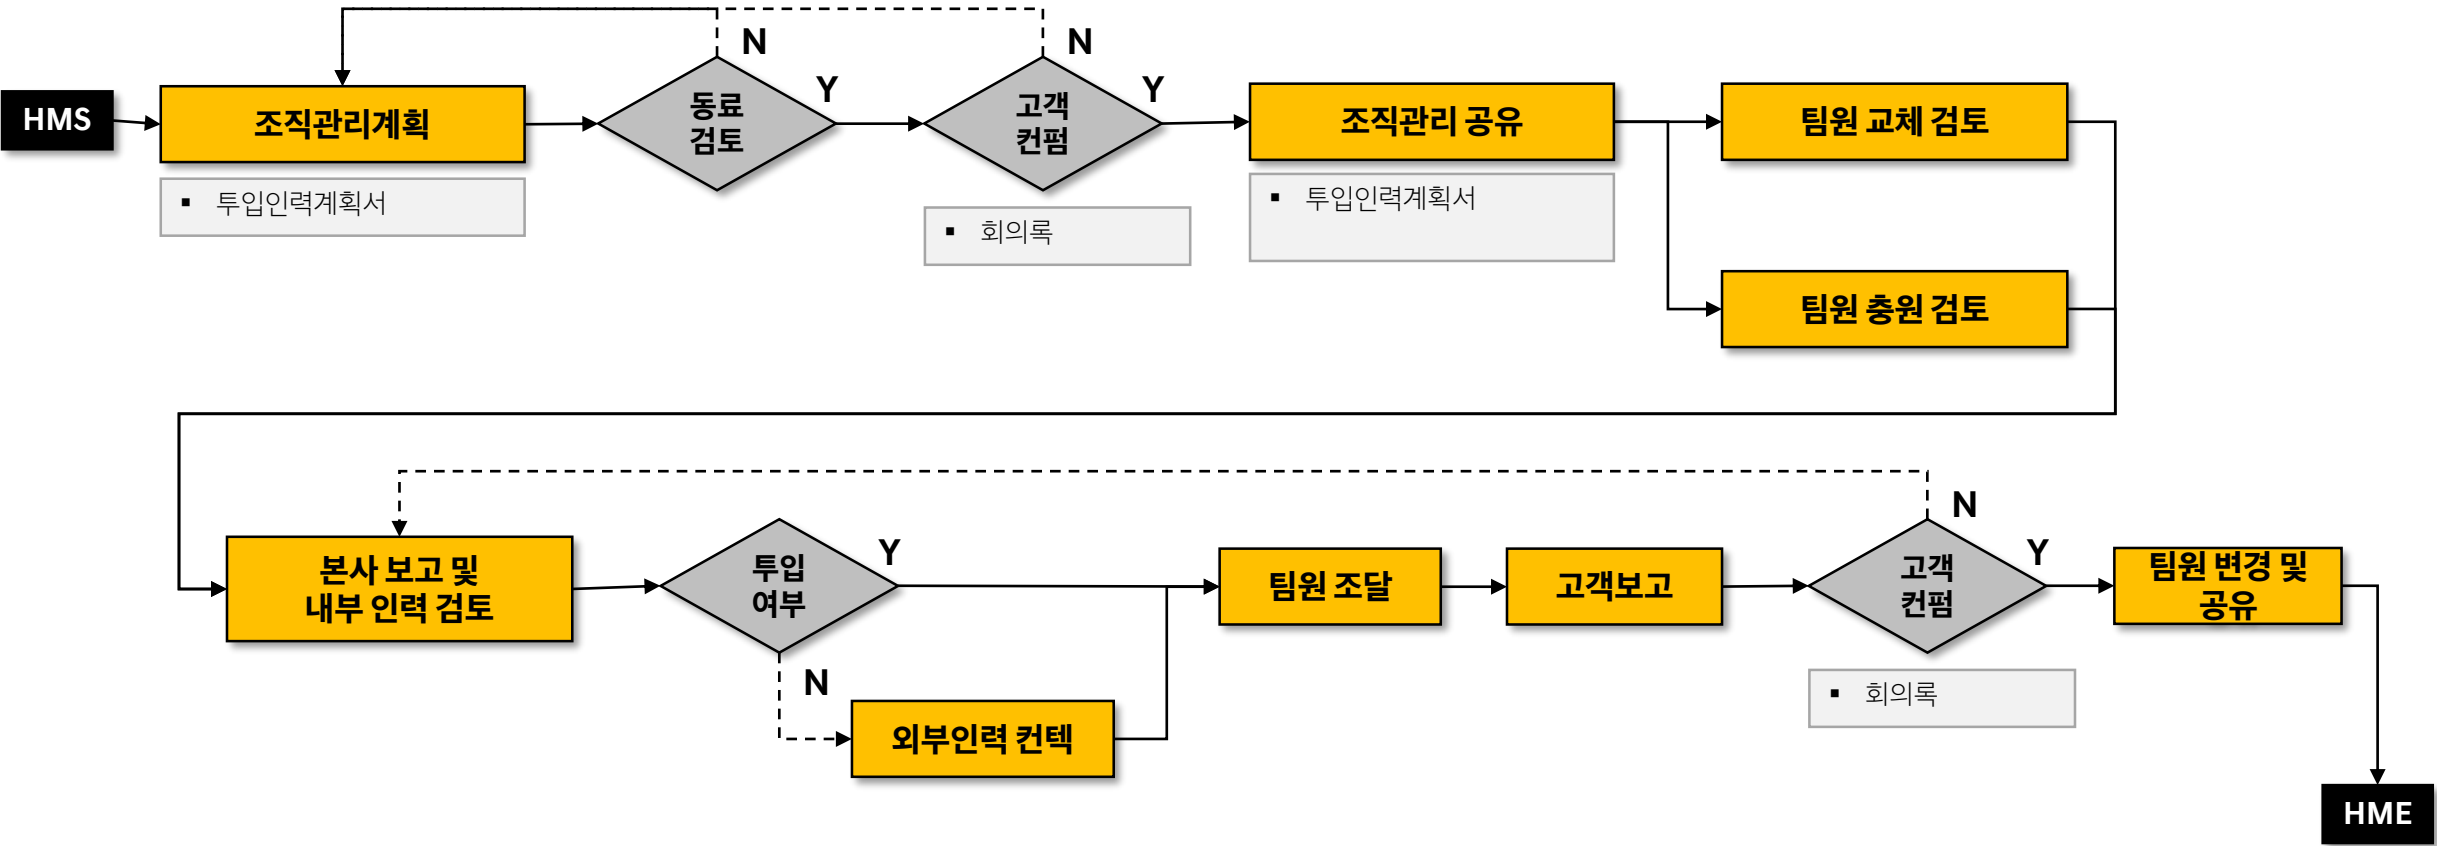


BasicIT-Method - 관리

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리 Communication Management	위험관리
------	------	------	------	------	------	---------------------------------------	------

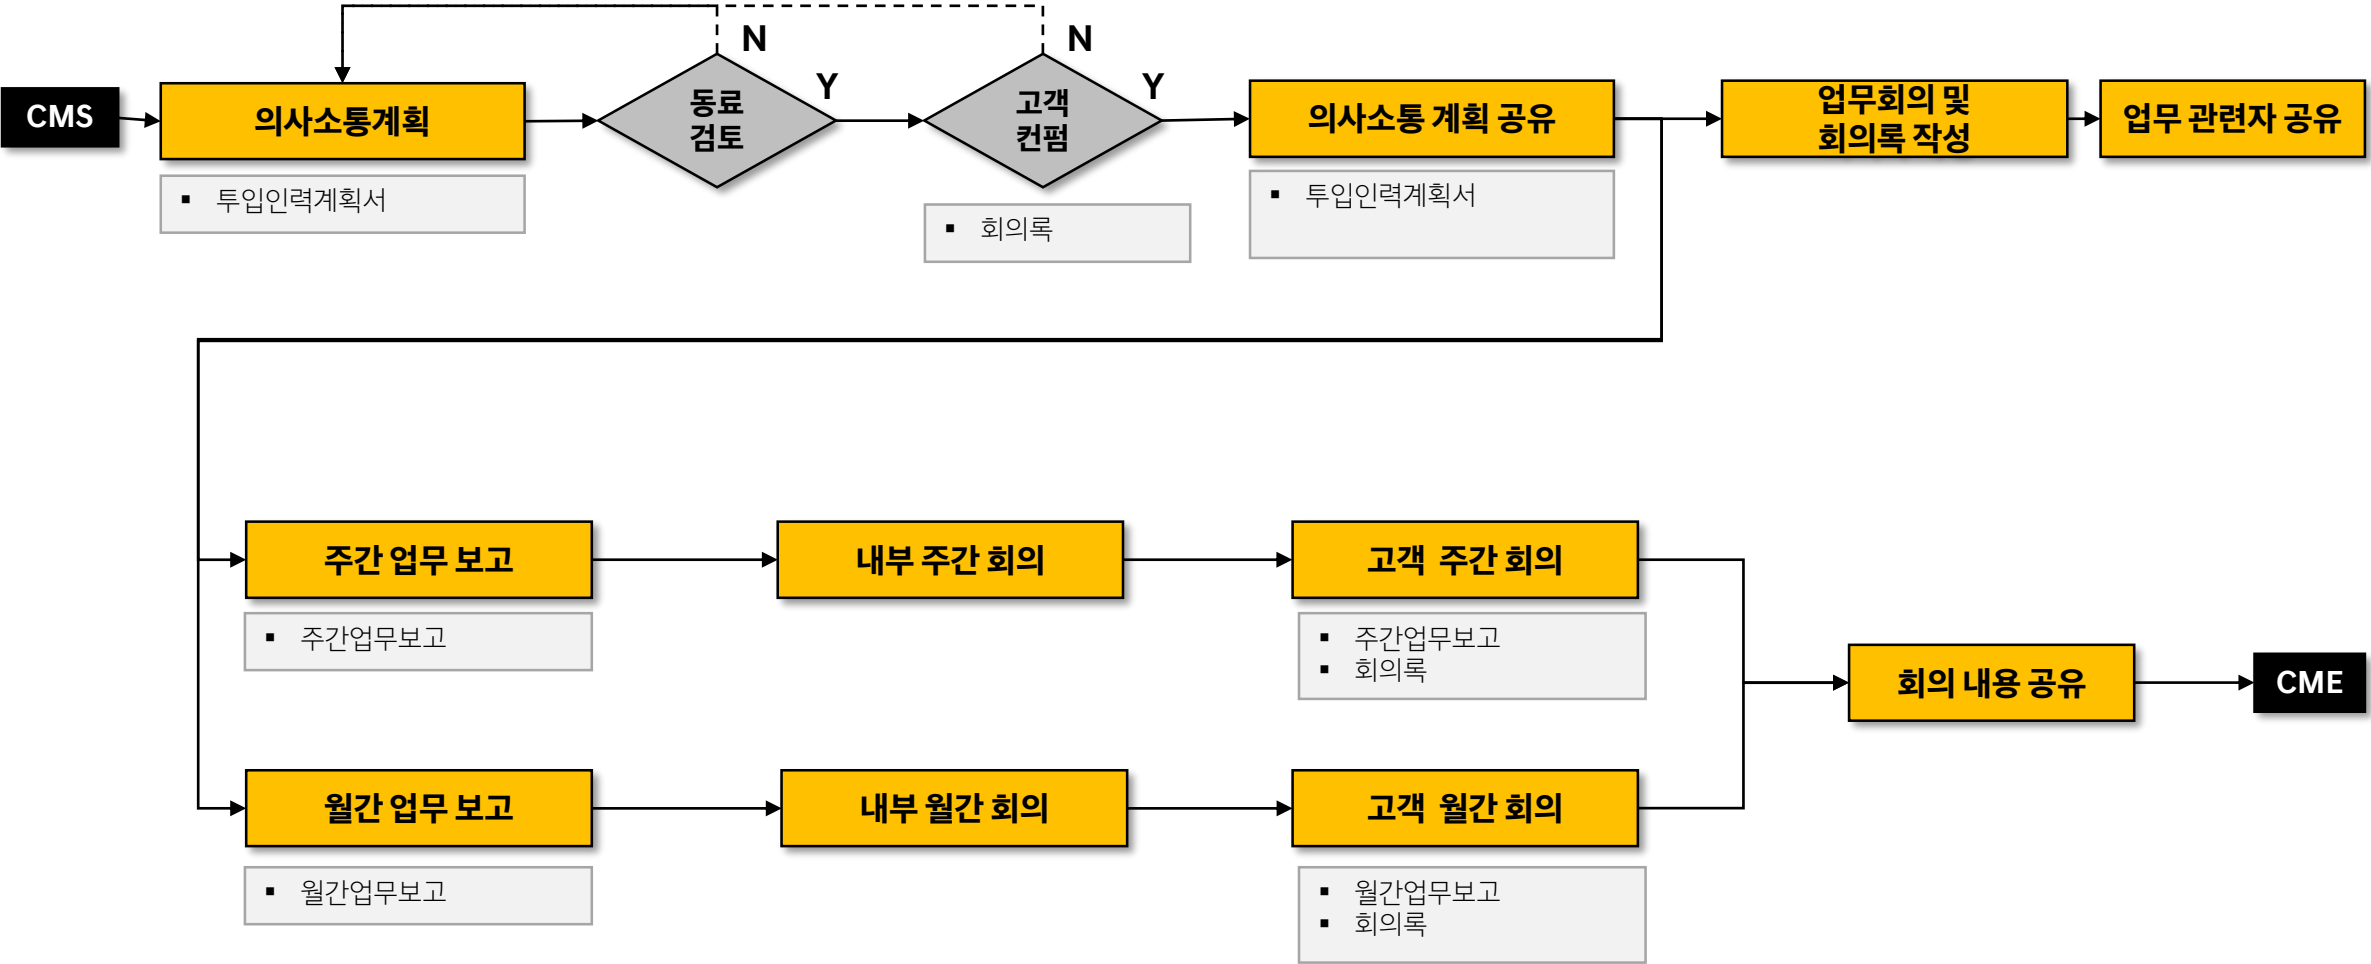

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리 Risk Management
------	------	------	------	------	------	--------	-------------------------

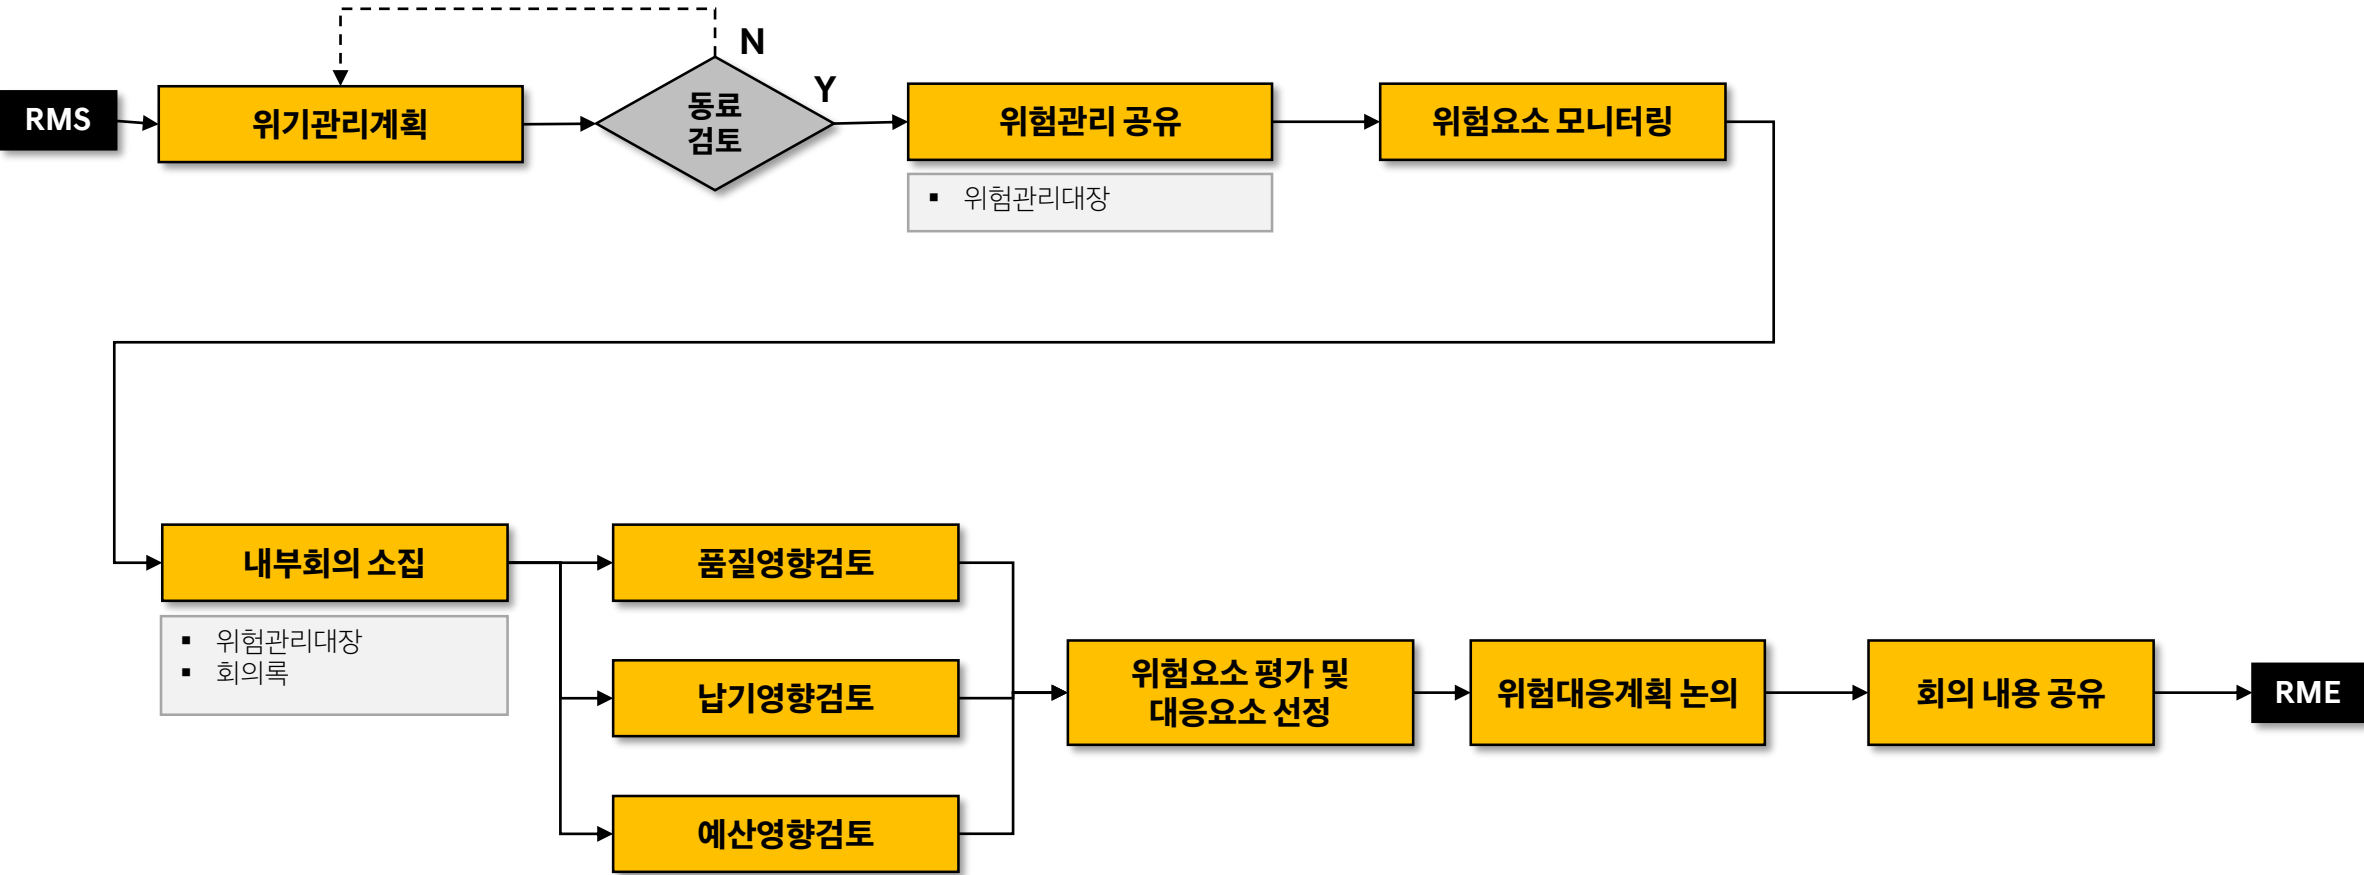

요구사항 정의

WBS

위험관리대장

사업수행계획서/착수보고서

서비스프로세스/화면설계서

보고서(주간/월간/완료)

Thank You

* 본 문서는 지정된 수신인만을 위한 것이며, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다.
따라서, 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제 3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
