프로젝트 관리

EMPASY INC.

2023.07

Table of Contents

1. Project Management
2. Empasy Method
3. Document Template

Chapter 1

Project Management

프로젝트 란?




라틴어에서 유례,
미래를 향해(pro-) 던지다(-jacere)의 합성어

어떤 목적을 위해서 던지다.

Pro – 미리 또는 ~을 위해서



Ject – 던지다 또는 해보다



인류 역사 속의 프로젝트?

쿠프왕의 대피라미드

- ✓ 4천 7백년 전 건설
- ✓ 넓이 : 227m
- ✓ 높이 : 148m
- ✓ 돌하나의 평균 무게 : 2.5 톤
- ✓ 동원 인력 : 10만 명
- ✓ 제작 기간 : 20년



만리장성

- ✓ 기원전 220년 건설
- ✓ 길이 : 5,000~6,000km
- ✓ 동원 인력 : 150만 명
- ✓ 제작 기간 : 1,000년



현대의 프로젝트?

유일한 제품, 서비스 또는 결과를 창출
하기 위하여 수행하는 **한시적인 활동**

A PROJECT IS A TEMPORARY ENDEAVOR UNDERTAKEN TO CREATE
A UNIQUE PROJECT, SERVICE, OR RESULT

PMI, PMBOK GUIDE

프로젝트의 목표 달성을 위하여 수행되는 **고유한 프로세스**의 집합으로 구성되며, 프로세스는 **시작일과 종료일이 정해져 있고** 조정되고 통제 되는 활동으로 이루어진다.

A PROJECT CONSISTS OF A UNIQUE SET OF PROCESSES CONSISTING OF COORDINATED AND CONTROLLED ACTIVITIES WITH START AND END DATES, PERFORMED TO ACHIEVE PROJECT OBJECTIVES

ISO 21500

프로젝트의 세가지 특징

Temporary

프로젝트는 명확한 시작과 종료가 있다.

Unique

프로젝트는 유일한 Product 이나 Service 를 만든다.

Progressive Elaboration

프로젝트는 계획수립과정 등은 점진적으로 구체화된다.

Project와 Operation의 차이

Project

사업의 목적 달성을 위한 일시적(Temporary)이며, 유일한(Unique) 업무

Operation

사업의 목적 달성을 위한 지속적(On-Going)이며, 반복적(Repetitive)인 업무

Project와 Operation의 차이



Project

1. Temporary(일시적)
2. Unique(유일성)
3. Progressive Elaboration(점진적 구체화)

공통점

1. 사람이 수행한다.
2. 제한된 자원에 제약을 받는다.
3. 계획, 실행 및 통제된다.

Operation

1. On-Going(지속적)
2. Repetitive(반복적)

프로젝트 관리 란?

프로젝트 관리는 프로젝트 요구사항을 충족시키기 위하여 **지식, 기능, 도구 및 기법**을 프로젝트 활동에 적용시키는 것

THE APPLICATION OF KNOWLEDGE, SKILLS, TOOLS, AND TECHNIQUES TO PROJECT ACTIVITIES TO MEET PROJECT REQUIREMENTS

PMI, PMBOK GUIDE


프로젝트 관리의 구성 요소

1. 요구사항(Requirement)의 정의 및 식별
2. 명확하고 달성 가능한 프로젝트 목표 수립
3. 품질, 범위, 일정, 원가에 대한 경쟁적 요구에 대한 균현
4. 다양한 이해관계자들의 서로 다른 관심과 기대에 대한 사양(Specification), 계획(Plan), 접근 방법(Approach)을 적용

PMI, PMBOK GUIDE


프로젝트 관리의 제약 조건

- ✓ 프로젝트의 범위, 일정, 원가는 서로 상충 관계로, 어느 한 가지가 변경될 경우 다른 요소에 영향을 미친다.
- ✓ 3가지 요소 사이의 균형이 프로젝트의 품질에 영향을 준다.

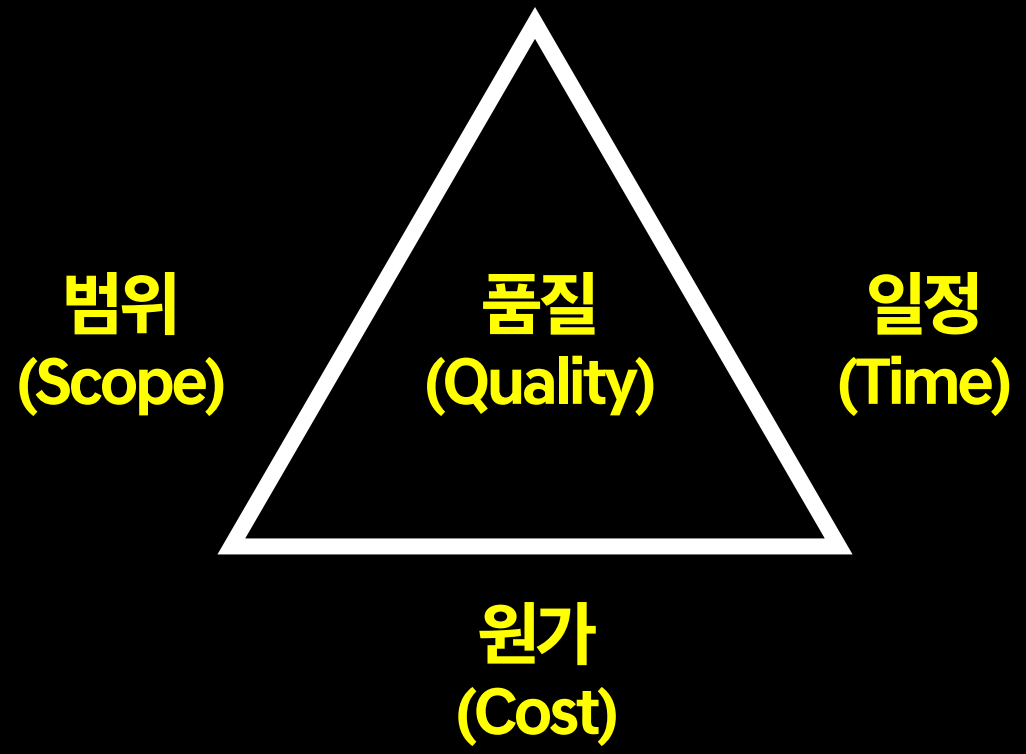

프로젝트 관리에 필요한 전문 지식

1. 프로젝트관리 지식 체계
   (The Project Management Body of Knowledge)
2. 응용 분야의 지식, 표준, 법규
   (Application area knowledge, standards, and requlations)
3. 프로젝트 환경에 대한 이해
   (Understanding the project environment)
4. 일반적인 관리 지식 및 기술
   (General management knowledge and skills)
5. 대인관계 기술
   (Interpersonal Skils)

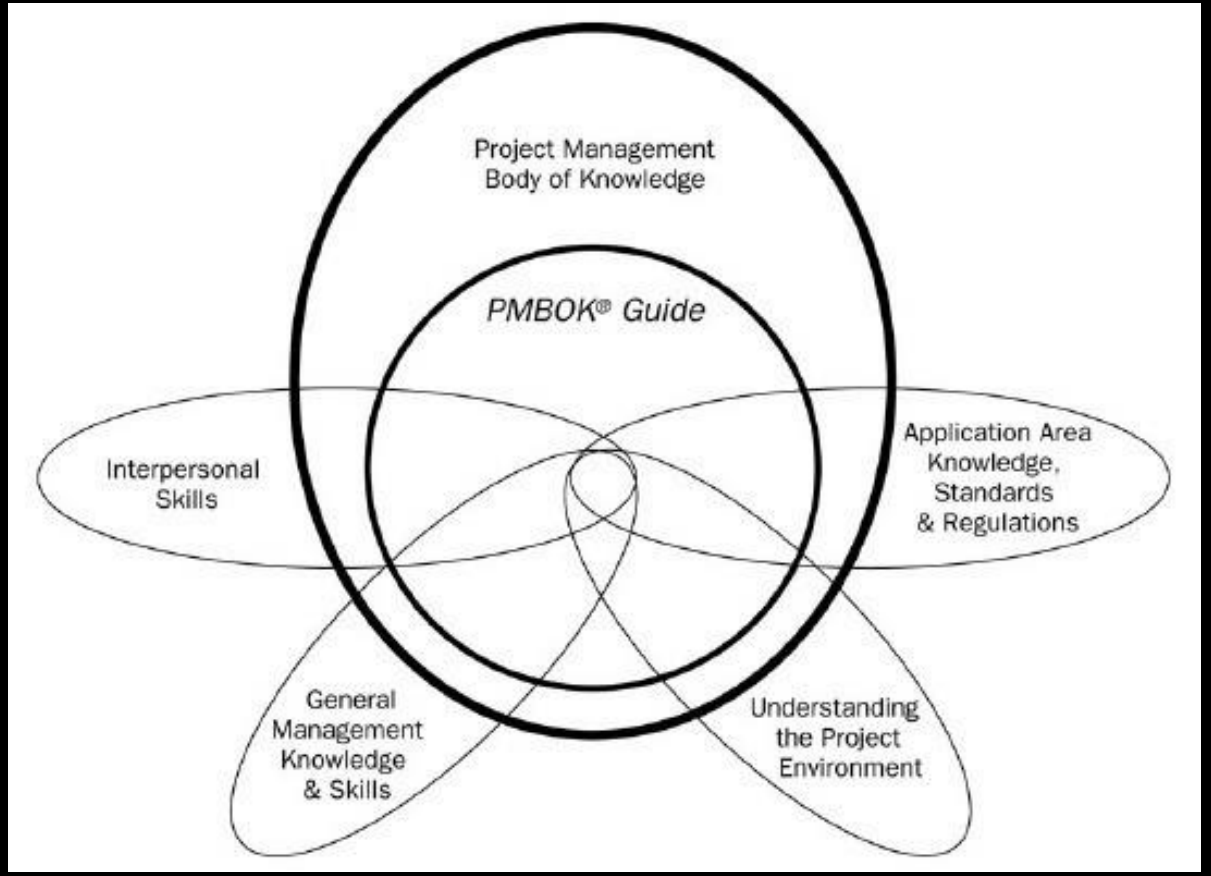

PMI, PMBOK GUIDE

1. 대표적인 프로젝트 관리 지식 체계

- ✓ PMI의 PMBOK Guide
- ✓ ISO 21500
- ✓ PRINCE2

PMBOk Guide

- ✓ 미국 PMI에서 1983년 발간을 시작하여 계속된 개정을 거쳐 현재 7판 (2019년) 까지 발간
- ✓ 10개의 지식영역과 5개의 프로세스 그룹에 따라 47개의 논리적으로 연결된 프로세스로 구성

지식영역	프로세스 그룹					프로세스 수
	착수 (Initiating)	기획 (Planning)	실행 (Executing)	감시및통제 (Monitoring & Controlling)	종료 (Closing)	
통합관리	프로젝트헌장 개발	프로젝트관리 계획개발	프로젝트작업 지시/관리	프로젝트작업 감시/통제 통합변경통제	프로젝트 또는 단계 종료	6
범위관리		범위관리계획 요구사항수집 범위정의 WBS작성		범위검증 범위통제		6
일정관리		일정관리계획 활동정의 활동순서배열 활동자원산정 활동기간산정 일정개발		일정통제		7
원가관리		원가관리계획 원가산정 예산편성		원가통제		4
품질관리		품질계획	품질보증수행	품질통제		3
인적자원관리		인적자원관리 계획	프로젝트팀확보 프로젝트팀개발 프로젝트팀관리			4
의사소통관리		의사소통관리 계획	의사소통관리	의사소통통제		3
위험관리		위험관리계획 위험식별 정성적위험분석 정량적위험분석 위험대응기획		위험통제		6
조달관리		조달관리계획	조달수행	조달통제	조달종료	4
이해관계자 관리	이해관계자식별	이해관계자관리계획	이해관계자참여관리	이해관계자참여통제		4
프로세스 수	2	24	8	11	2	47

ISO 21500

- ✓ 국제표준화기구(ISO)에 의해 개발된 프로젝트 관리 국제표준(37개국에서 참여하여 2012년 9월1일에 발표)
- ✓ PMBOK Guide 와 유사하게 10개 주제 그룹과 5개의 프로세스그룹에 따라 논리적으로 연결된 39개의 프로세스들로 구성
- ✓ 우리나라는 2013년 11월에 ISO 21500 이행 가이드 개발(기술표준원)

주제그룹	프로세스 그룹					프로세스 수
	착수 (Initiating)	기획 (Planning)	실행 (Implementing)	통제 (Controlling)	종료 (Closing)	
통합관리	프로젝트헌장 개발	프로젝트관리 계획개발	프로젝트작업 지시	프로젝트작업 통제 변경통제	프로젝트 또는 단계 종료 교훈수집	7
범위관리		범위정의 WBS작성 활동정의		범위통제		4
일정관리		활동순서배열 활동기간산정 일정개발		일정통제		4
원가관리		원가산정 예산편성		원가통제		3
품질관리		품질관리계획	품질보증수행	품질통제		3
자원관리	프로젝트팀편성	자원선정 프로젝트조직 정의	프로젝트팀개발	자원통제 프로젝트팀관리		6
의사소통관리		의사소통관리 계획	정보배포	의사소통관리		3
위험관리		위험식별 위험평가	위험대처	위험통제		4
조달관리		조달관리계획	공급자선정	조달관리		3
이해관계자 관리	이해관계자식별		이해관계자관리			2
프로세스 수	3	16	7	11	2	39

PRINCE2

- ✓ PRINCE : PRojects IN Controlled Enviroments(통제된 환경에서의 프로젝트)의 약자
- ✓ 1989년 영국의 OGC(Office of Government Commerce)에서 개발되어 1996년 PRINCE2로 개정
- ✓ 원래는 IT 프로젝트 관리를 위한 영국 정부의 표준으로 개발되었으나 IT 이외의 프로젝트에도 확대 적용
- ✓ 프로세스 기반 프로젝트 관리 방법으로 8개의 프로세스 45개의 활동으로 구성

프로세스	관리 활동	활동의 수
프로젝트 준비 (Starting up a Project: SU)	- 프로젝트 위원회 권역과 프로젝트관리자 임명(SU1) - 프로젝트관리팀 설계(SU2) - 프로젝트관리팀 임명(SU3) - 프로젝트 보고 준비(SU4) - 프로젝트 접근방안 정의(SU5) - 착수 단계 계획(SU6)	6
프로젝트 지휘 (Directing a Project: DP)	- 착수 승인(DP1) - 프로젝트 승인(DP2) - 단계 또는 예외 계획 승인(DP3) - 애드혹 지휘(DP4) - 프로젝트 종료 확인(DP5)	5
프로젝트 착수 (Initiating a Project: IP)	- 품질계획(IP1) - 프로젝트계획(IP2) - 비즈니스케이스와 리스크 정의(IP3) - 프로젝트 통제 준비(IP4) - 프로젝트 파일 준비(IP5) - PID 취합(IP6)	6
기획 (Planning: PL)	- 계획 설계(PL1) - 제품 정의 및 분석(PL2) - 활동과 의존관계 식별(PL3) - 추정(PL4) - 일정계획(PL5) - 리스크 분석(PL6) - 계획 완료(PL7)	7
단계 통제 (Controlling a Stage: CS)	- 워크패키지(Work Package) 승인(CS1) - 진척도 평가(CS2) - 프로젝트 이슈 취합(CS3) - 프로젝트 이슈 검토(CS4) - 단계 상태 검토(CS5) - 주요사항 보고(CS6) - 시정조치(CS7) - 프로젝트 이슈 해소(CS8) - 완성된 워크패키지 인수(CS9)	9
산출물 인도관리 (Managing Product Delivery: MP)	- 워크패키지 승인(MP1) - 워크패키지 실행(MP2) - 워크패키지 인도(MP3)	3
단계 경계관리 (Managing Stage Boundaries: SB)	- 단계 계획(SB1) - 프로젝트계획 수정(SB2) - 프로젝트 비즈니스케이스 수정(SB3) - 리스크 로그 수정(SB4) - 단계 종료 보고(SB5) - 예외 계획 생성(SB6)	6
프로젝트 종료 (Closing a Project: CP)	- 프로젝트 해산(CP1) - 후속조치 식별(CP2) - 프로젝트 평가(CP3)	3
전체 활동의 수		45

2. 적용 분야에 대한 지식

- ✓ 소프트웨어 개발, 건설 엔지니어링과 같이 프로젝트와 관련된 기술적 구성요소 (technical element)
- ✓ 정부 계약, 커뮤니티 개발 또는 새로운 제품 개발과 같은 관리 기법 (management specialization)
- ✓ 각 응용 분야별 표준, best practices, 규정 등의 지식
- ✓ 정부가 강제하는 법규 요건

3. 프로젝트 환경의 이해

- ✓ 프로젝트에 영향을 미치는 조직 문화적, 사회적 환경
- ✓ 국제적, 정치적 환경
- ✓ 프로젝트가 영향 받는, 또는 프로젝트 의해 영향 미치는 물리적 환경의 이해

4. 일반적인 기업경영 지식


- ✓ 재무 및 회계, 구매 및 조달, 계약 및 상법, 제조 및 유통전략 기획과 운영 기획, 조직구조 / 조직 행위 / 직원관리 / 보상 / 복지, 건강 및 안전 실무, 정보 기술

5. 대인관계 기술

- ✓ 효과적인 의사소통 (정보 교류)
- ✓ 조직에의 영향 (일이 되게 하는 능력)
- ✓ 리더십과 동기부여 (비전, 전략 개발과 이의 달성을 위한 동기부여)
- ✓ 협상과 갈등관리 (합의를 이끌어내기 위한 협의)
- ✓ 문제 해결 (문제 정의 / 대안 식별과 분석 / 의사결정의 조합)

프로그램(Program) 관리란?


✓ 프로그램(program)은 **상호 관련된 프로젝트들의 집합**으로, 각 프로젝트를 개별적으로 관리해서는 얻을 수 없는 편익과 통제를 통합적 관리를 통해 얻을 수 있음

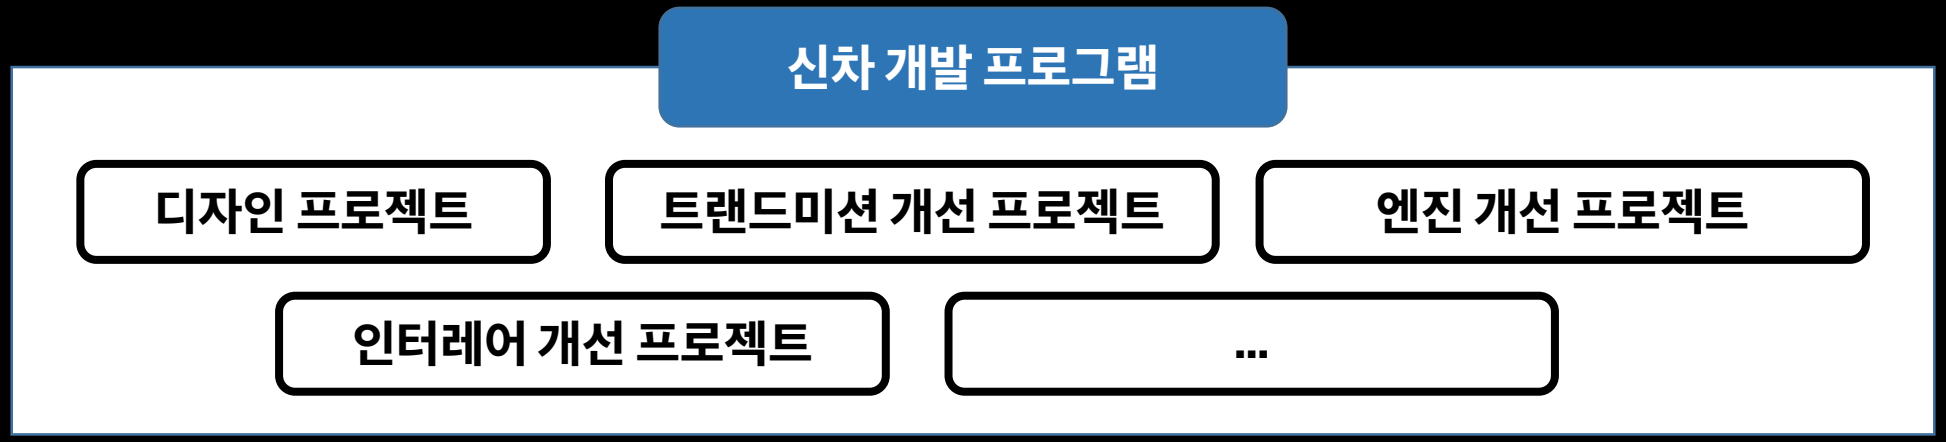

포트폴리오(Portfolio) 관리란?

- ✓ 포트폴리오는 효율적 관리를 목적으로 기업의 **전략적 목표를 달성하는데 필요한 프로젝트나 프로그램들을 모아 놓은 집합체**
- ✓ 프로그램과 달리, 포트폴리오에 포함된 프로젝트나 프로그램들은 반드시 서로 관련되어 있을 필요는 없음
- ✓ 포트폴리오 관리의 목적은 기업의 전략적 목표 달성을 위해 제안된 프로젝트나 프로그램의 최적 조합과 순서를 결정하고 자원을 할당하고 성과를 평가하는 것

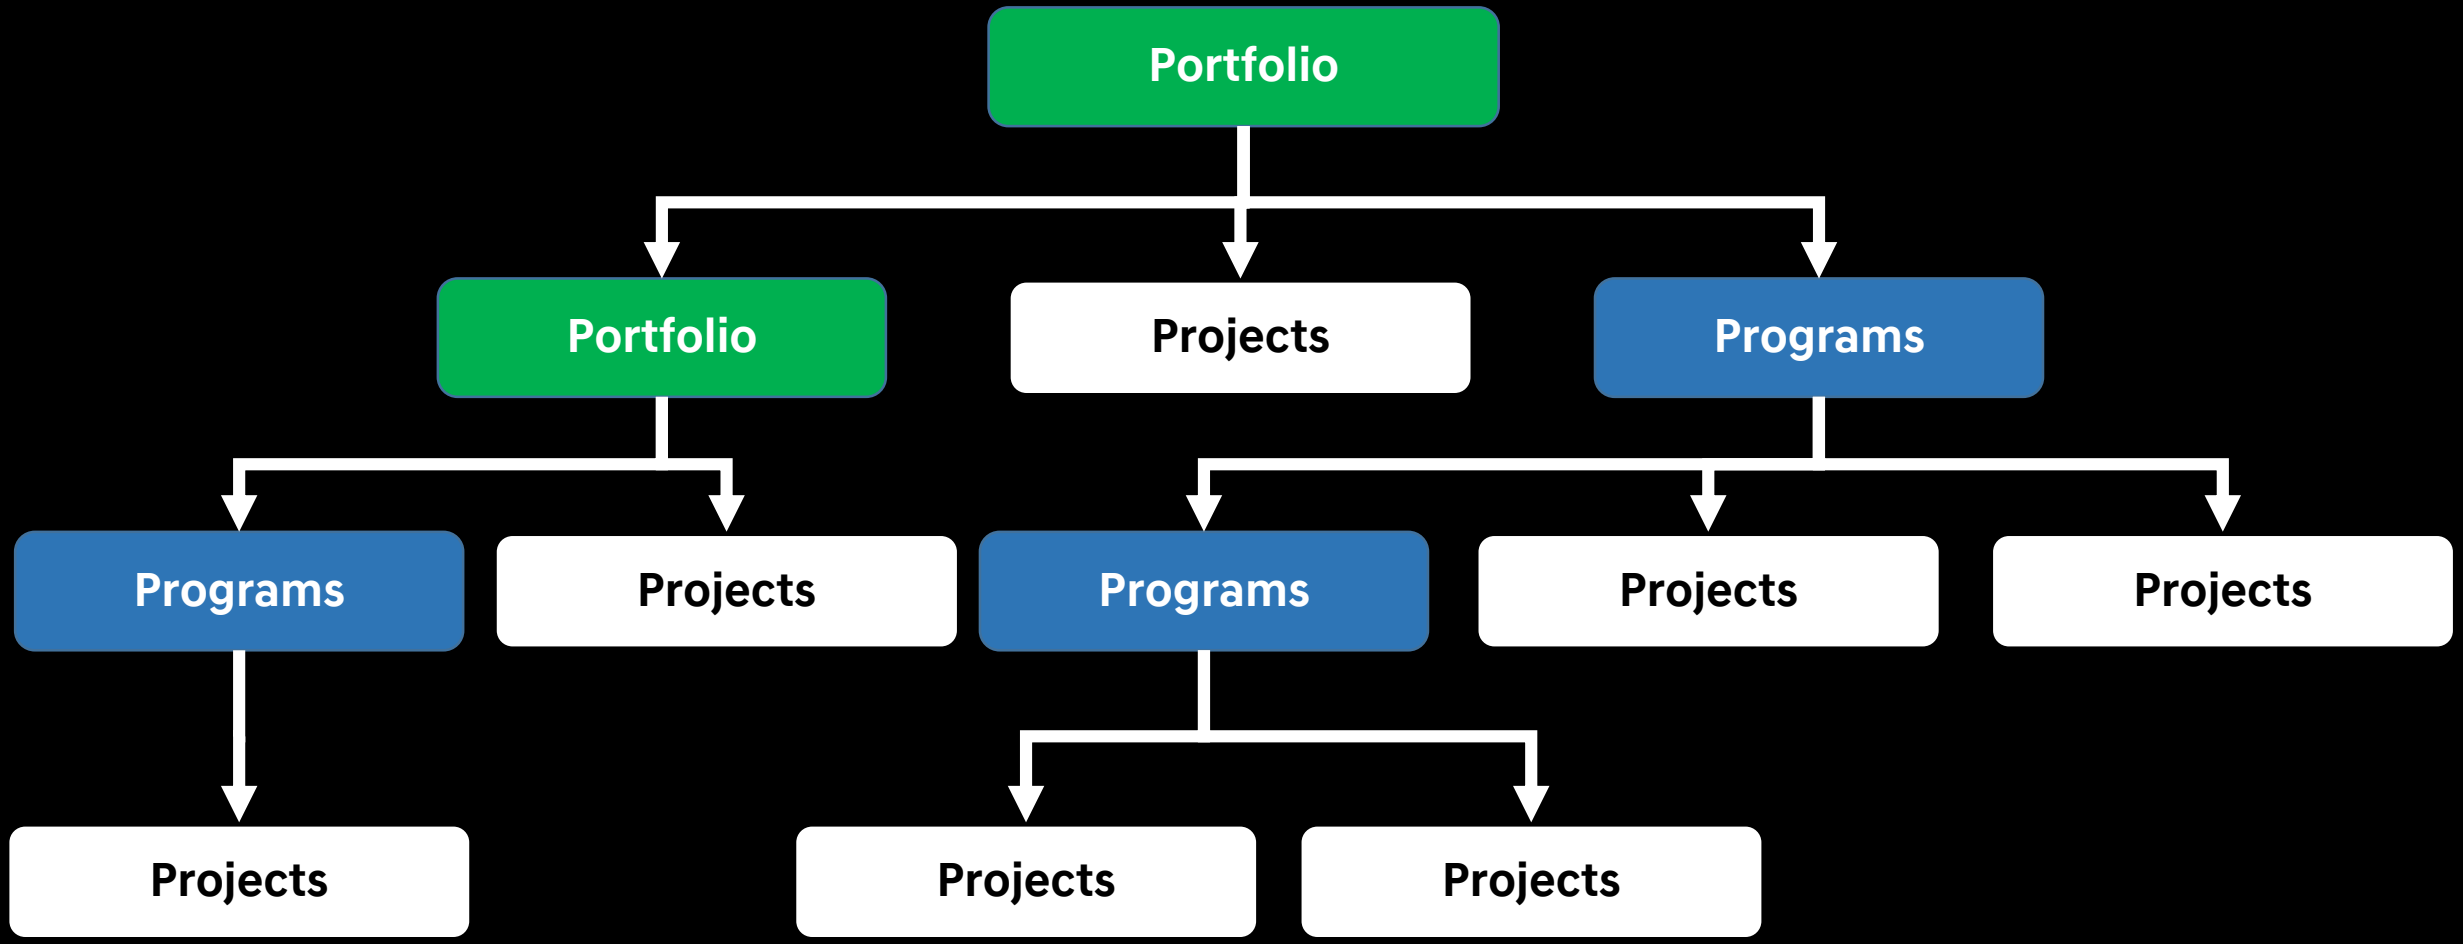



Portfolio
Portfolio
Projects
Programs
Programs
Projects
Programs
Projects
Projects
Projects
Projects
Projects


프로젝트 관리 오피스 (PMO)

- ✓ PMO는 같은 영역 하에 있는 프로젝트들의 관리를 조정(Coordinate)하고 집중화 (Centralize)하기 위한 조직 단위
- ✓ PMO는 프로젝트들의 조정, 기획, 우선 순위화, 실행에 초점을 두며, 그것을 상위 조직 또는 고객의 사업 목표에 일치시키는 역할
- ✓ 일부 PMO는 각 프로젝트 착수 동안, 권한을 위임 받으며, 지속적인 사업 목표를 유지하기 위해 프로젝트를 중단할 수 있는 권한 보유


프로젝트 관리의 장점




업무와 목표를 한
곳에서 관리합니다



팀 효율성을 개선합니다



혼란을 줄이고 효율성을
높입니다



커뮤니케이션을 조율합니다

프로젝트 실패와 교훈

Project Management Institute Studies and Standish Reports

2015에 따르면 **평균 성공률은 30%**인 반면

실패율은 70%임

TRADITIONAL RESOLUTION FOR ALL PROJECTS

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	39%	37%	41%	36%	36%
CHALLENGED	39%	46%	40%	47%	45%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

The Traditional resolution of all software projects from FY2011–2015 within the new CHAOS database.

크리스탈 팹시

사람들이 문제를 제기할 때 그들이 옳을 수도 있다는 것을 인식해야 한다



Crystal Pepsi는 처음에 인기를 끌었고 사람들은 열광했습니다. 그러나 사람들은 곧 흥미를 잃었고 참신함은 사라졌고 Crystal Pepsi는 강력한 시장 점유율을 확보할 수 없었습니다.

David Novak은 프로젝트 기간 동안 PepsiCo의 COO였으며 보틀러가 Crystal Pepsi 맛이 옳지 않다고 말했을 때 듣지 않았습니다.

다이슨 전기차

환경 분석을 통한 설계 진행이 프로젝트의 성공을 가져온다.



가전제품으로 유명한 다이슨(Dyson) 이 전기차를 만들겠다며, 2016년도부터 25억 파운드. 한화로 약 3조 8천억원을 투자했었지만, 3년만인 2019년에 돌연 전기자동차 프로젝트를 포기하겠다고 밝힌 바 있었다. 당시, 다양한 추측이 있었지만, 제임스 다이슨(James Dyson) 이 영국의 자동차 매체인 오토카(Autocar) 와의 인터뷰를 통해 전기차 프로젝트를 포기한 이유가 '배터리' 때문임을 밝혔다.

맥도날드 Arch Deluxe Burger

사용자의 요구분석이 프로젝트의 성공을 가져온다.



1996년 미국 최대 패스트푸드 회사인 '맥도널드'는 고급 햄버거, '아치 디럭스(Arch Deluxe)' 햄버거를 출시한다. 기성세대를 위한 고급 햄버거 콘셉트로 개발된 이 햄버거는 엄청난 개발비와 더불어 광고비에만 약 1억5000만달러를 쏟아부었다. 하지만 아치 디럭스는 출시 1년 만에 시장에서 완전히 철수했다. 맥도널드가 약 2년의 시간 동안 온갖 정성을 들여 개발했음에도 실패로 돌아간 것이다.


Chapter 2

Empasy-Method


Empasy-Method - 개발

Process

컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | 전개 | 유지보수

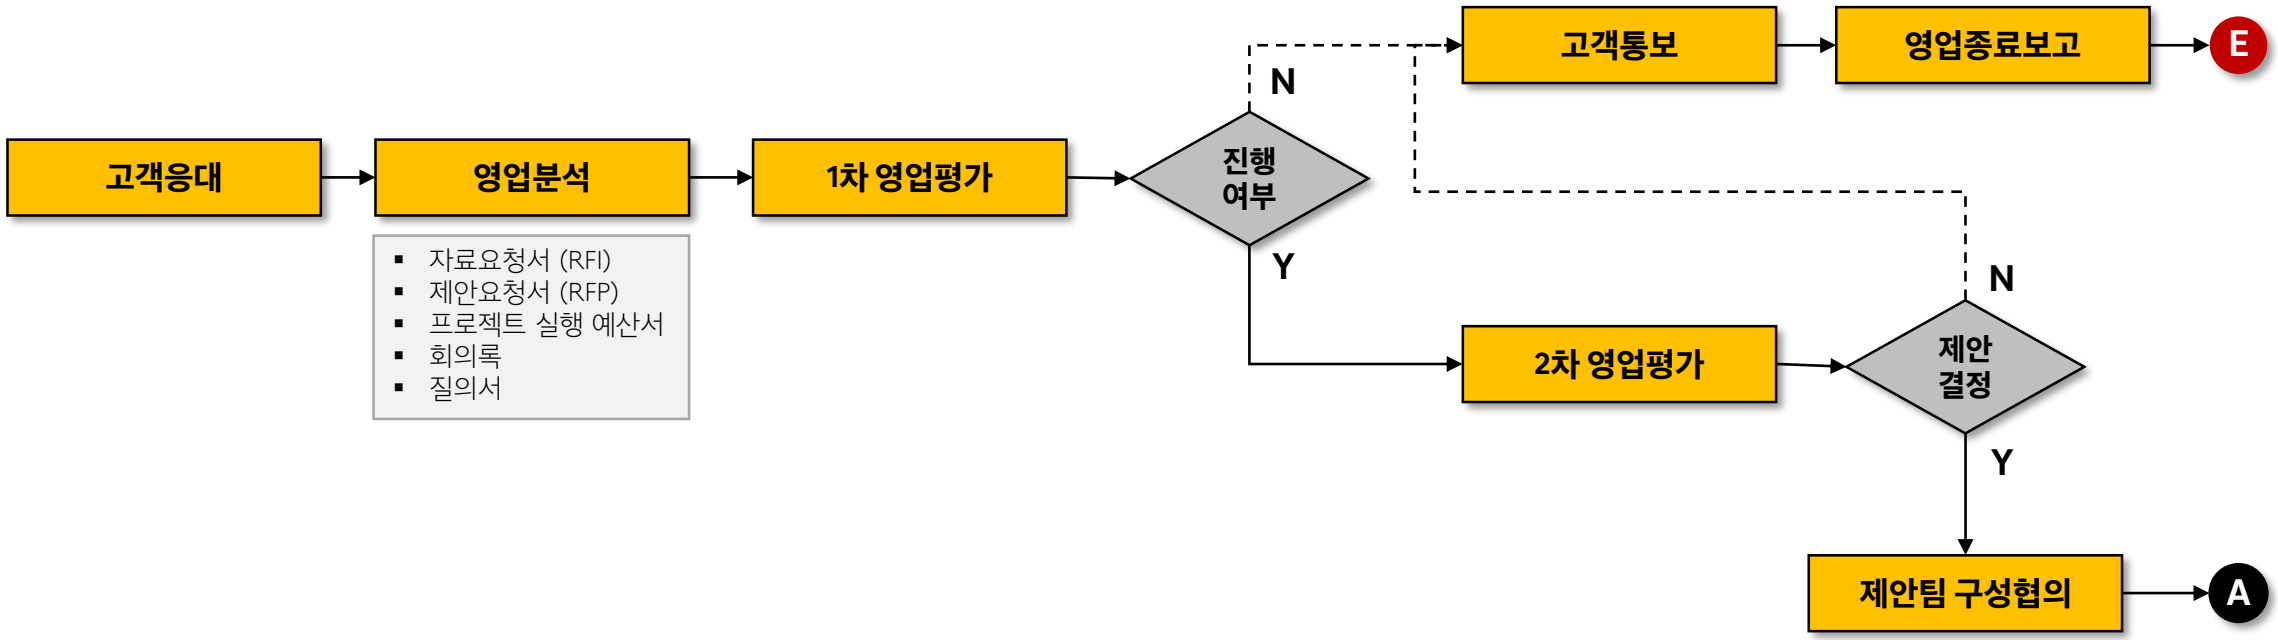


Empasy-Method - 개발

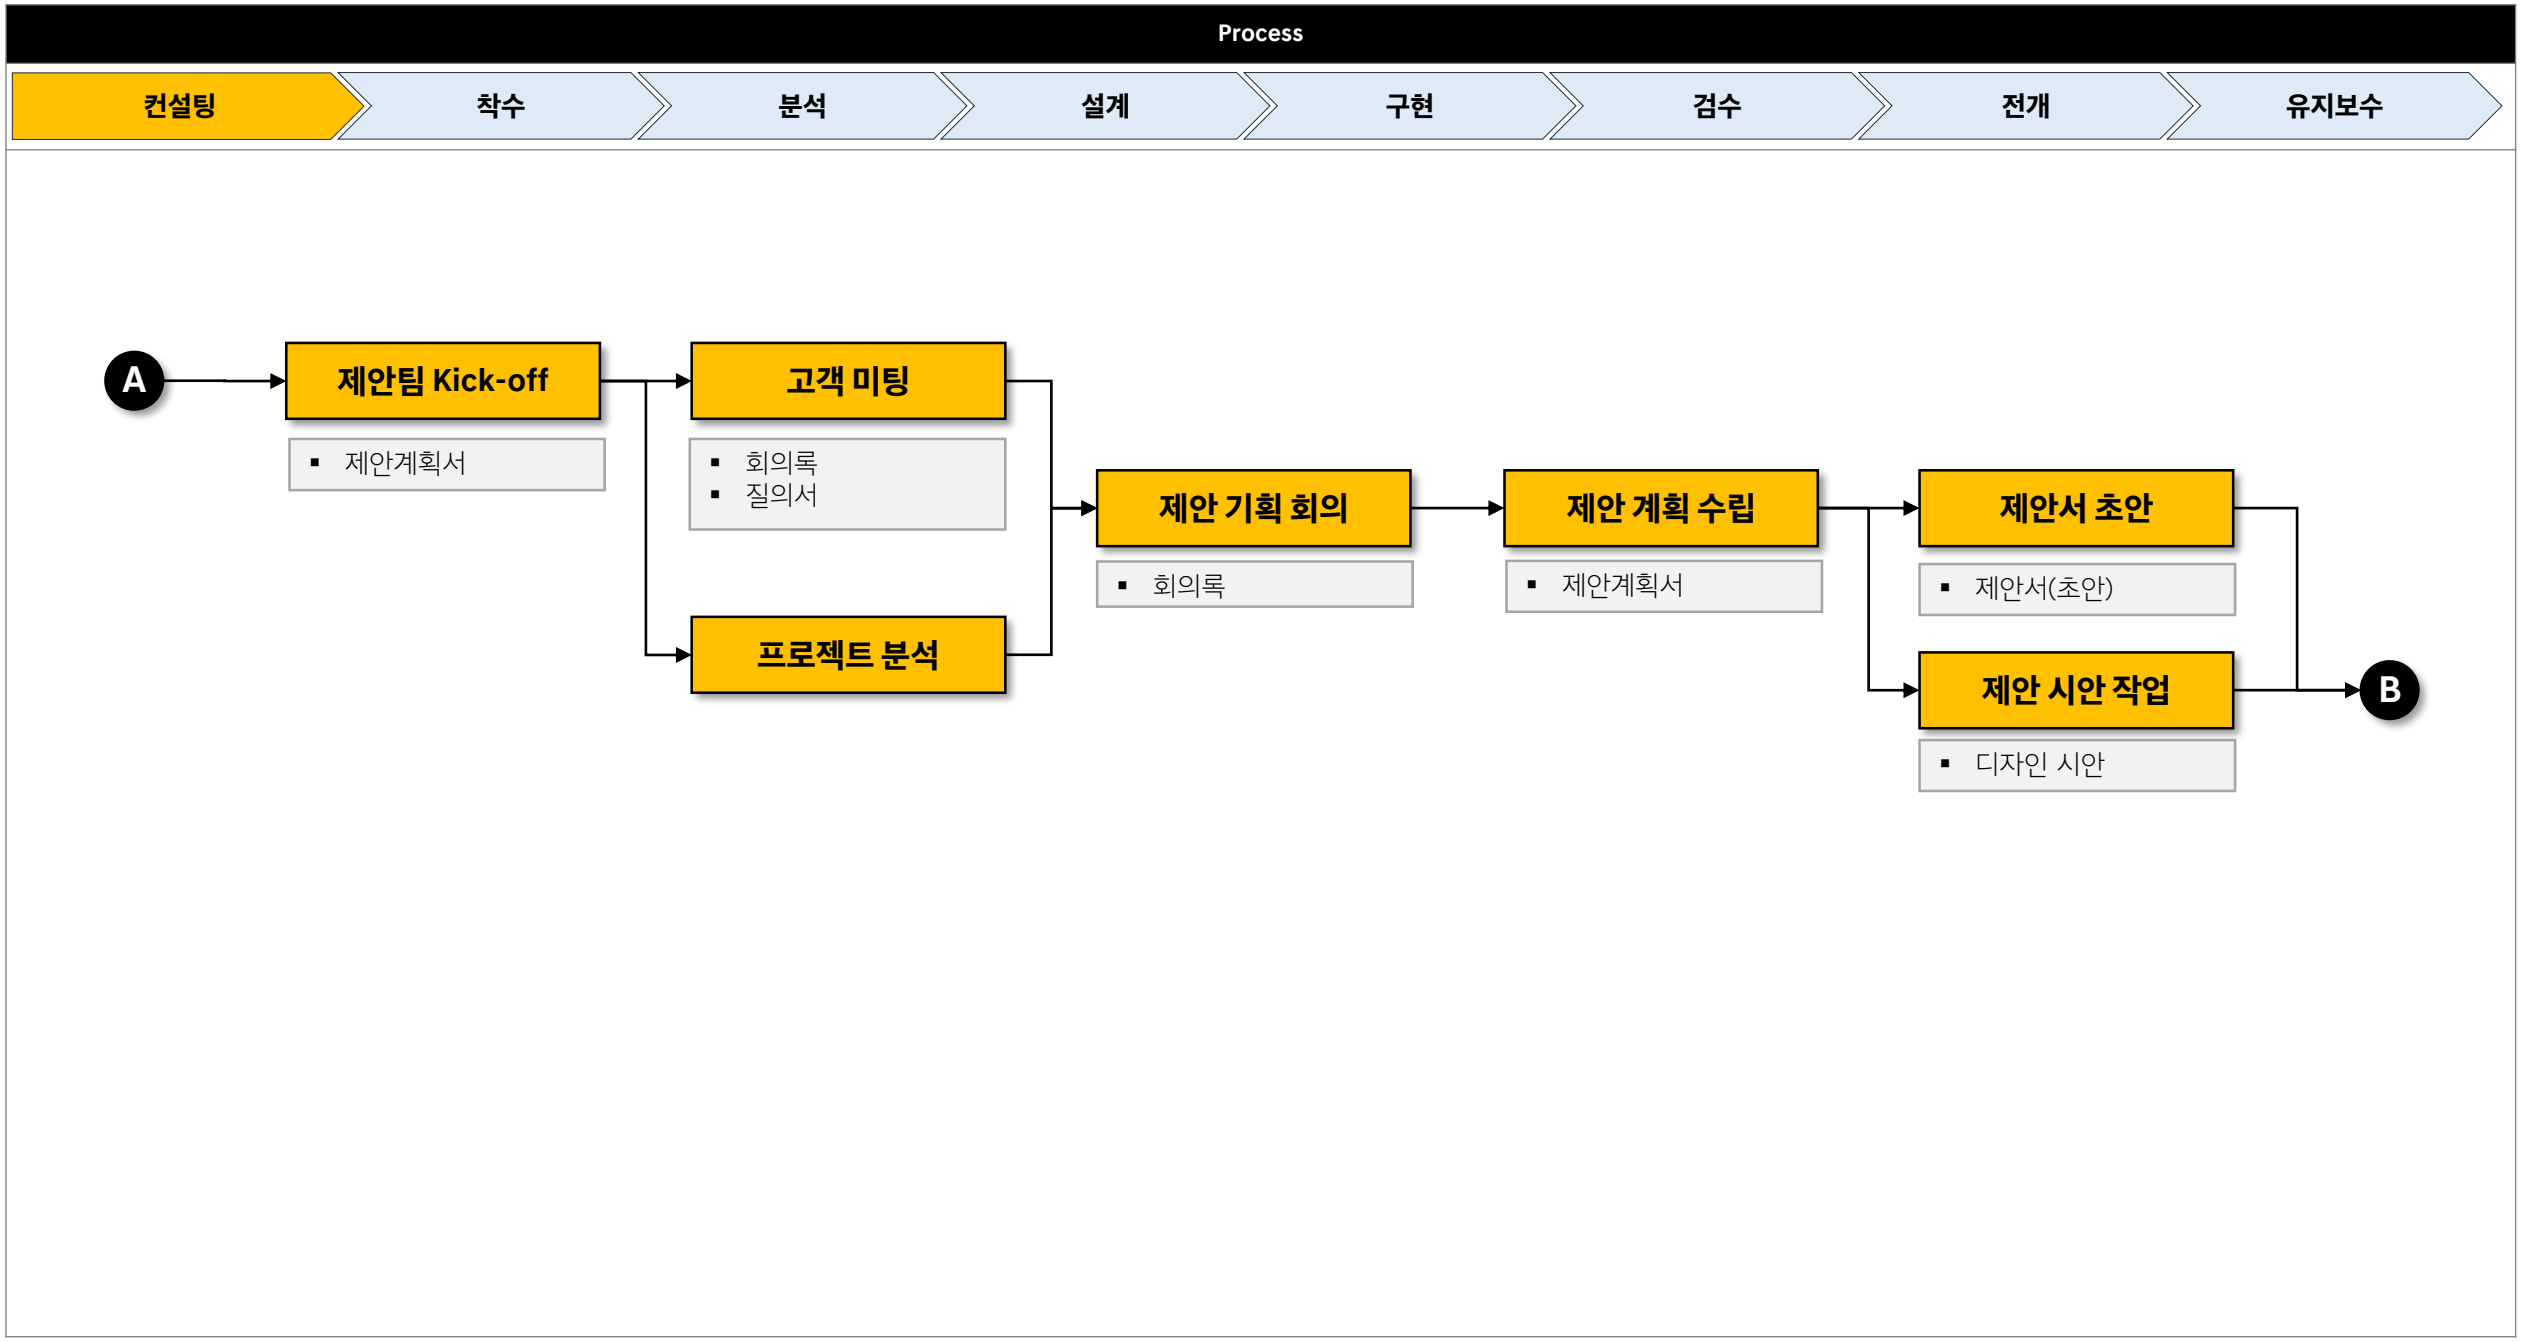


Empasy-Method - 개발

Process

컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | 전개 | 유지보수

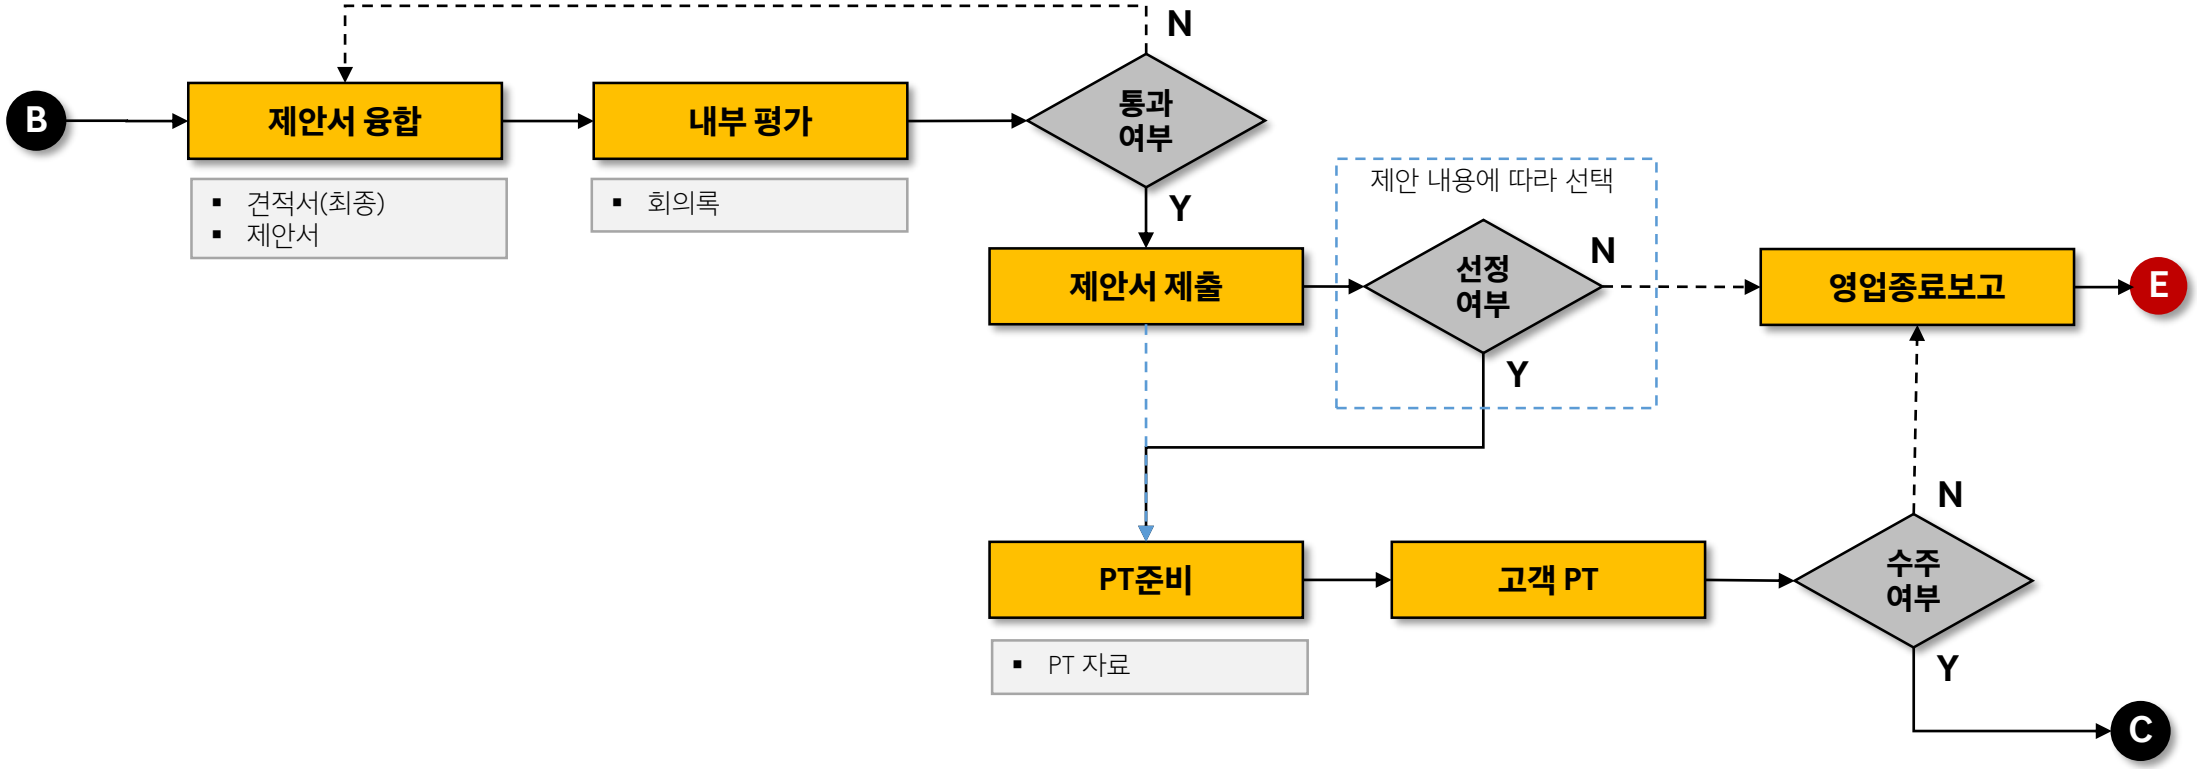


Empasy-Method - 개발

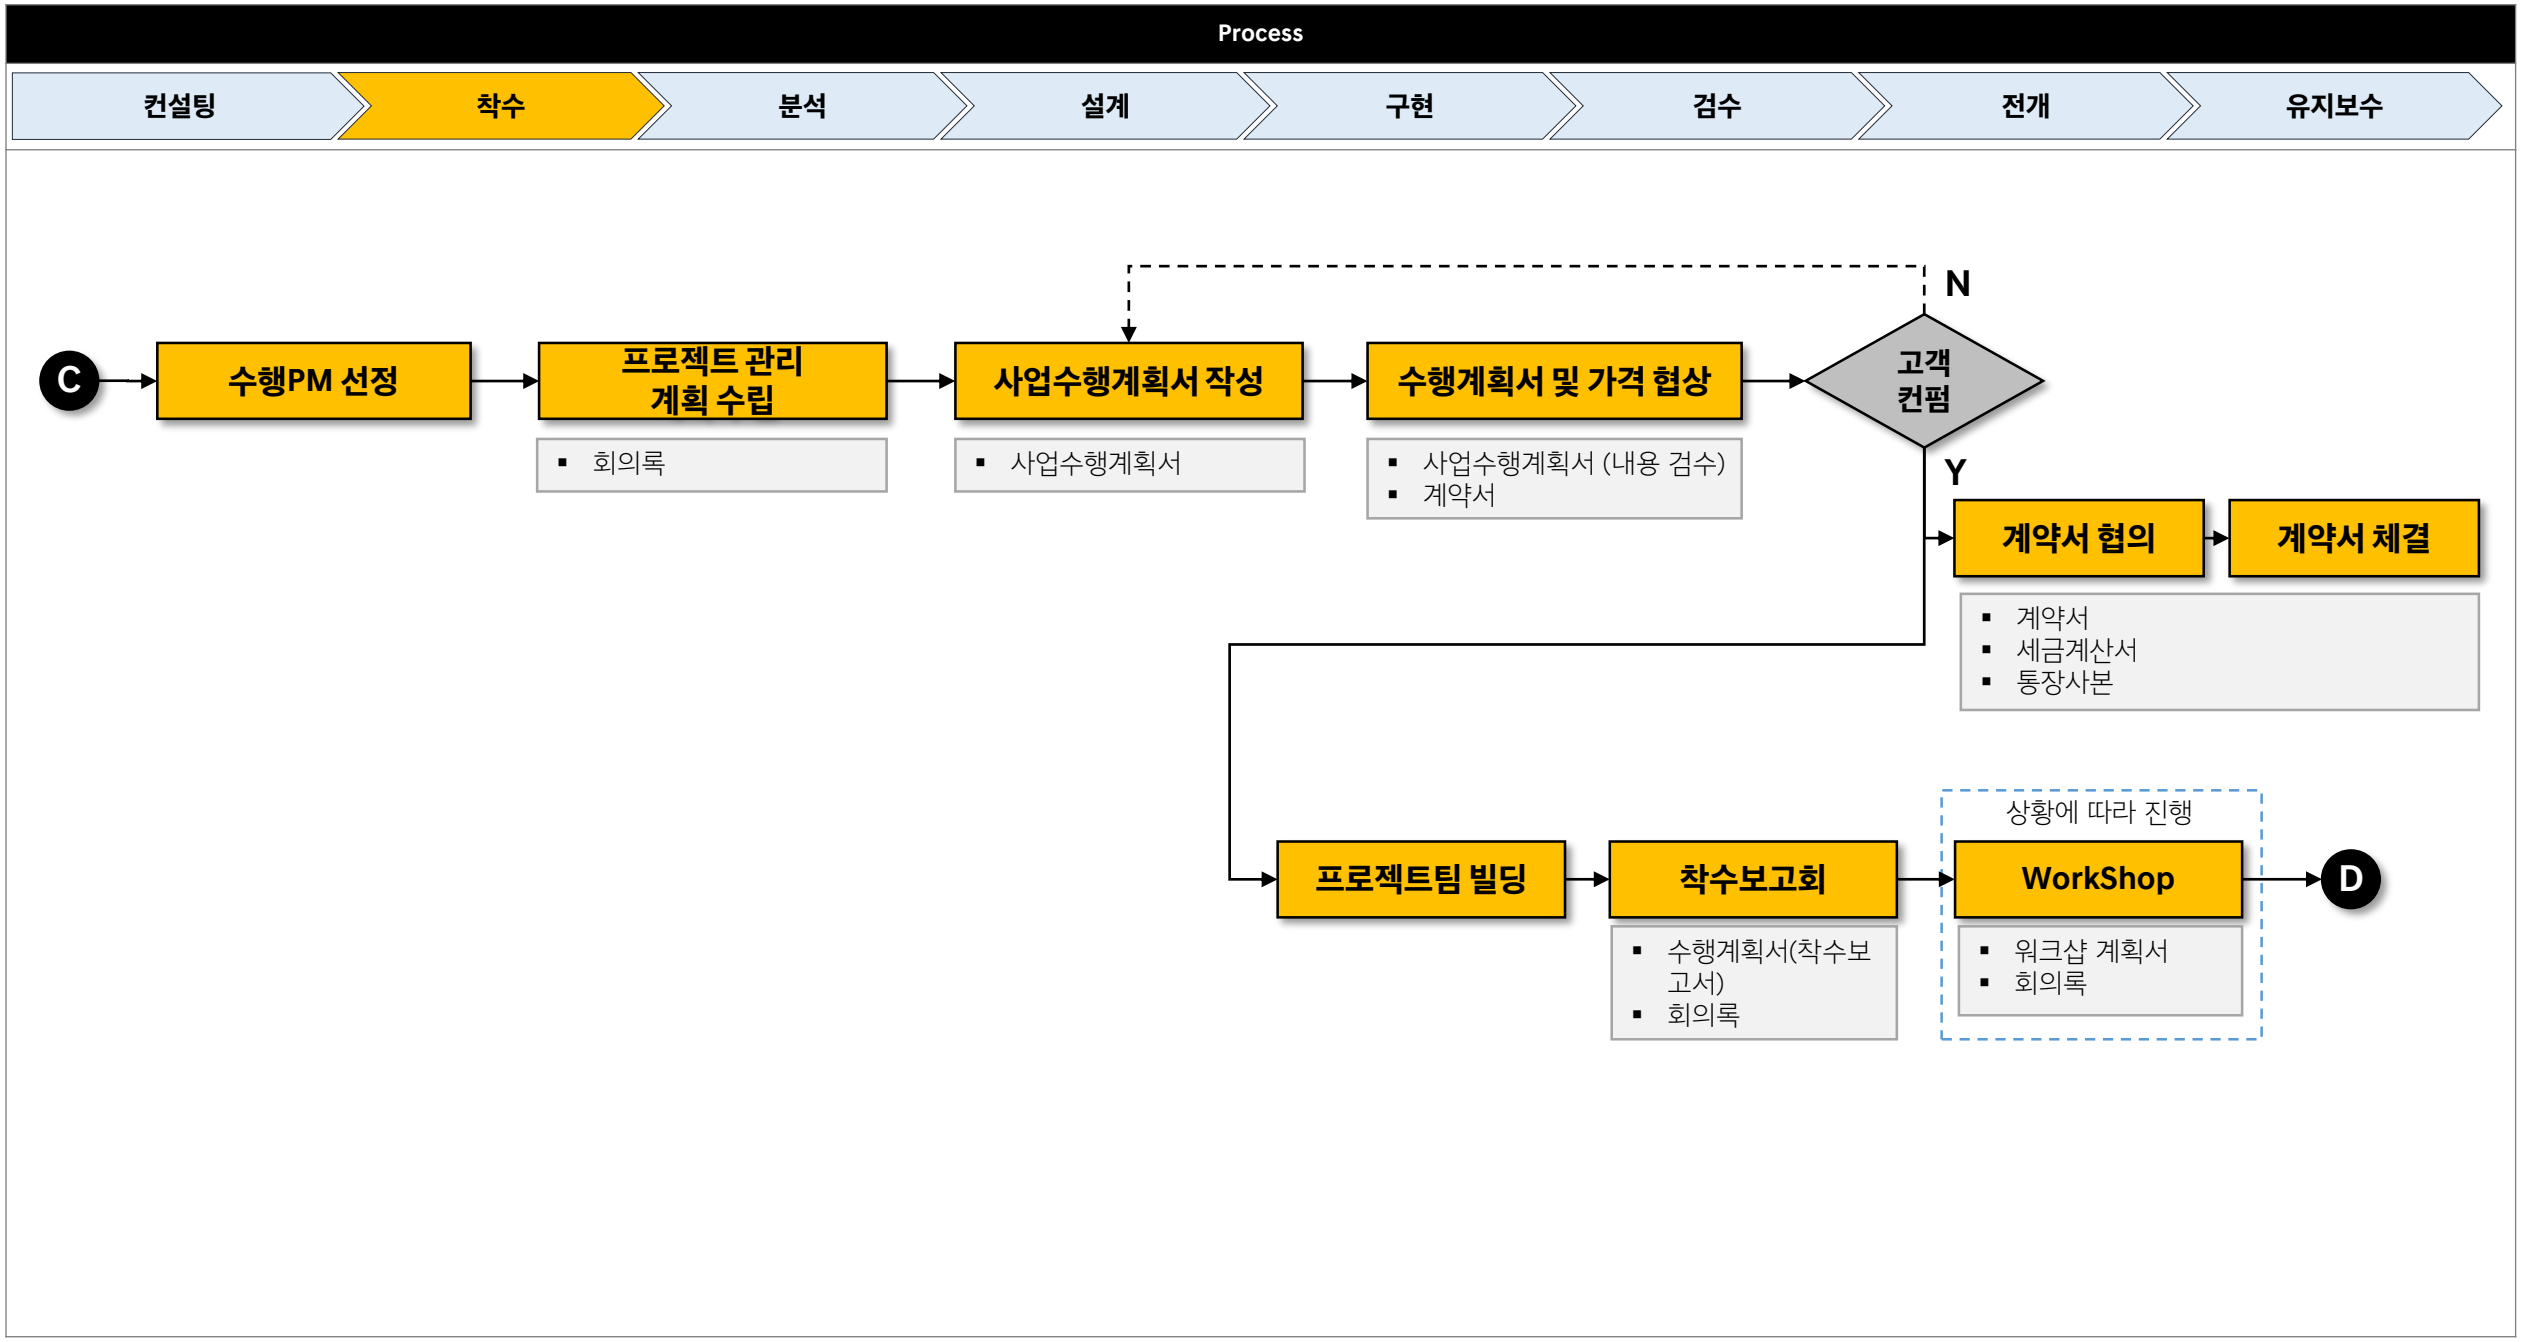


Empasy-Method - 개발

Process


컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | 전개 | 유지보수

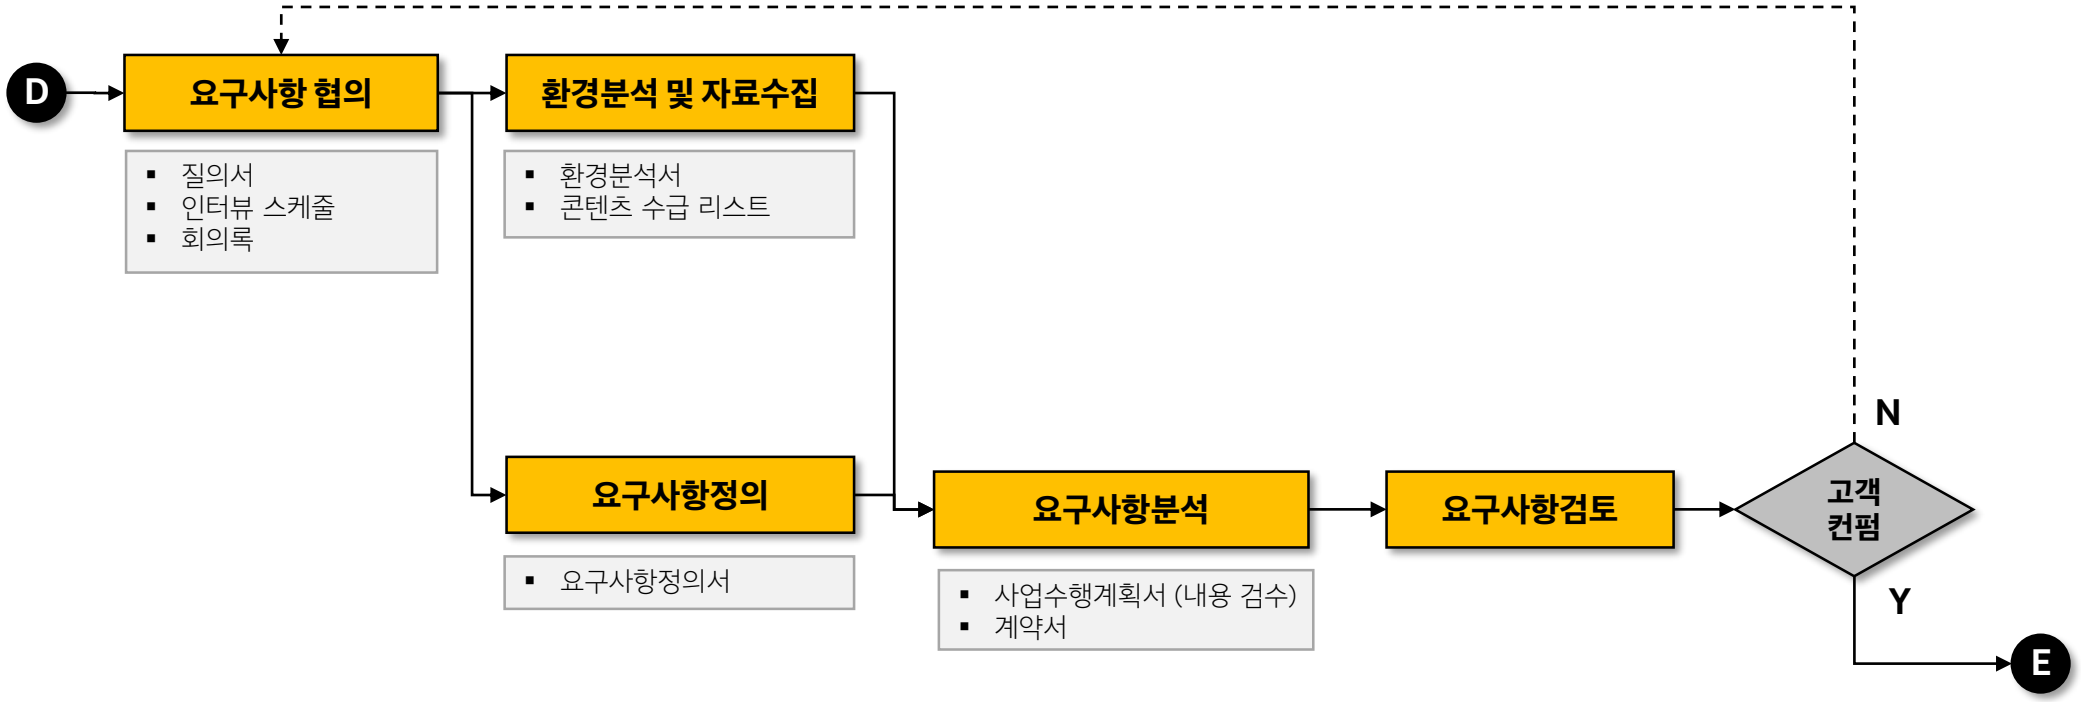

Empasy-Method - 개발

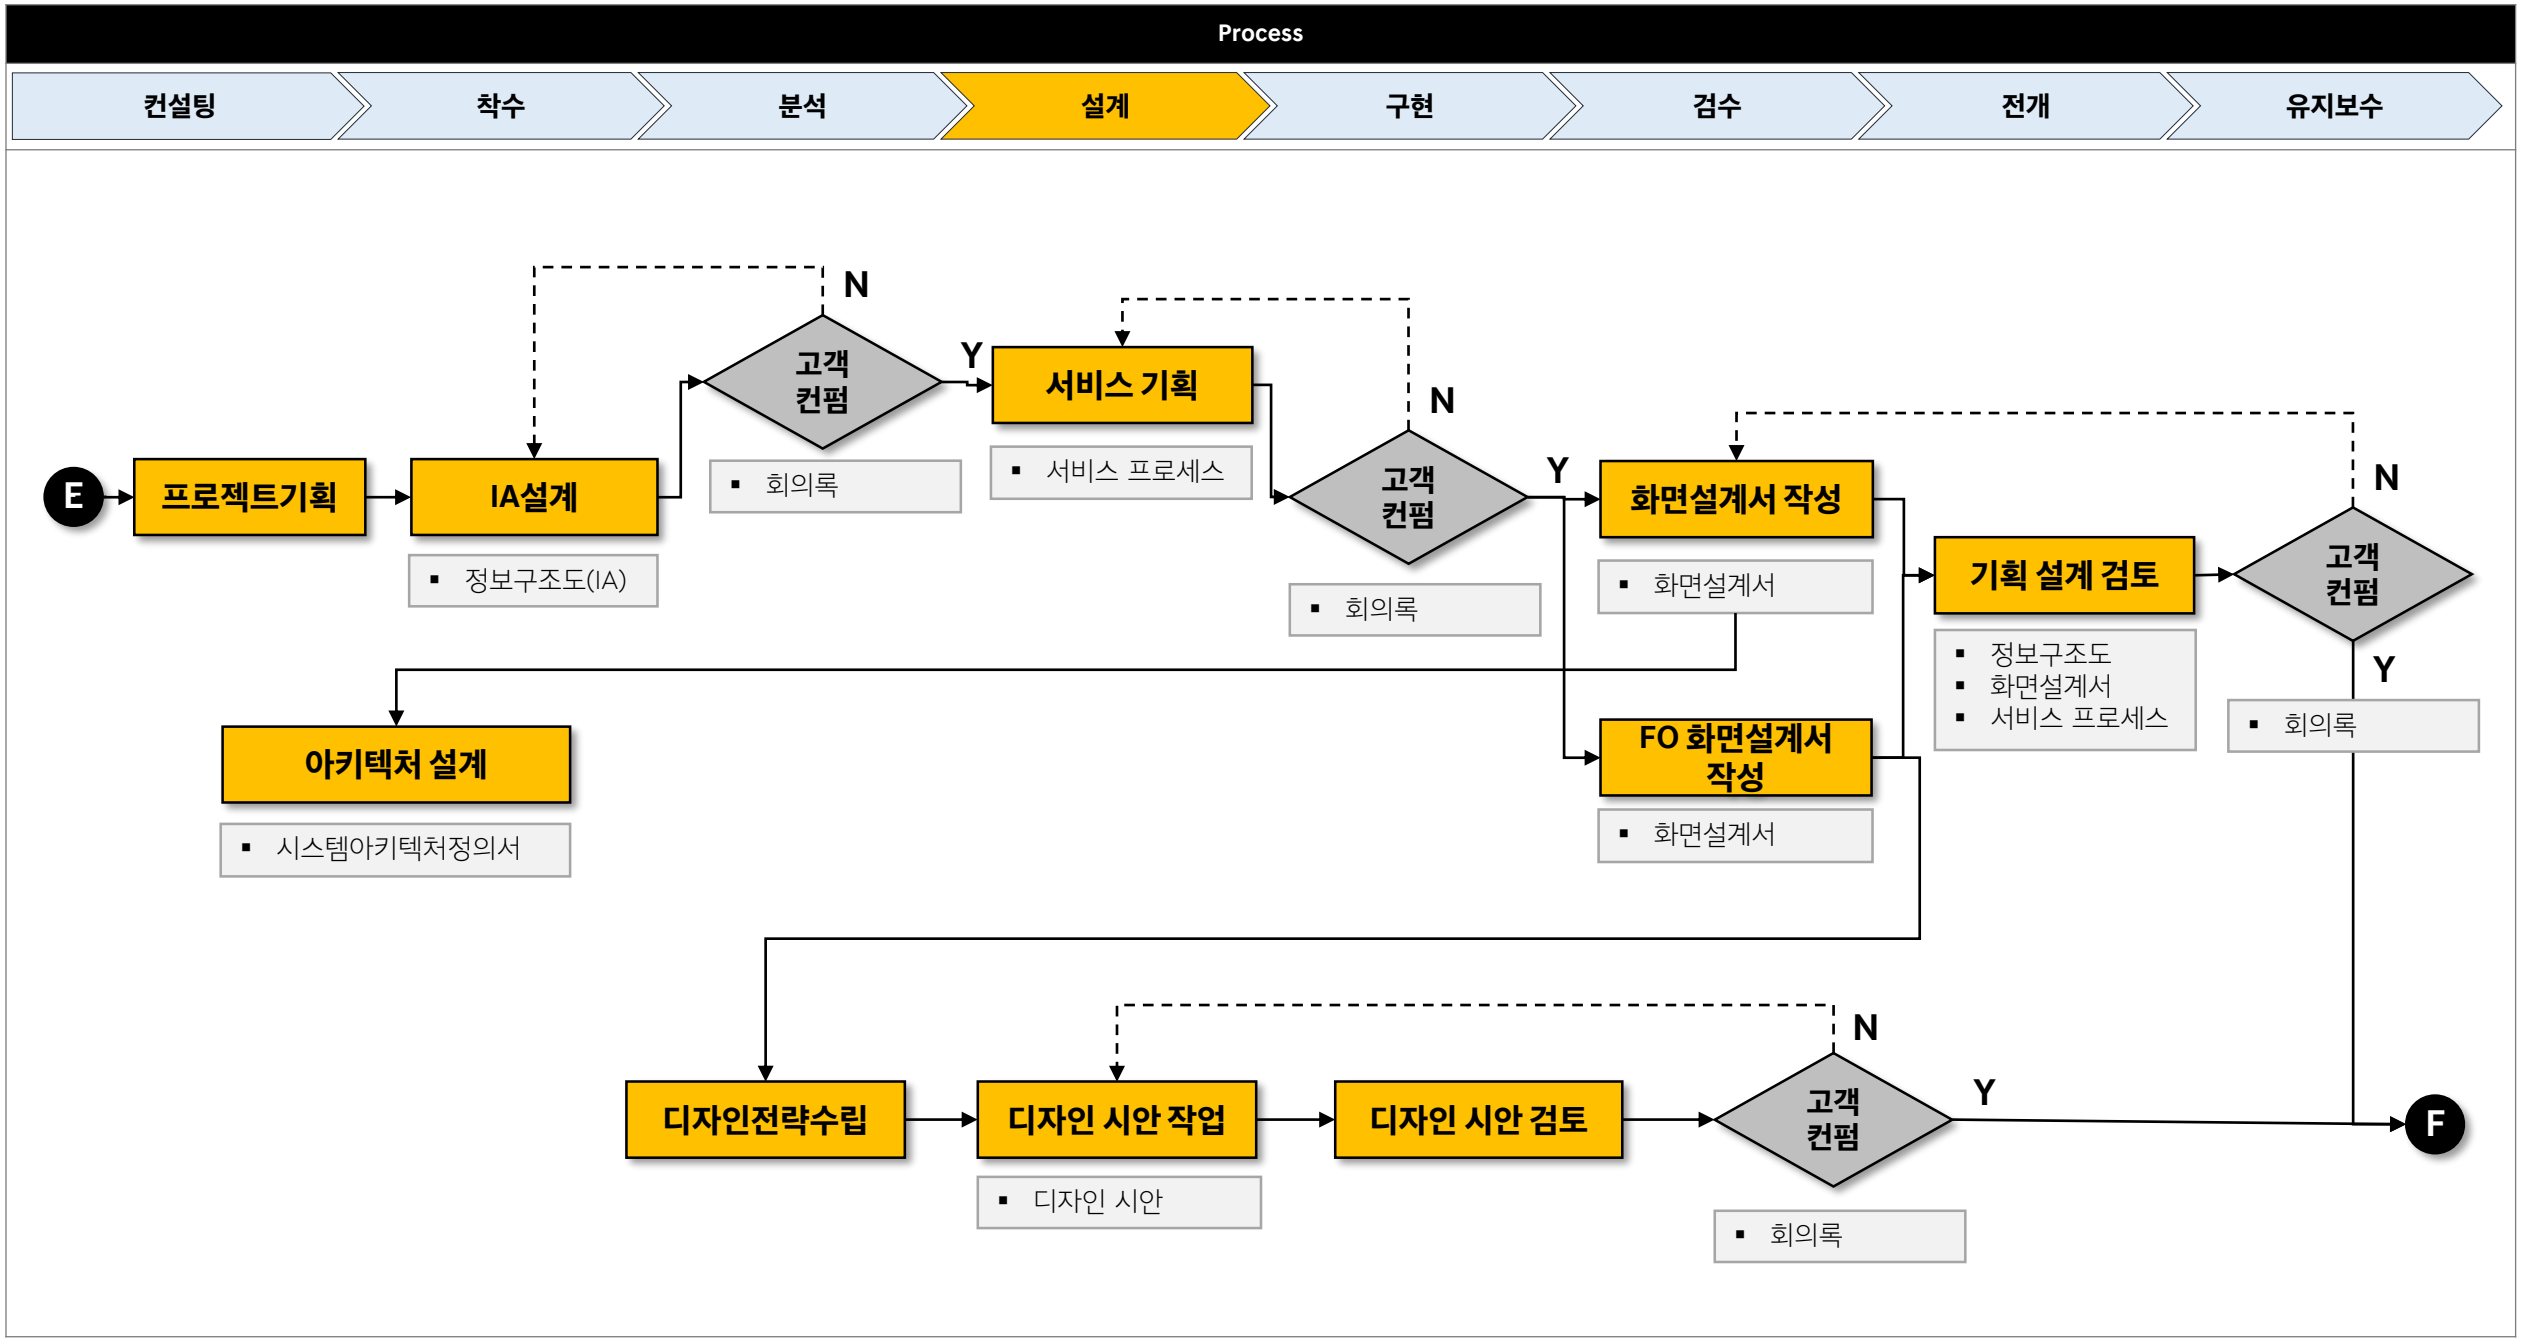


Empasy-Method - 개발

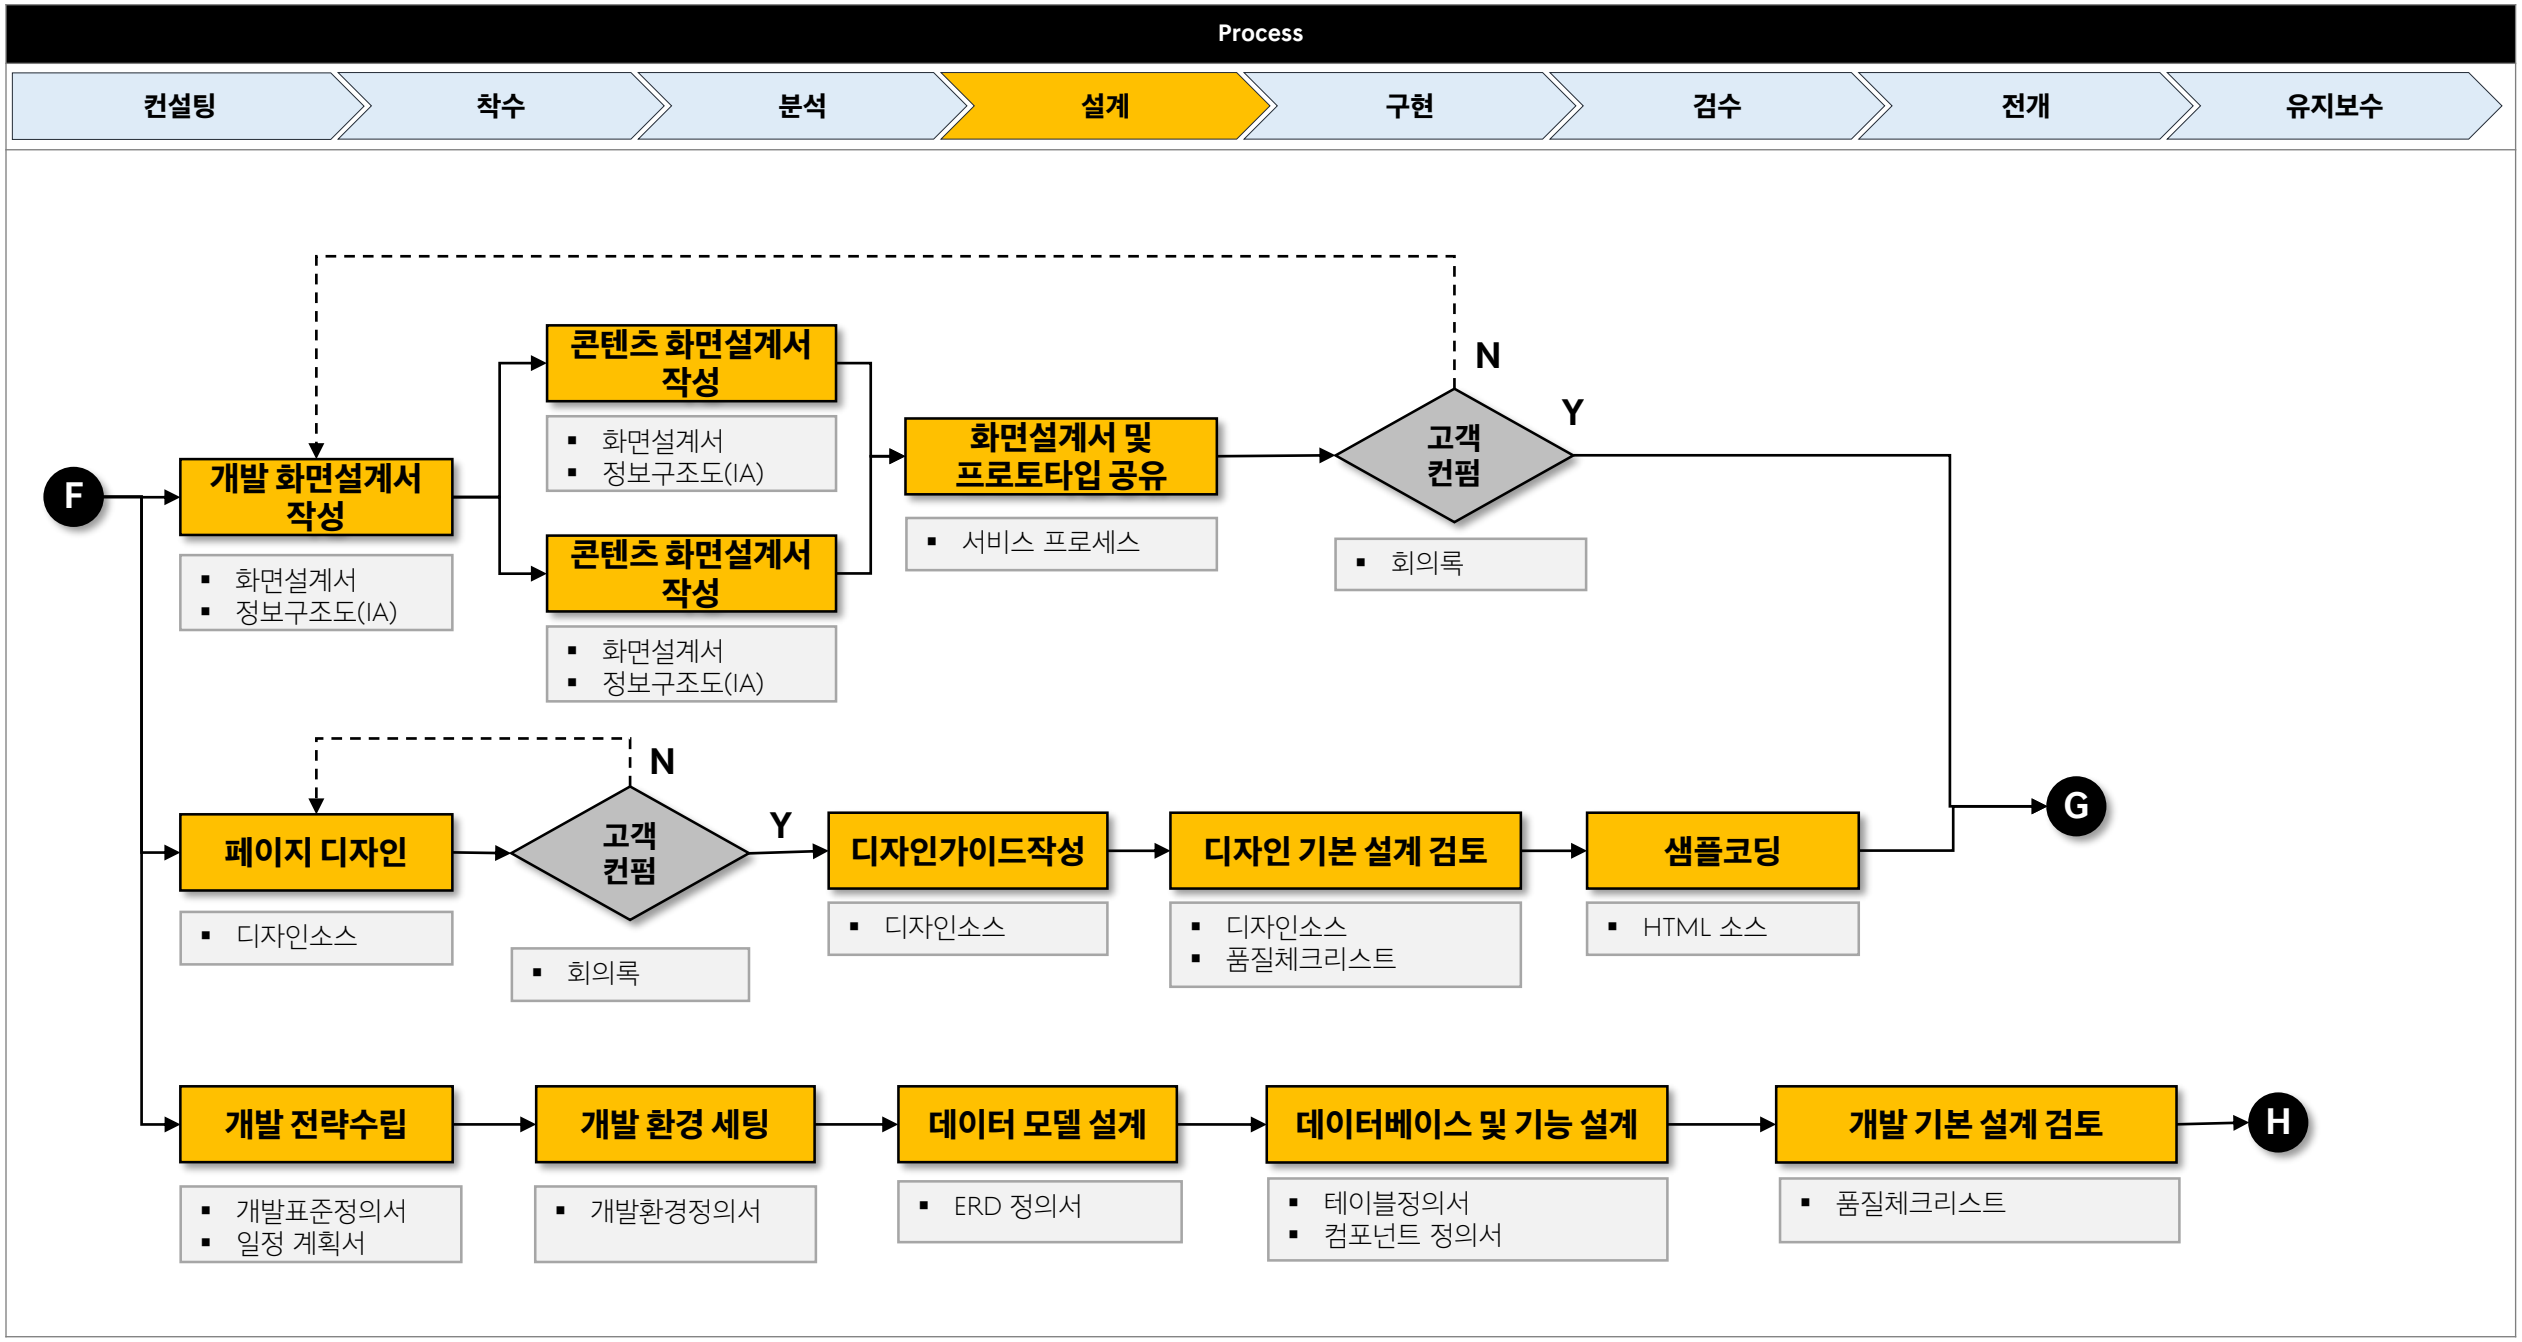


Empasy-Method - 개발

Process

컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | **구현** | 검수 | 전개 | 유지보수

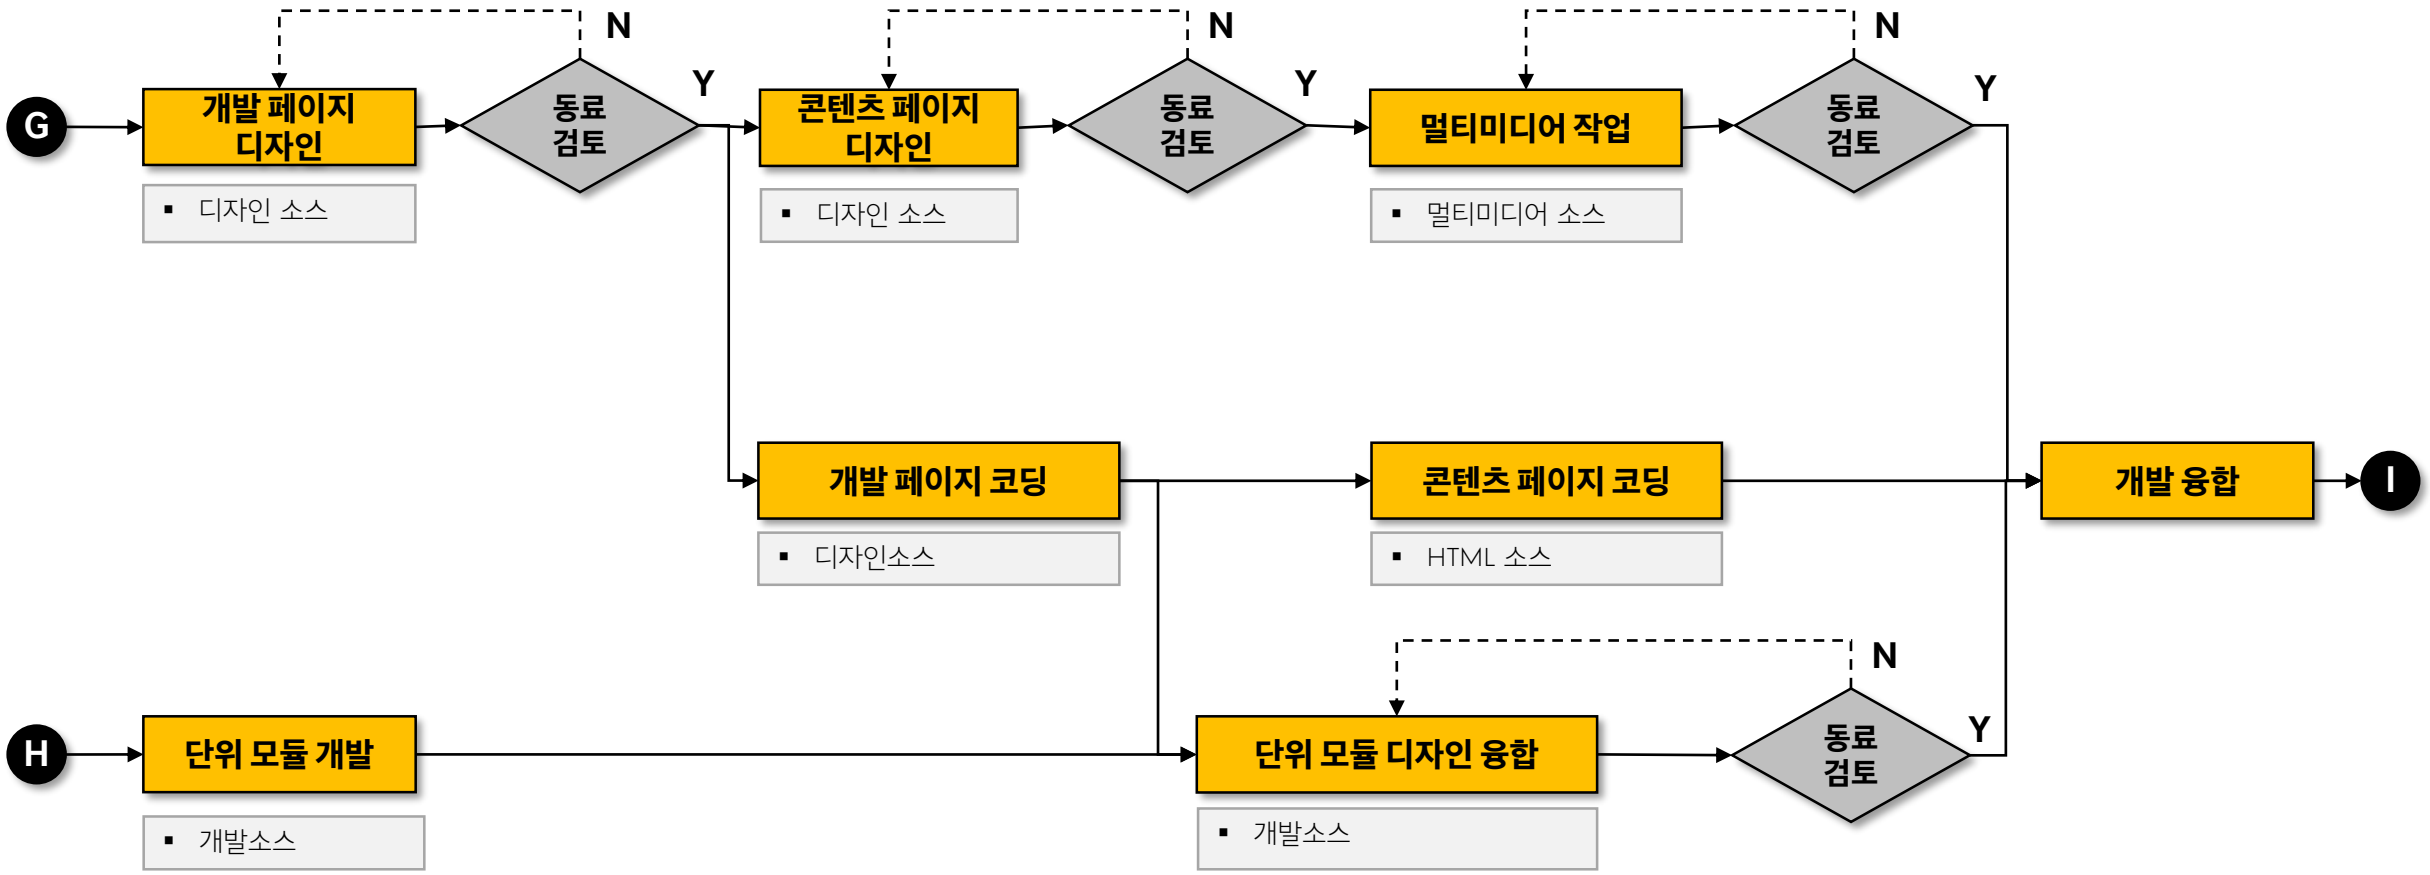


Empasy-Method - 개발

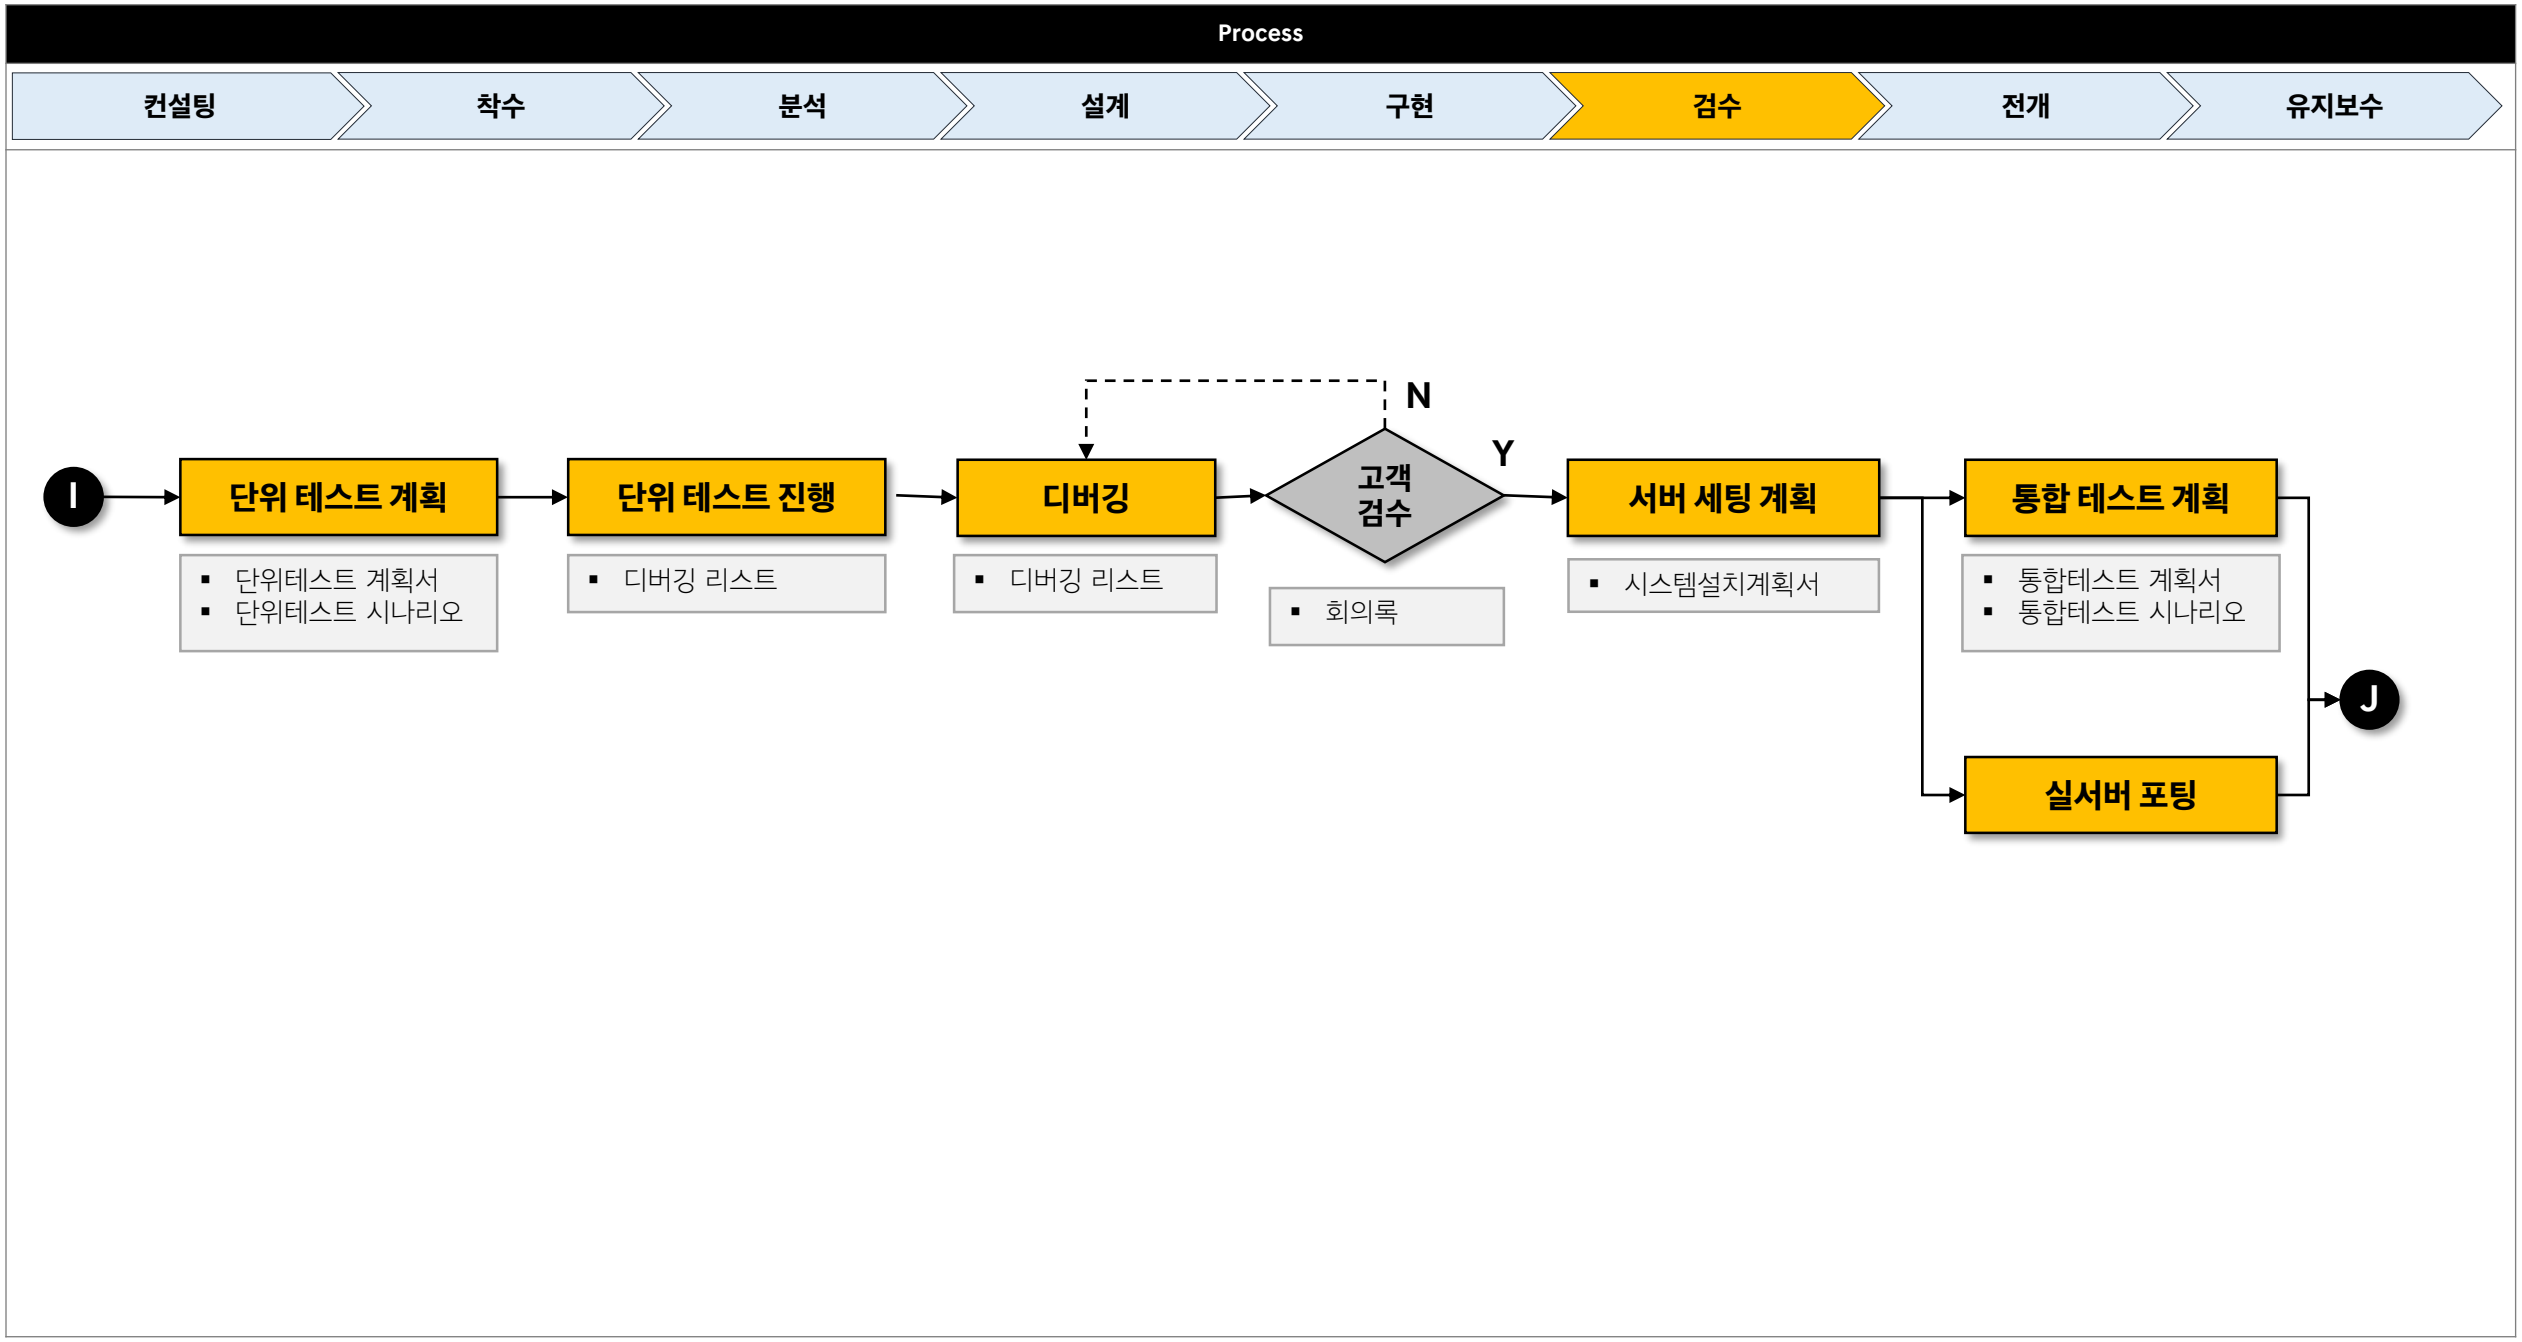

Empasy-Method - 개발

Process


컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | **검수** | 전개 | 유지보수

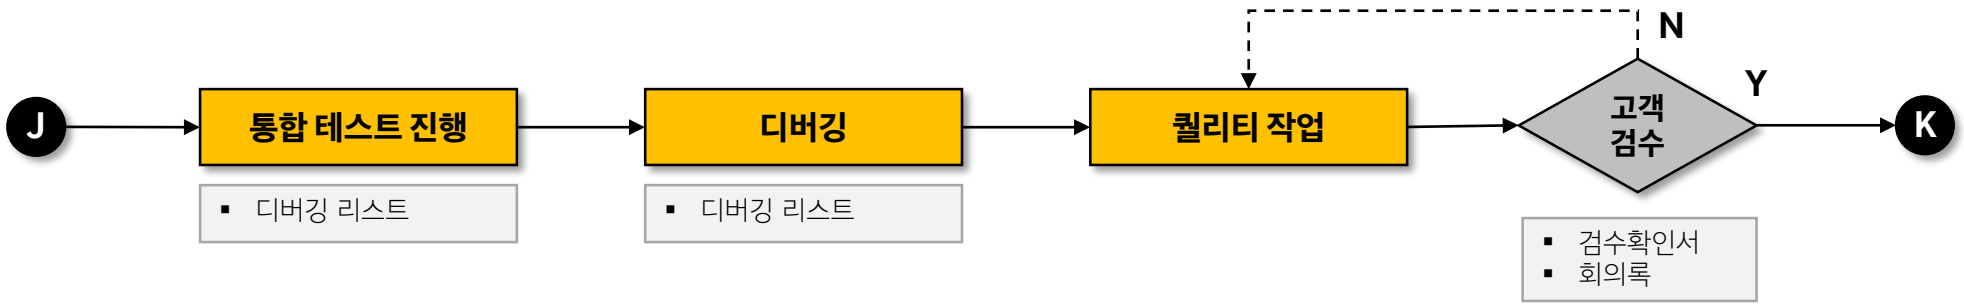

Empasy-Method - 개발

Process


컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | **전개** | 유지보수

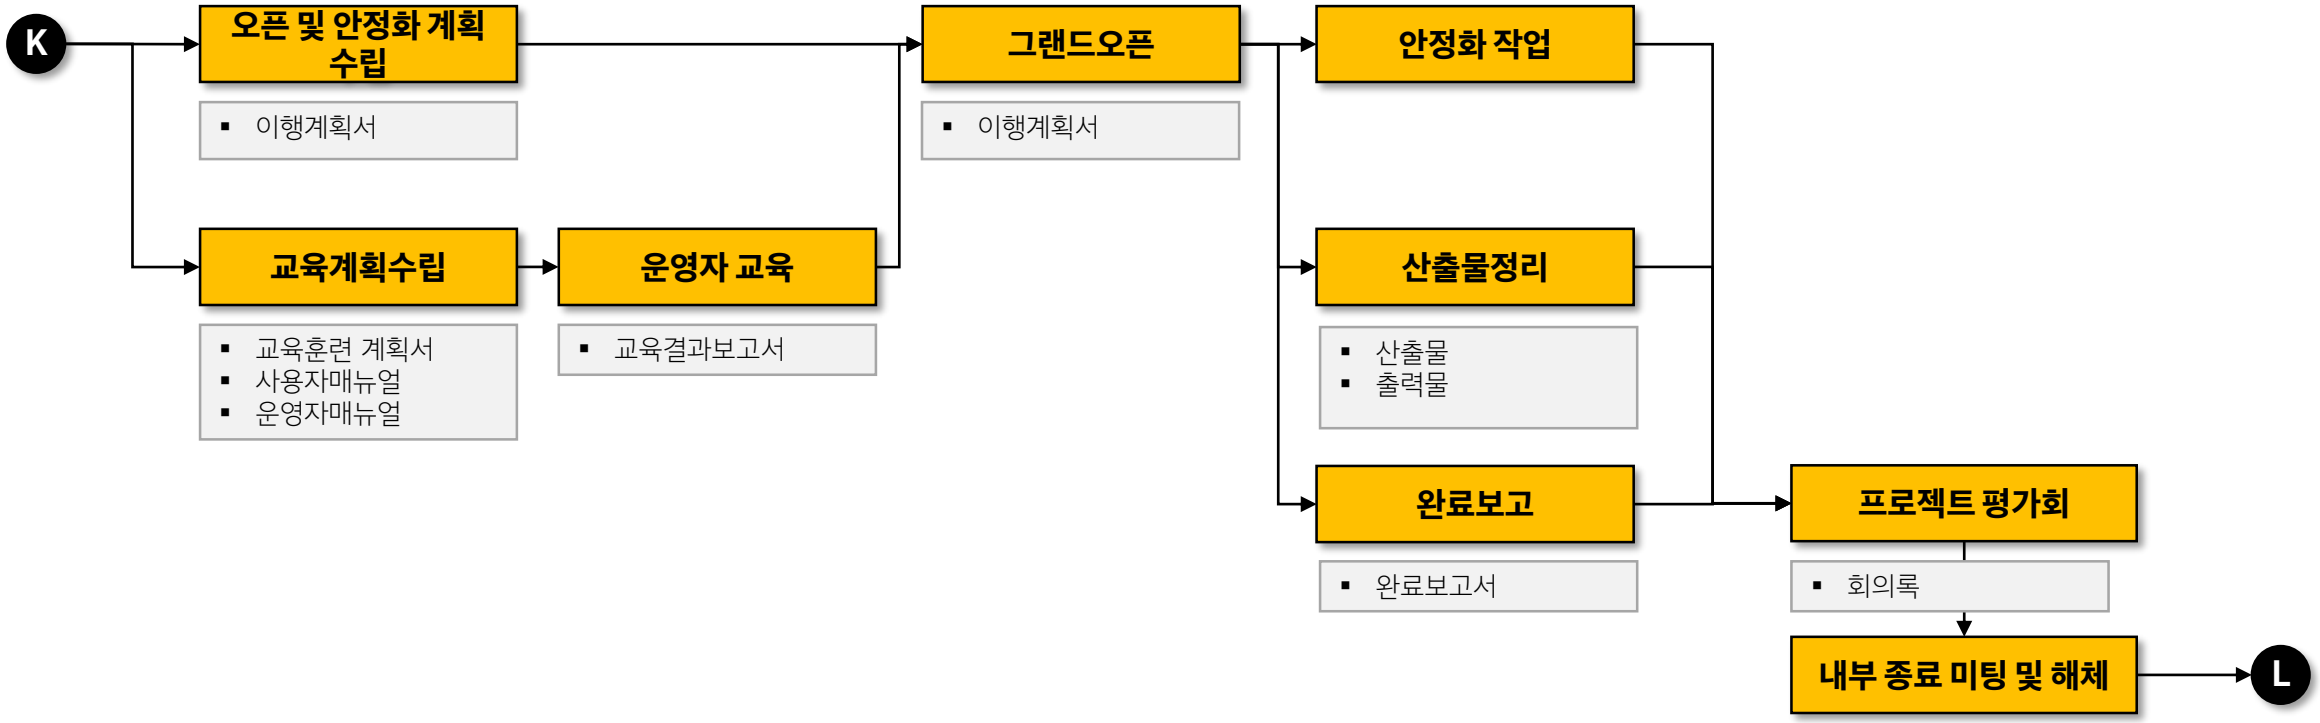

Empasy-Method - 개발

Process


컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | 전개 | 유지보수

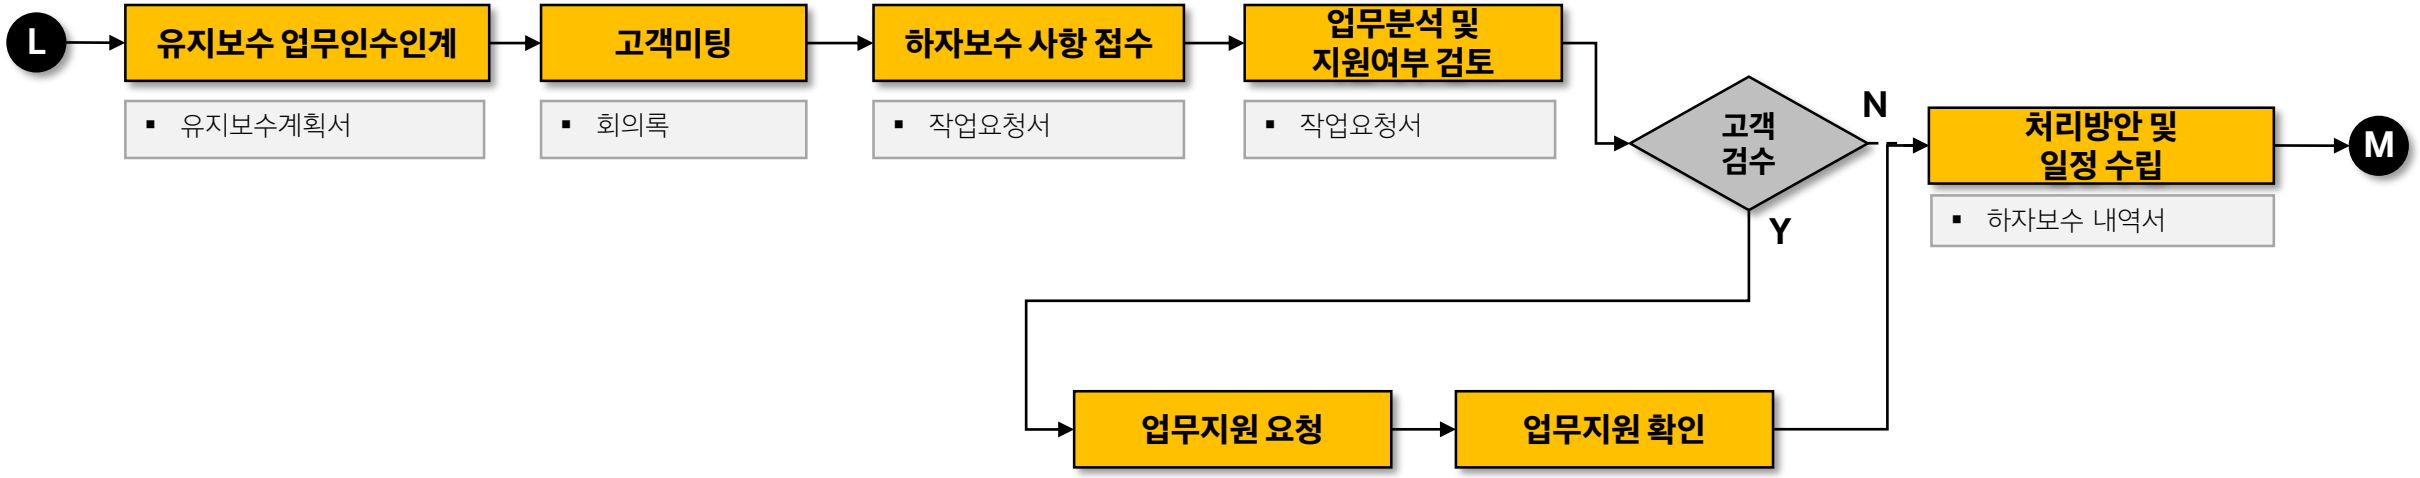

Empasy-Method - 개발


Process

컨설팅 | 착수 | 분석 | 설계 | 구현 | 검수 | 전개 | 유지보수

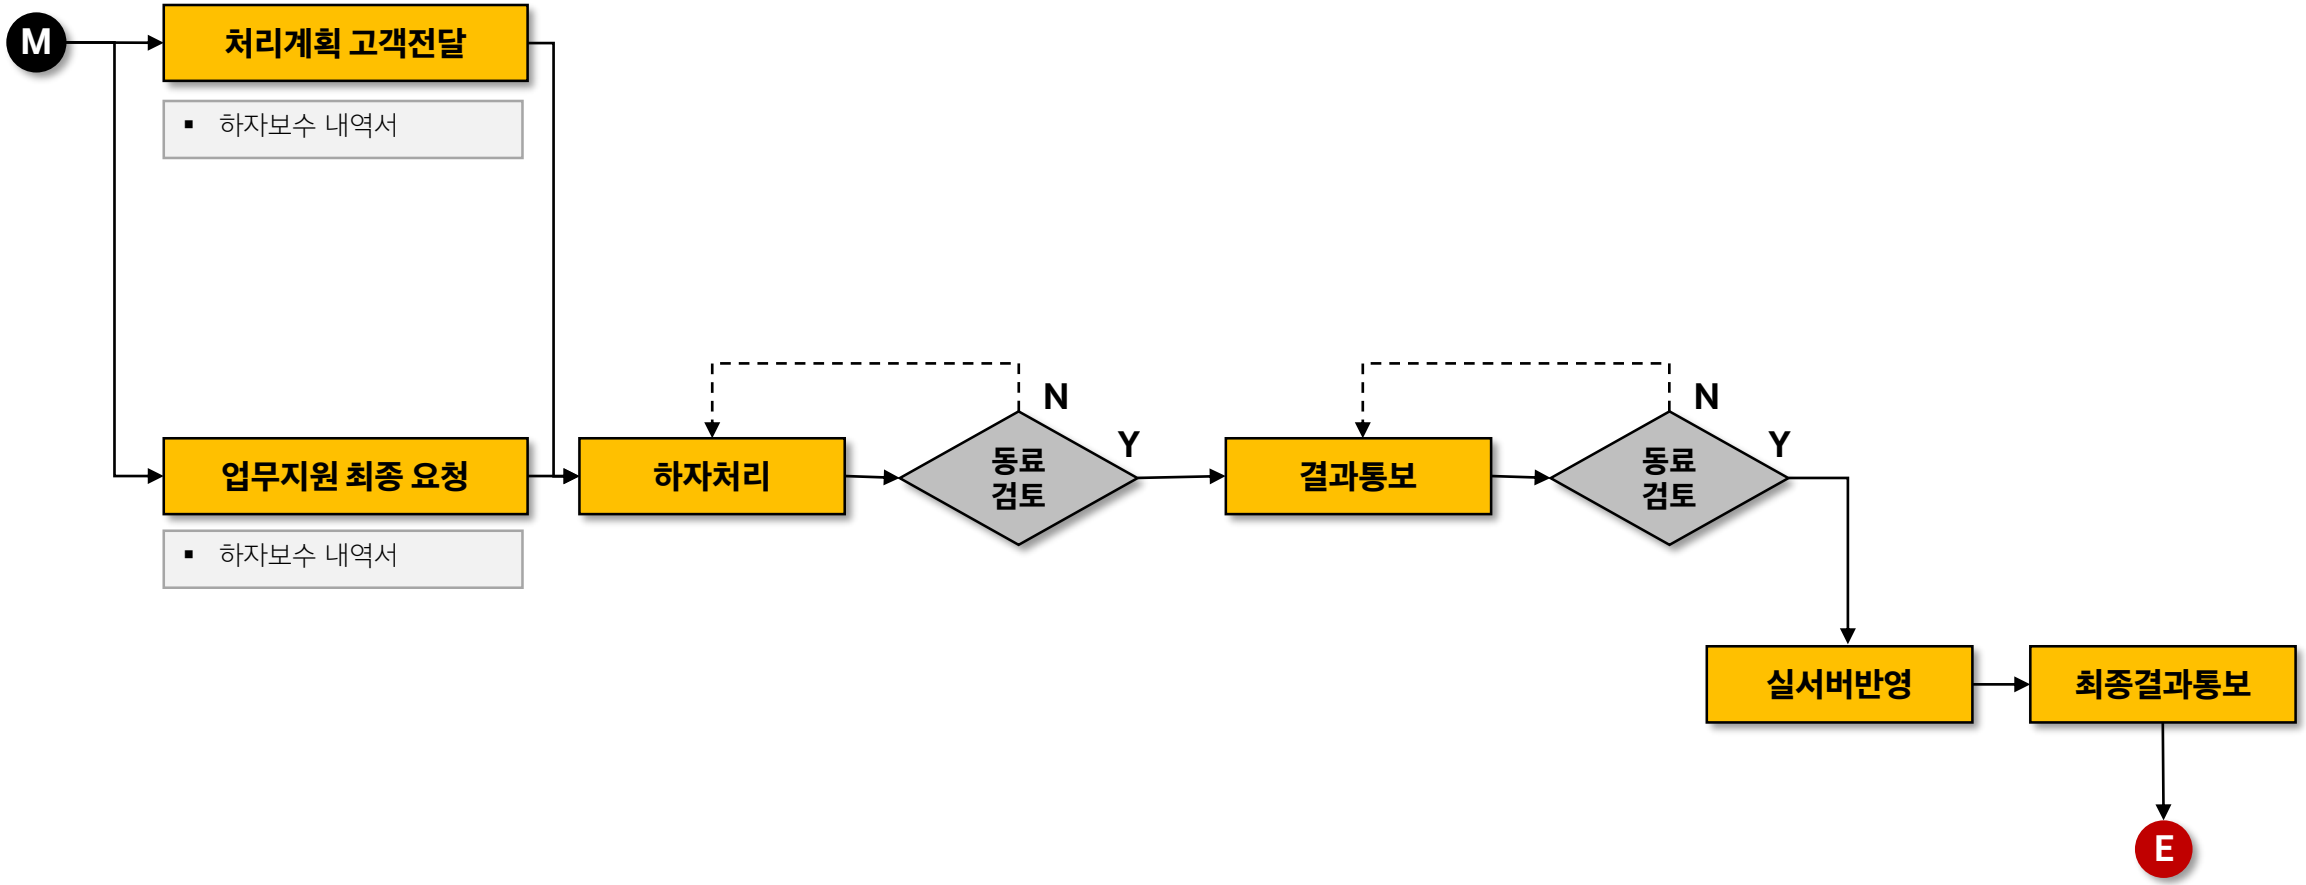


Empasy-Method - 관리

통합관리 Integration Management	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리

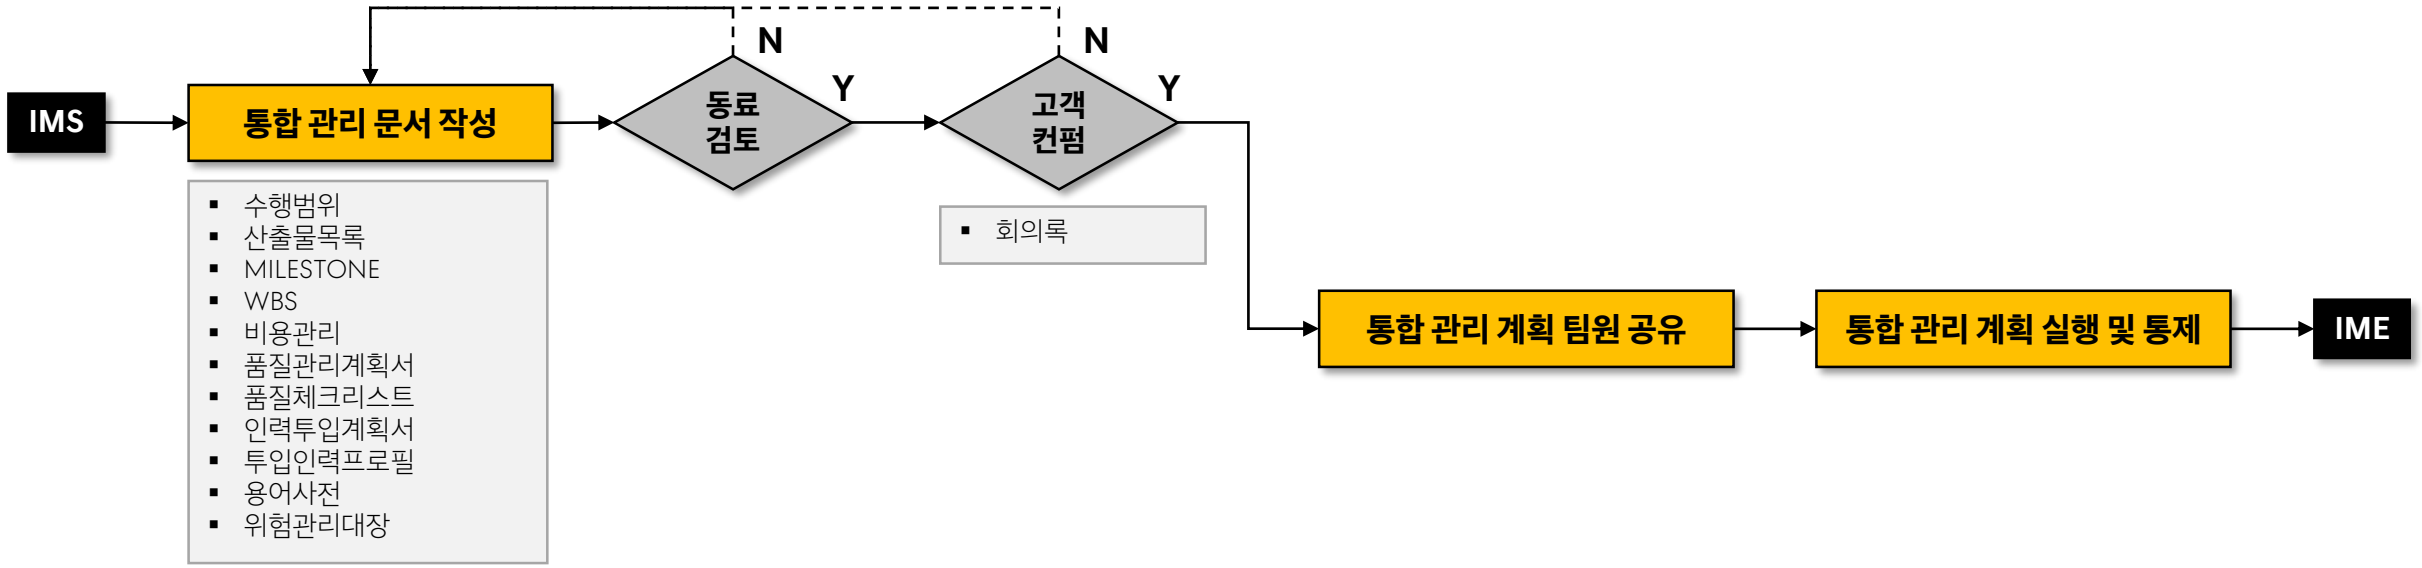


Empasy-Method - 관리

통합관리	**범위관리** Scope Management	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리

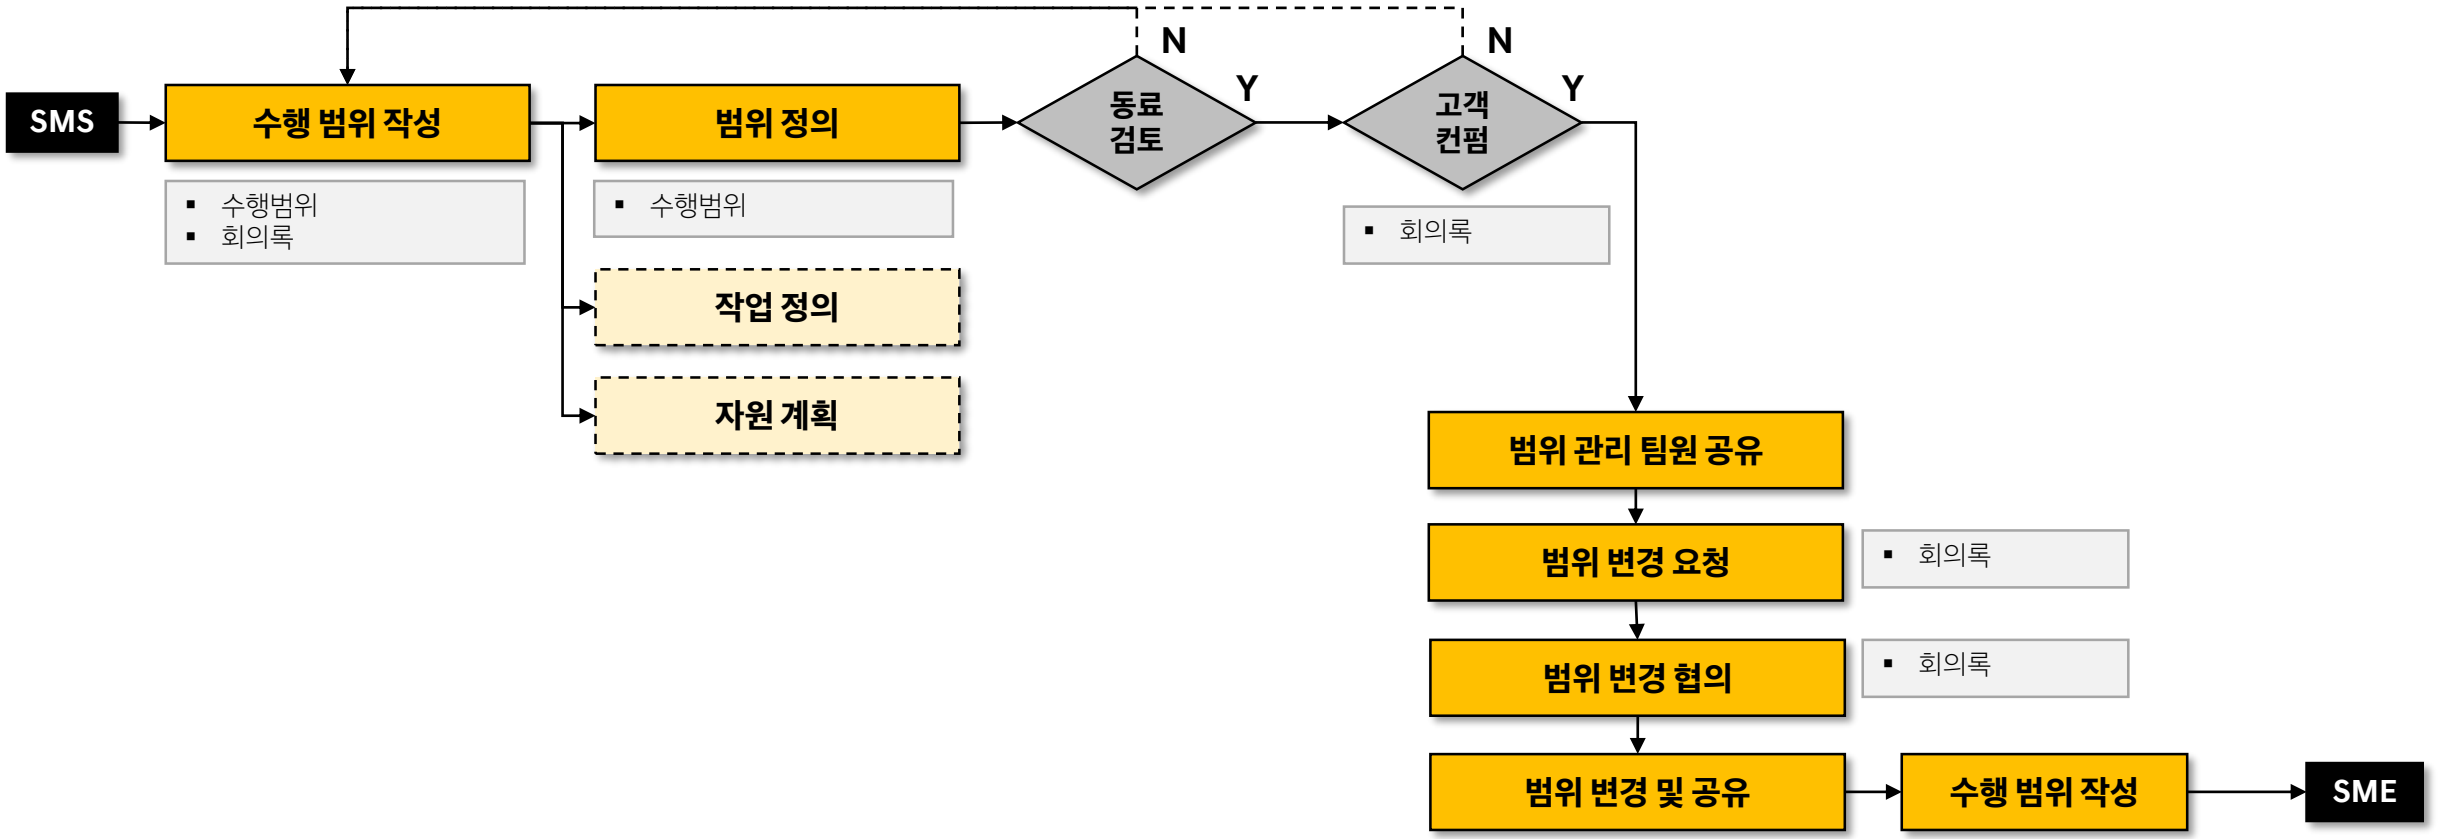


Empasy-Method - 관리

통합관리	범위관리	일정관리 Time Management	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리

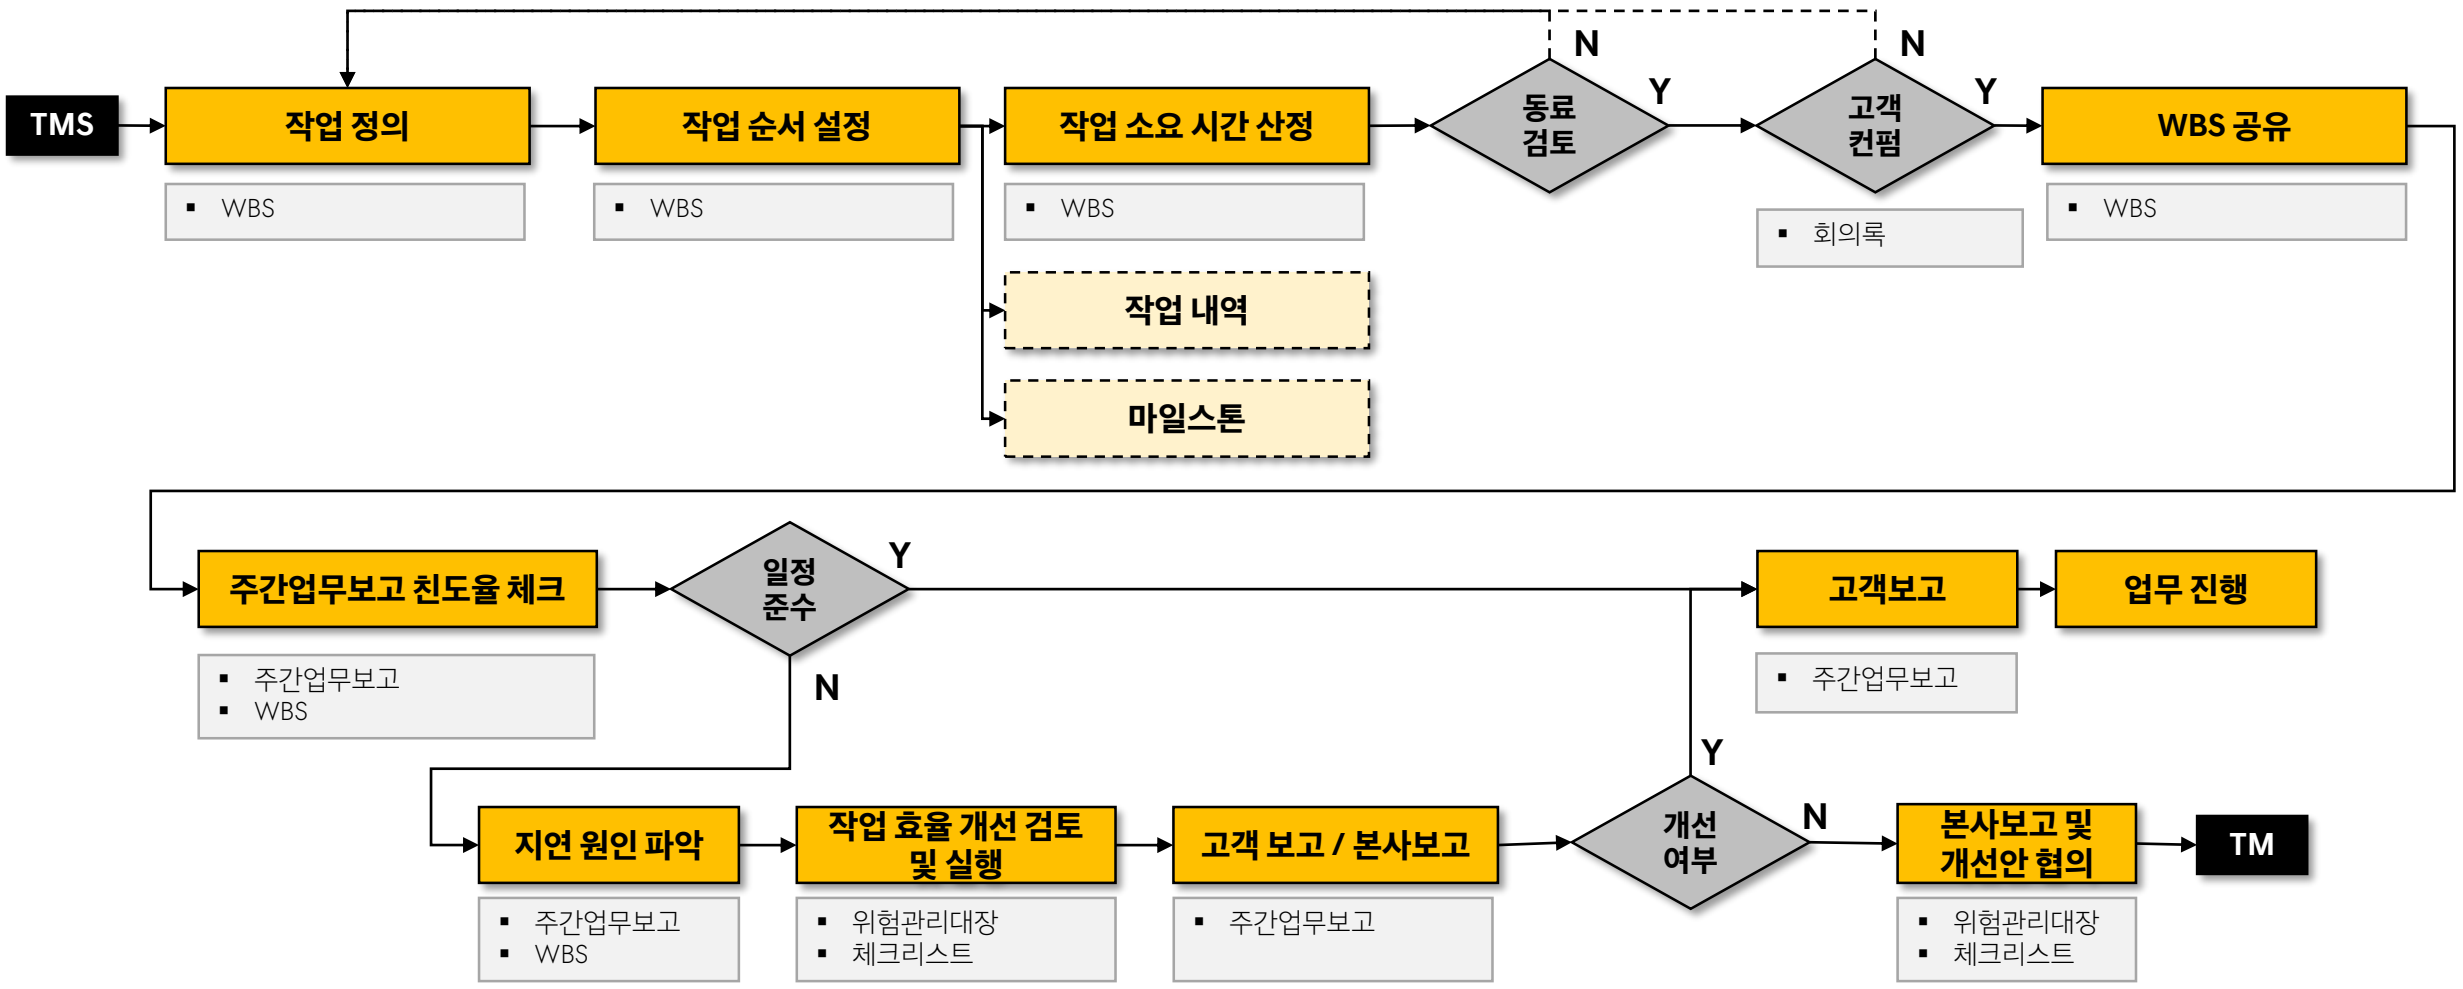


Empasy-Method - 관리

통합관리	범위관리	**일정관리** Time Management	비용관리	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리

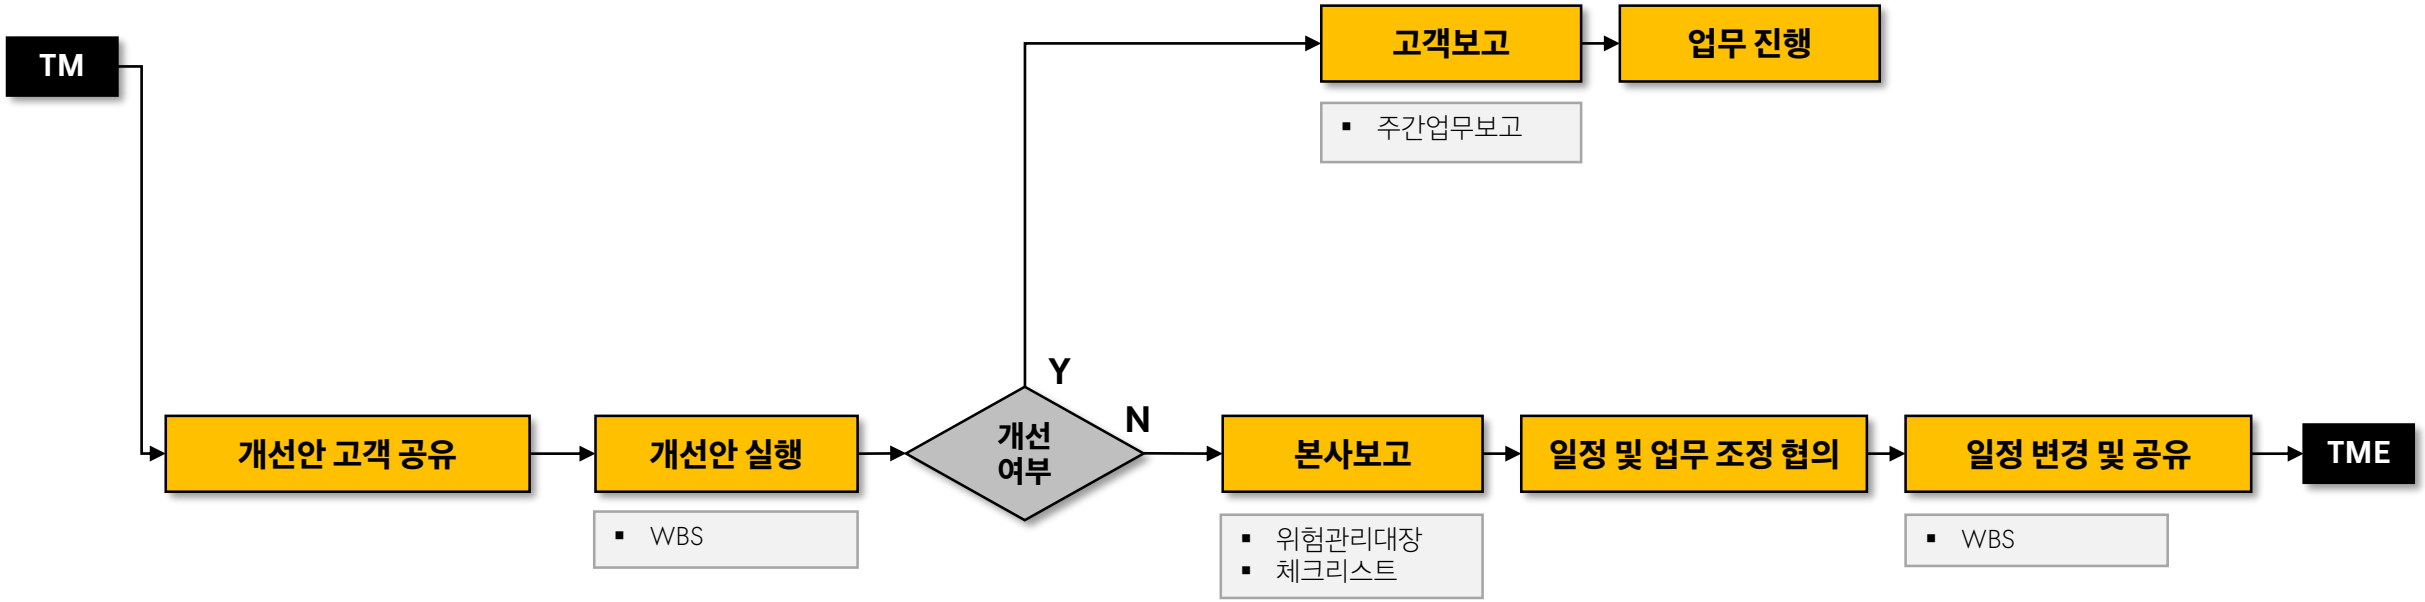


Empasy-Method - 관리

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리 Cost Management	품질관리	조직관리	의사소통관리	위험관리

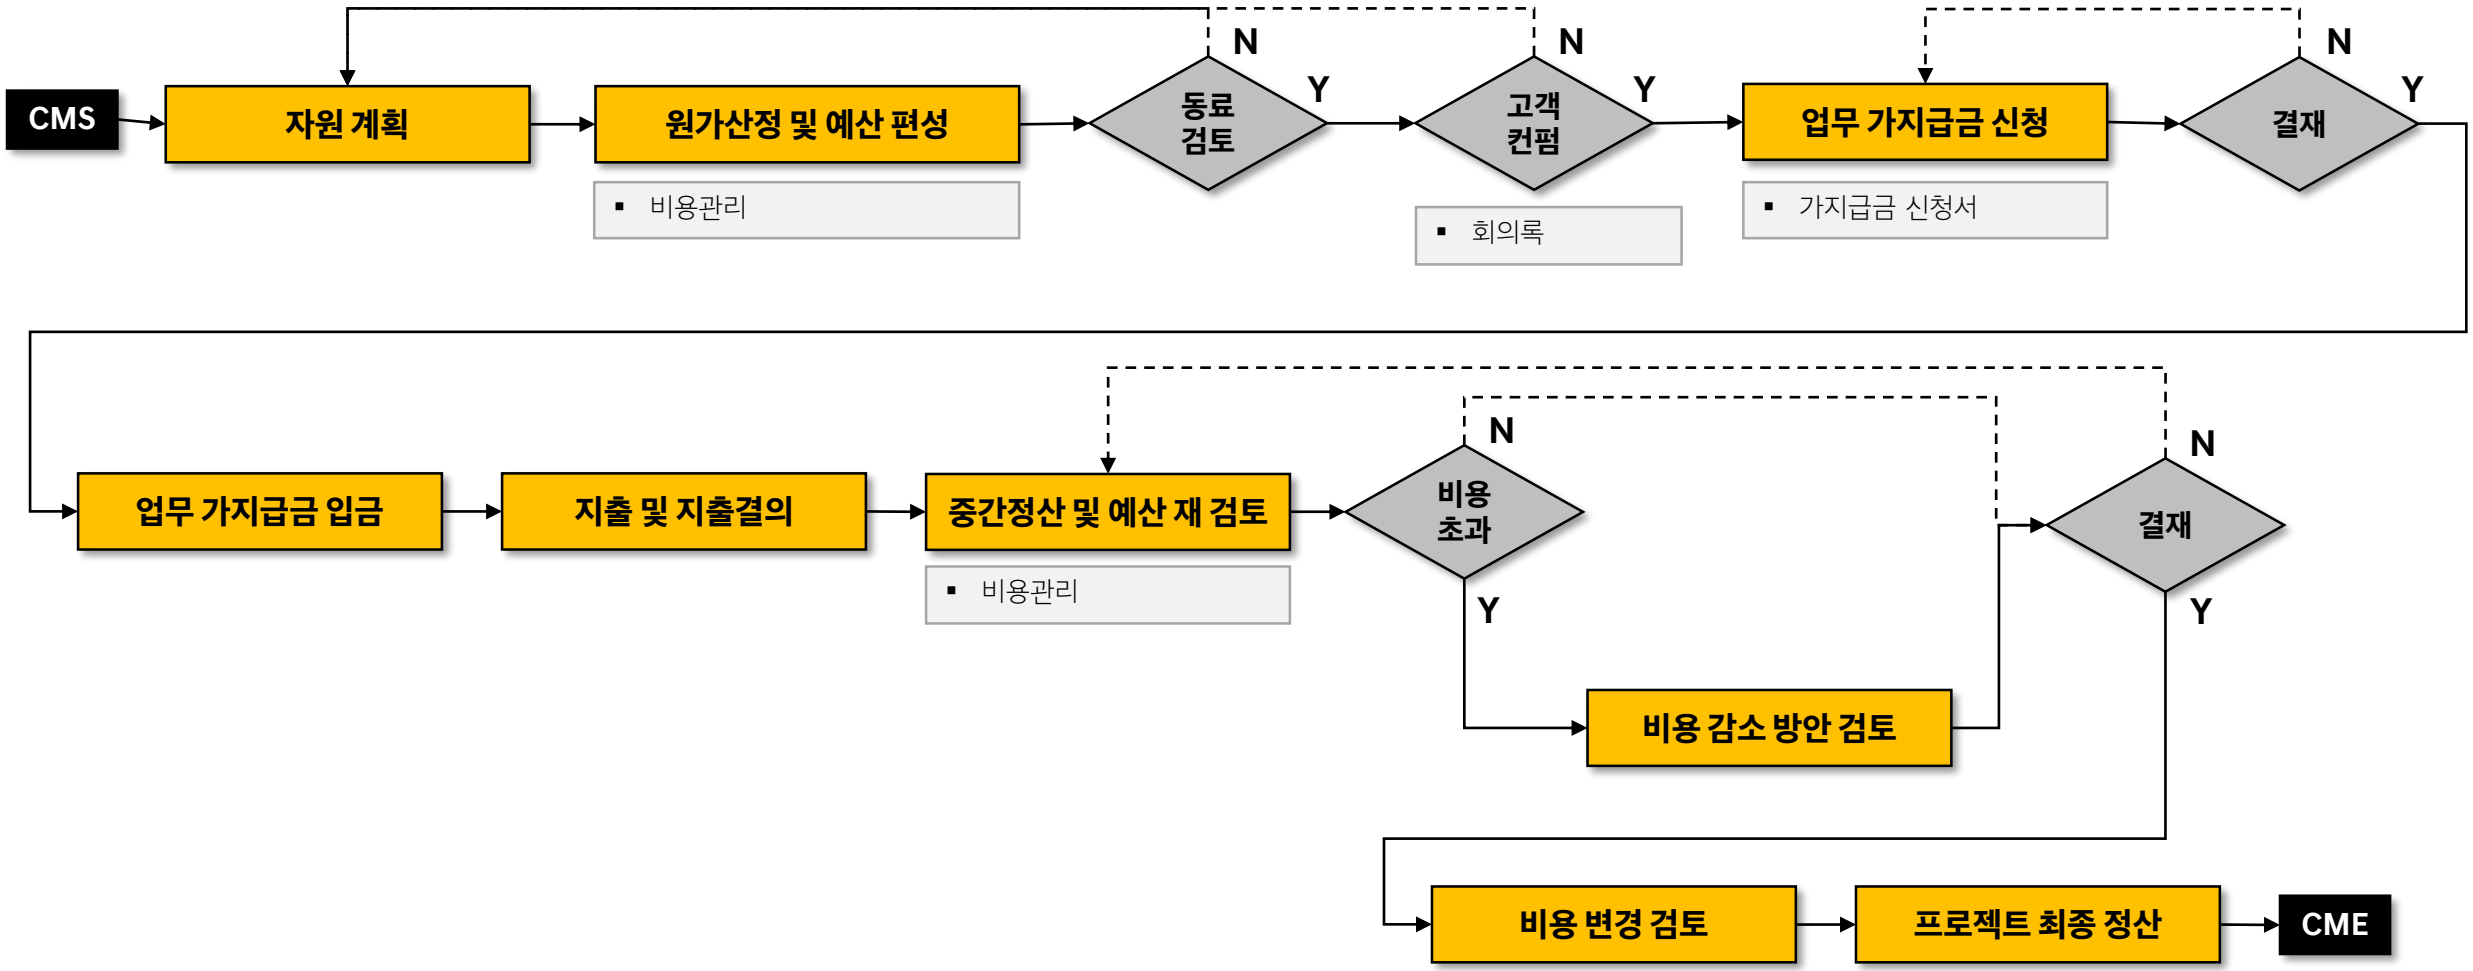


Empasy-Method - 개발

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리 Quality Management	조직관리	의사소통관리	위험관리

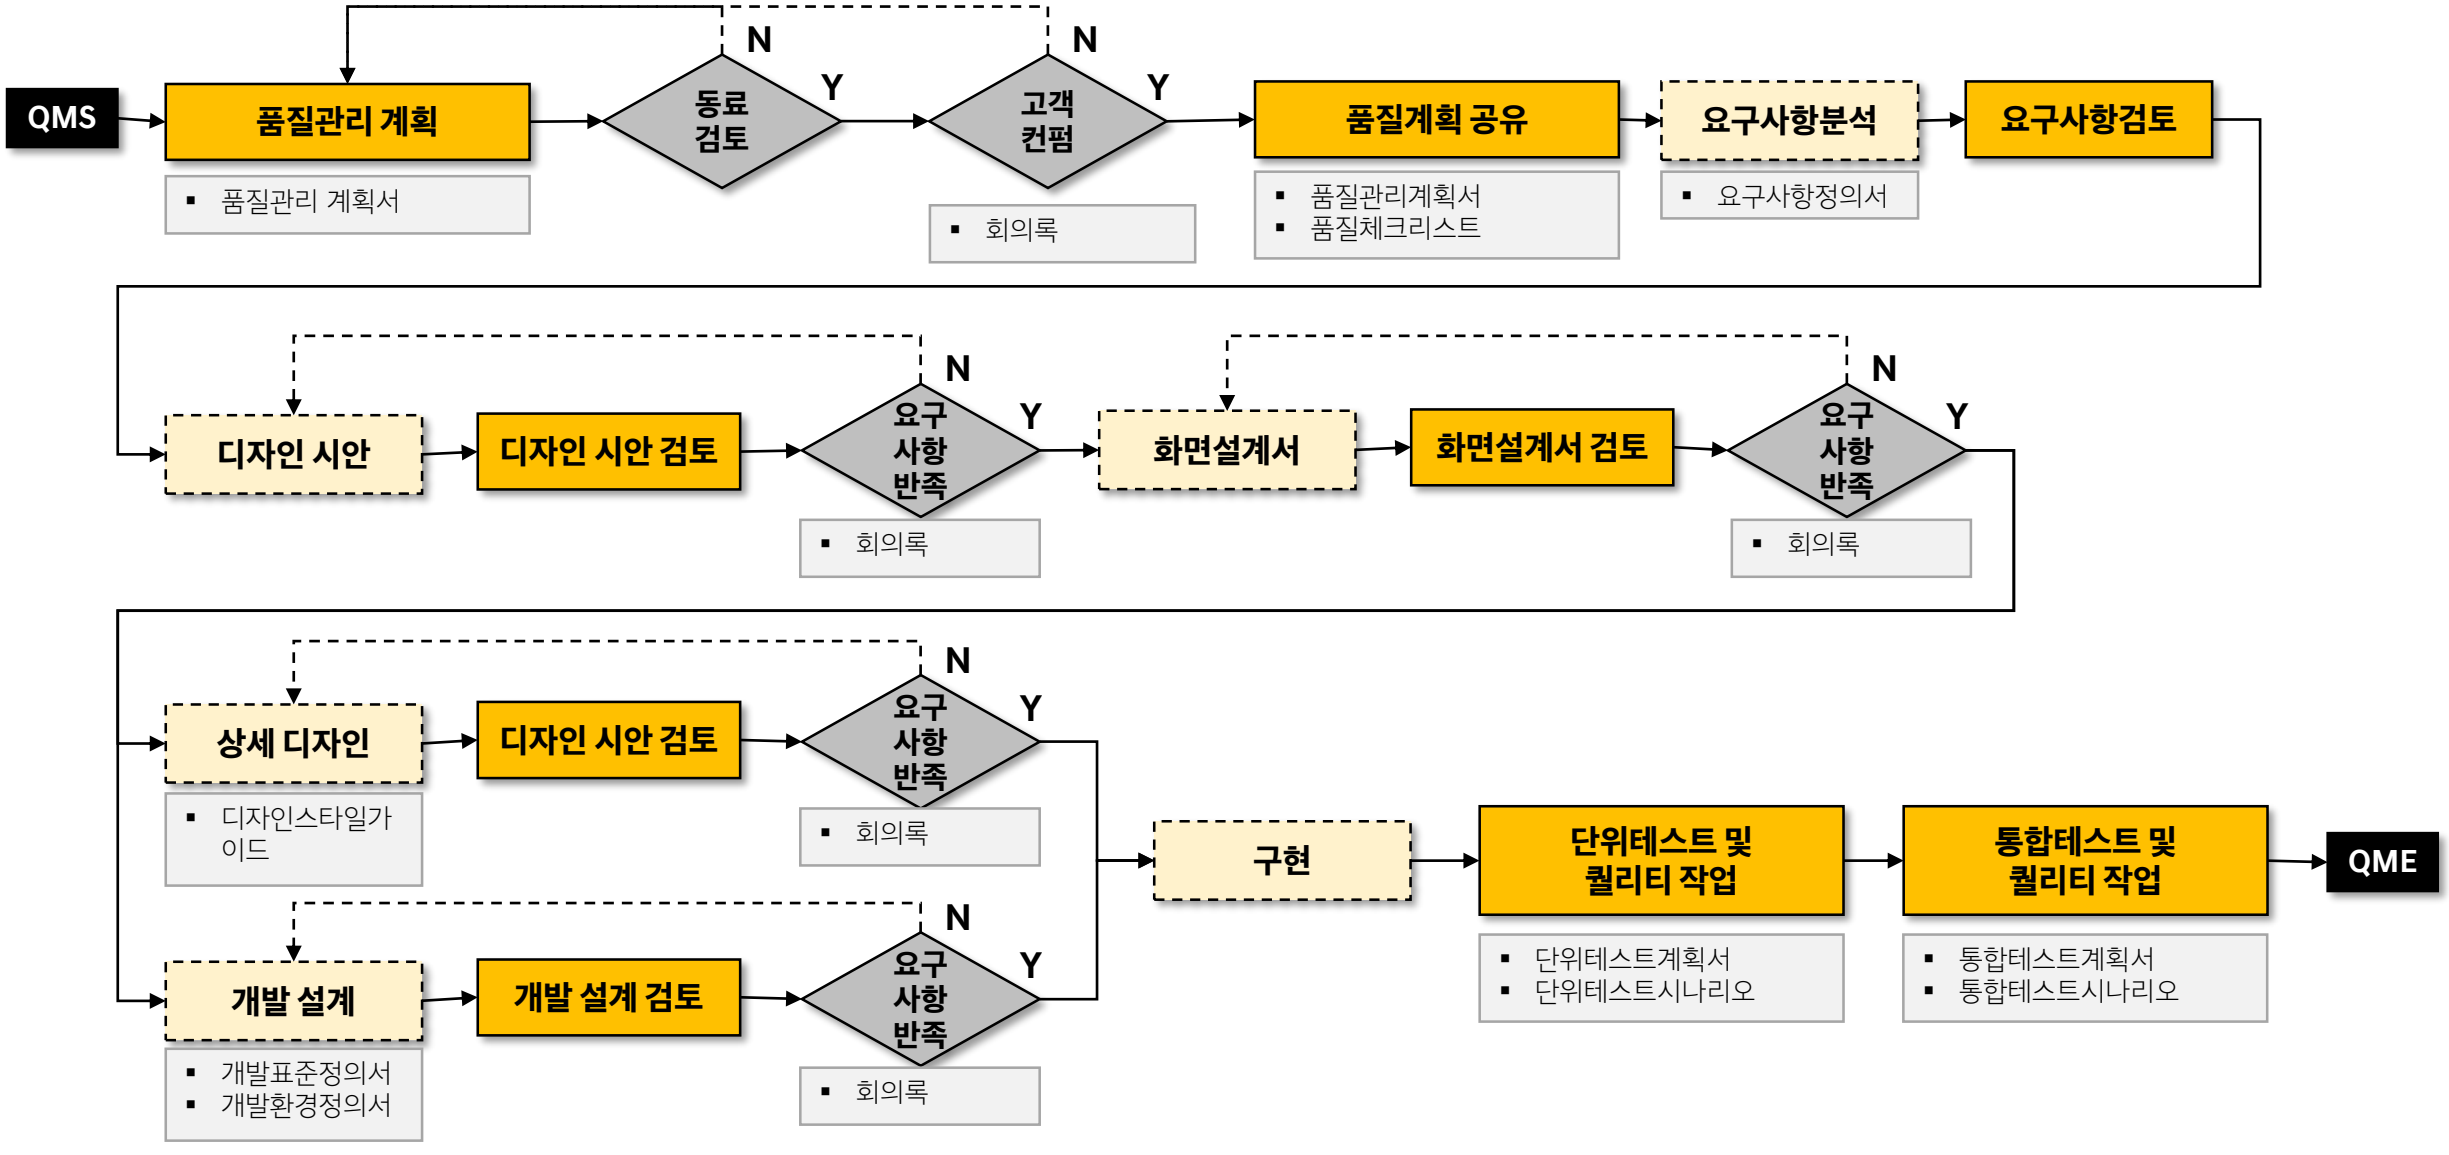


Empasy-Method - 관리

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리 Human Resource Management	의사소통관리	위험관리

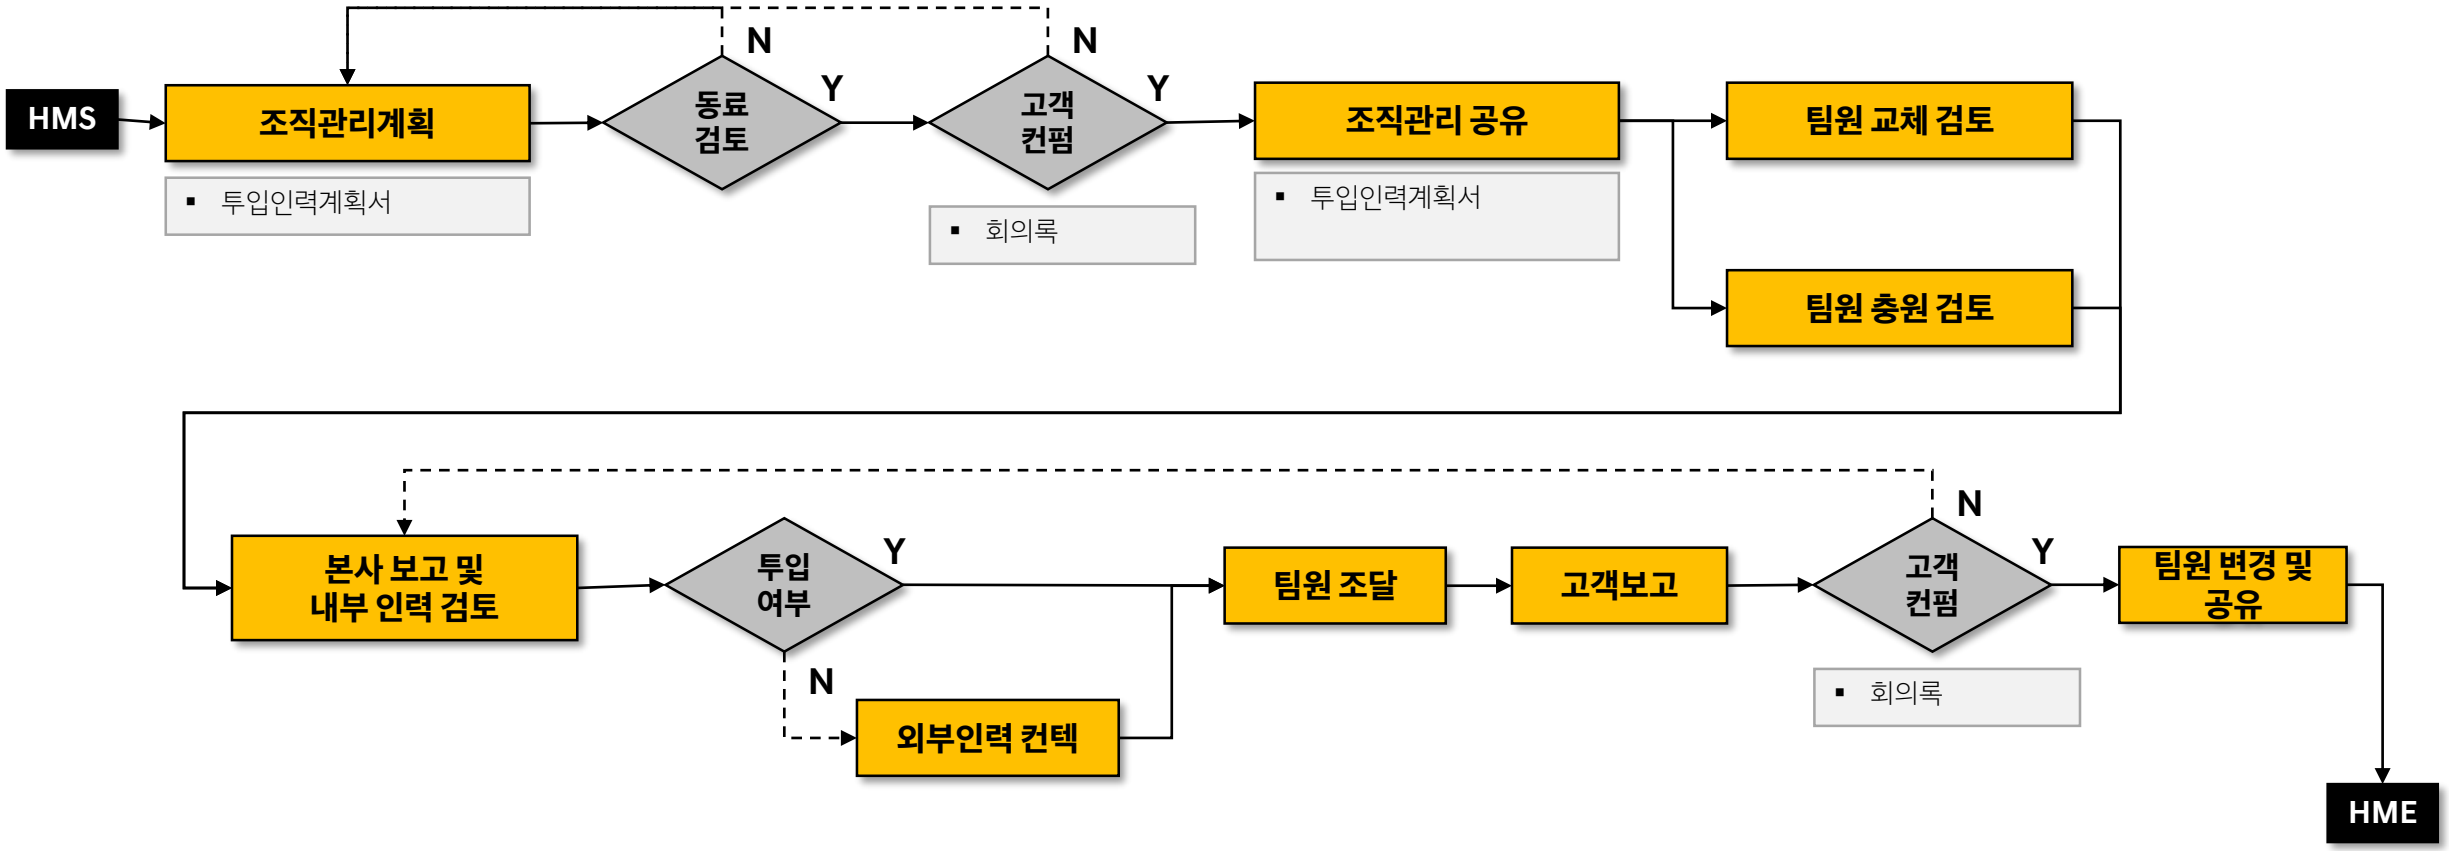


Empasy-Method - 관리

통합관리	범위관리	일정관리	비용관리	품질관리	조직관리	**의사소통관리** Communication Management	위험관리

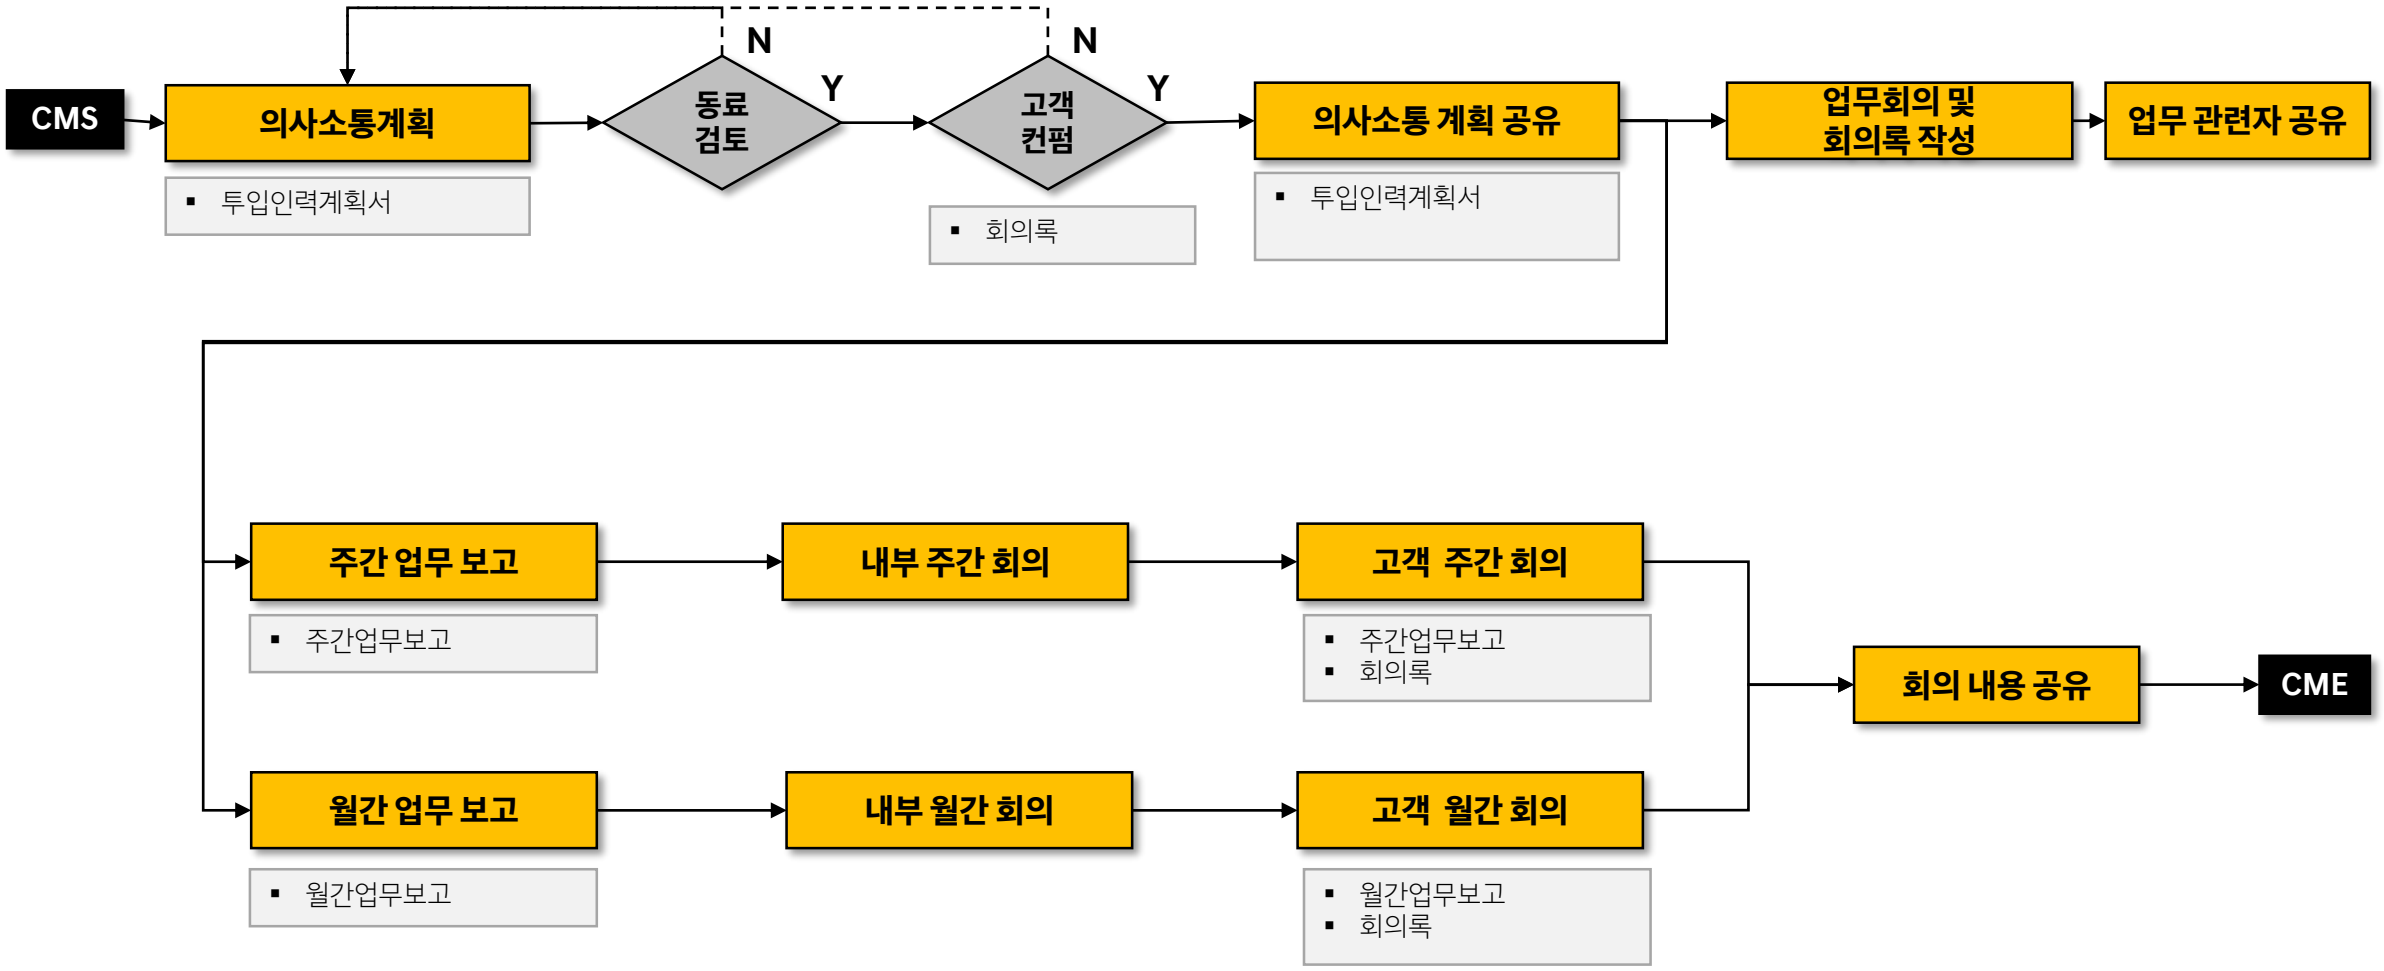

Empasy-Method - 관리

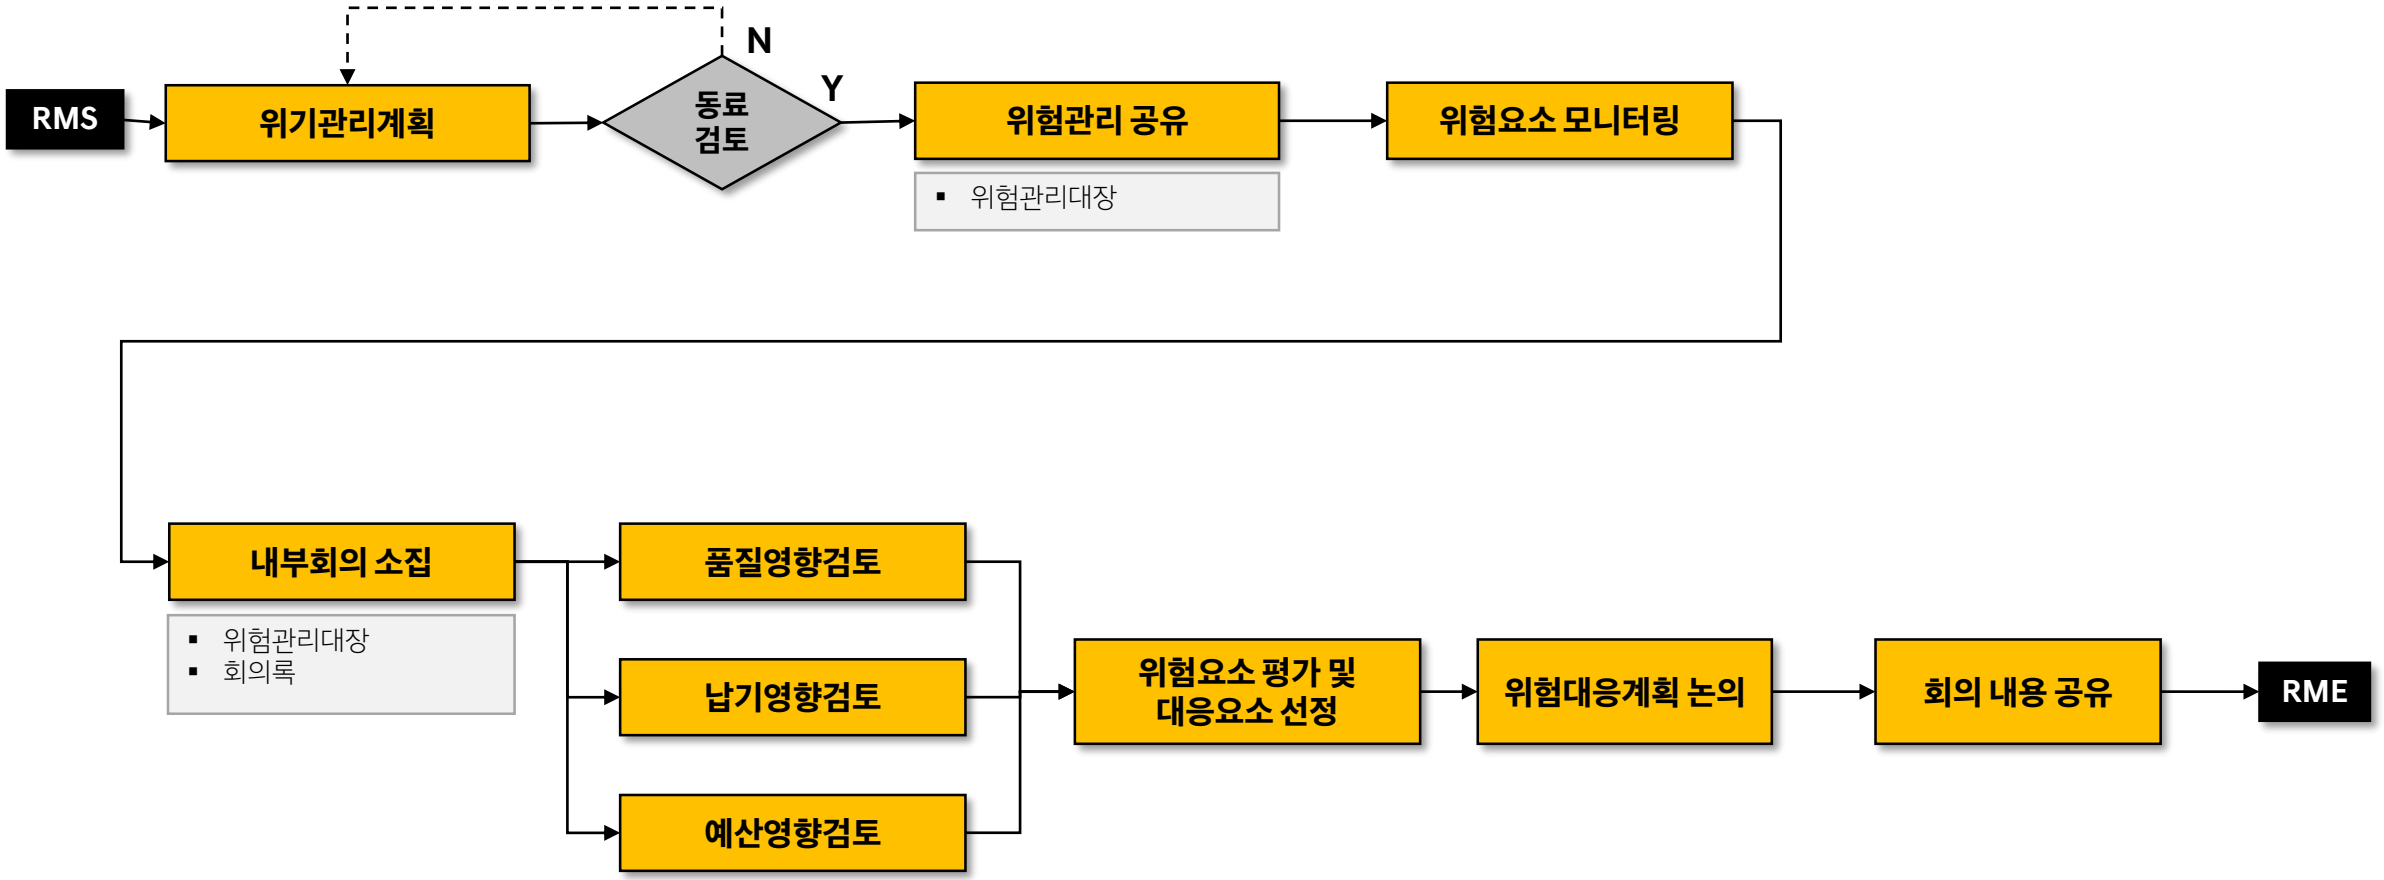

Chapter 3

Document Template

요구사항 정의

요구사항이 명확해야 현실적인 개발이 가능 합니다.

		
고객이 찾아와 아이들이 재미있게 놀 수 있는 놀이기구를 만들어 달라고 이렇게 설명했습니다.	해당 과제 PM은 고객의 요구를 이렇게 이해했습니다.	실무진은 이렇게 이해하고 설계를 시작했습니다.
		
실무진이 구현한 형태는 이렇습니다.	성능 검증을 위해 고객에게 전달되는 초기 버전 모습입니다.	프로젝트 중간 발표는 이렇게 합니다.

요구사항 정의

- ✓ **프로젝트 목표 달성에 필요한 사항과 이해관계자의 요구사항을 판별하여 문서화하고 관리**
  - 산출물 범위를 포함하여 프로젝트 범위를 정의 및 관리하는 데 유용한 기준을 제공
  - 요구사항은 작업분류체계(WBS)의 기반이 됨
  - 원가, 일정, 품질 기획 모두 요구사항을 기반으로 수립됨

- ✓ **요구사항 수집 기법**
  - 인터뷰, 핵심 전문가 그룹 인터뷰, 심층 워크샵 설문, 밴치마킹 등 활용

요구사항 정의

✓ 요구사항 문서 (요구사항 정의서)

- 개별 요구사항의 내용과 충족조건을 기술하는 문서
- 우선 상위수준의 요구사항을 파악한 후 요구사항을 구체화
- 요구사항이 기준선으로 확정되려면 주요 이해관계자의 관점에서 명확하고(측정 가능한) 추적 가능하여야 함

✓ 요구사항 추적 매트릭스 (요구사항 추적표)

- 요구사항이 발생하는 원인과 요구사항을 충족하는 인도물까지 연결해 놓은 계통도
- 개별 요구사항을 목표와 연결시켜 비즈니스 가치를 높이는데 도움이 됨.
- 최종 산출물 범위에 대한 변경을 관리하는데 유용한 체계를 제공함.

요구사항 정의서

Sample

표지 | 개정이력 | 요구사항정의서(기능) | 요구사항정의(비기능) | Interview

- 요구사항은 기능과 비기능으로 구분하여 작성 한다.
- 인터뷰 진행에 대한 일정과 내용은 Interview 시트에 작성 한다.

Seq	요구사항 ID	분류	요구사항명	상세내역	출처	질문	확인사항	전제조건 및 제약사항	중요도	수용 여부	추가 확인 코멘트 및 비고
1	REQ-F-001	공통	개발 Device & OS	TELECARE(가칭) Patient App은 Android OS와 iOS 운영체제에서 모두 구동할 수 있도록 개발	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서	9/6 (김상환) : 각 서비스 별 구축 Device와 OS 확인 요청			상	수용	
2	REQ-F-002	공통	API 연계	TELECARE (가칭) Patient App은 당사가 제공하는 Bluetooth API를 통해 SMARTGAIT Insole과 연결 가능하도록 개발	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서				상	수용	
3	REQ-F-003	공통	노출 기능	1st phase 와 2nd phase를 모두 개발하되, 대내/외 환경에 따른 당사의 요청에 따라 일부 기능을 Open/Close가 가능하도록 구현되어야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서	9/6 (김상환) : 일부 기능에 대한 확정 필요	10/7 (연상근) : - 화면설계/기능정의 등을 통하여 P1/P2 범위 확정	Master Admin에서 조절하지 않고 환경별 App 런칭으로 진행	중	수용	**3/31** 강경훈 아시님과 협의 완료 - Master Admin에서 메뉴 관리 제외 (기능 삭제) - 모든 서비스에 메뉴는 ON/OFF 기능이 필요하지 않아 제외 처리함
4	REQ-F-004	공통	동기화 기능	SMARTGAIT Insole을 통해 수집된 Data는 당사가 요청하는 기준에 따라 SMARTGAIT Beta(기존 앱), TELECARE(가칭), 관리용 Web 모두 호환 가능하도록 개발되어야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서				중	수용	
5	REQ-F-005	공통	데이터 전송	TELECARE(가칭)에서 수집된 모든 정보는 SALTED 클라우드 서버로 전송이 가능해야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서	9/16 (김상환) : SALTED 클라우드 서버의 정보는?			상	수용	
6	REQ-F-006	공통	모티터링	1st phase의 '일상 보행패턴 모니터링'은 TELECARE(가칭) App의 Default 기능으로써, App과 SMARTGAIT Insole이 연결된 상태에서 자동으로(상시) 수집될 수 있어야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서				상	수용	
7	REQ-F-007	공통	동기화 기능	2nd phase에서 '실시간 동기화' 정보는 '클라우드 서버'를 통해 연결된 담당 HCP의 App(SMART GAIT Beta)으로 실시간 확인이 가능해야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서				상	수용	
8	REQ-F-008	공통	Alert 기능	이상보행패턴 알림 기능은 환자용 App에서 팝업 알림 형태로 구현되며, HCP용 App에서도 확인가능해야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서	9/6 (김상환) : 팝업 알림의 형태는? 팝업창과 Toast 방식등의 확인 필요 (해당 로직 등 정리 필요)	화면설계서를 통하여 기능 협의 진행		상	수용	
9	REQ-F-009	공통	통합관리 기능	Web서비스는 SMARTGAIT Beta(기존 HCP용 App)의 Web 버전과 TELECARE(가칭) App을 통해 수집된 모든 데이터를 관리할 수 있는 Admin으로 구축되어야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서			Master Admin 진행 (Region 별 서버 설정 및 분리)	상	수용	
10	REQ-F-010	공통	데이터 암호화	기타 개인 정보 및 의료 정보 보호 관련 암호화 및 보안 가이드라인 준수해야 함	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서			체크리스트 제공	상	수용	
11	REQ-F-011	공통	앱/모바일간 링크 연계성	네이티브 앱 내 연동 운동 추천, 앱 다운로드, 건강정보, 이벤트 등 모바일 SMS으로 유기적 연동 적용	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발 제안 요청서		10/7 (연상근) : - SMS 발송 연동 적용하지 않음		하	미수용	

- 요구사항 ID : 단일한 요구사항을 관리 하기 위하여 ID를 배정 한다.
- 분류 : 공통, 사용자/관리자, 메뉴별, 기능별로 분류가 가능 할때 분류를 작성한다. * 분류가 필요하지 않은 경우 삭제 가능
- 요구사항명 : 요구사항을 간단하게 작성 한다.
- 상세내역 : 요구사항에 대한 자세한 설명
- 출처 : 요구사항을 접수한 문서, 보통 제안요청서, 제안서, 회의록을 통해 접수 진행한 근거를 작성 한다.
- 질문/확인사항 : 요구사항에 대한 현업에게 질문한 내용을 작성하고 답변내용을 확인사항에 작성 한다.
- 전제조건 및 제약사항 : 요구사항에 대한 전제조건, 제약사항이 있는 경우 작성 한다.
- 중요도 : 요구사항에 대한 중요도를 배정 한다.
- 수용여부 : PM은 각 요구사항에 대한 수용여부를 작성한다. 수용여부가 미수용인 경우 현업과 협의하고 근거를 작성한다.
- 추가확인 코멘트 및 비고 : 추가 확인한 내용을 작성 한다.

요구사항 수집 방법



▪ 인터뷰 진행 방법

✓ 가장 많이 사용하는 방법으로 고객과 스케줄을 통하여 미팅 하여 요구사항에 대한 설명 및 방향을 진행 한다.

✓ 인터뷰 진행 후 회의록으로 근거를 작성하고 요구사항정의서를 작성한다. 해당 내용은 이해관계자와 공유한다.

Sample



▪ 전문가 그룹 인터뷰 진행 방법

✓ 이해관계자 중 전문가 그룹를 만들어 인터뷰를 진행하여 요구사항을 상세화 한다.


Sample



▪ 밴치마킹 진행 방법

✓ 관련 서비스의 예시를 직접 설명하고 리뷰 함으로써 직접적인 요구사항에 대한 방향을 확인할 수 있다.

Sample

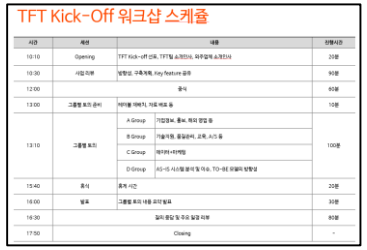

▪ 워크샵 진행 방법

✓ 분석이 어느정도 끝난 시점에 워크샵을 진행하여 이해관계자와 전체적인 요구사항 리뷰 및 설계 대한 방향을 확인할 수 있다.

✓ 요구사항에 대한 검수 진행으로 향후 요구사항의 변경을 최소화 할 수 있다.

Sample

요구사항 질의서

Sample

▪ 인터뷰 진행 방법

✓ 이해관계자에게 서면으로 우선 전달하고 요구사항에 대한 상세화를 진행함.

프로젝트명 요구사항 질의서

* 본 문서는 프로젝트명 프로젝트의 올바른 방향 설정과 원활한 프로젝트 진행을 위해 작성되는 문서입니다.
* 작성해주시는 문서를 기초로 내부 분석 자료와 함께 프로젝트의 분석 및 전략, 디자인 방향, 기능 설계 등에 활용될 예정이므로 소중한 의견 부탁드립니다.
* 질의서는 피씨 홈페이지와 모바일 앱버전 포함된 내용으로 구성되어 있으며 각 항목별 내용에 대해 최대한 상세히 기입을 부탁드립니다.
* 해당하지 않으신 문항에 대해서는 작성하지 않으셔도 무방하며 작성에 어려운 부분이 있으실 경우 담당 PM을 통해 문의주시면 상세히 안내해드리도록 하겠습니다.

Basic Information / 기본정보		
소속기관 / 부서명		Ex) 업체명 / 홍보팀
이름 / 직급		Ex) 홍길동 / 대리
담당업무		Ex) 웹서비스(피씨 홈페이지, 모바일앱) 관리, 홍보 기획

1. 개요

본 질의문은 구축 대상이 되는 現 웹서비스(피씨 홈페이지, 모바일앱)의 만족도와 개선사항에 대한 문의 입니다.
아래 질의문을 읽어보시고 답변을 부탁드립니다.

번호	질의	답변 및 요청사항	요청 (수급) 리스트	의견	비고
2	현재 업체명의 피씨 홈페이지 또는 모바일앱에서 주로 어떤 서비스를 이용하고 계신가요? 1) 매장안내 및 행사 전단 2) 멤버십 (상품권) 3) 장보기 메모 4) 고객문의 5) 기타 (쇼핑몰, 인터넷구매시스템 등의 연결된 웹서비스(피씨 홈페이지, 모바일앱))	보기의 번호를 기입해주시고, 그에 대한 이유를 기재해주세요.			
3	현재 업체명의 피씨 홈페이지 또는 모바일앱의 가장 핵심적인 서비스는 무엇이라고 생각하시나요? 1) 매장안내 및 행사 전단 2) 멤버십 (상품권) 3) 장보기 메모 4) 고객문의 5) 기타 (쇼핑몰, 인터넷구매시스템 등의 연결된 웹서비스(피씨 홈페이지, 모바일앱))	보기의 번호를 기입해주시고, 그에 대한 이유를 기재해주세요.			

요구사항 추적표

Sample

표지 | 개정이력 | 요구사항추적매트릭스(기능) | 요구사항추적매트릭스(비기능)

- 요구사항추적표는 기능과 비기능으로 구분하여 작성 한다.

분석단계(요구사항정의서)				설계단계				구현단계	시험단계	변경		
요구사항ID	요구사항명	상세내역	상태	설계 여부	화면ID (화면명)	프로그램ID (프로그램명)	고객승인	단위테스트 케이스ID	통합테스트 케이스ID	추가/변경/삭제	변경일자	변경사유
F-REQ-F0001	T셀파 유치 기능정의	- 유치원, 어린이집 대상의 교재 판매 후 수업용 디지털콘텐츠 제공 서비스 - 수업 준비 및 수업에 활용할 수 있는 자료 중심 / 교재 홍보 - 비교서비스 : EBS누리샘 / 동심누리 / 키즈엠 - 대상 : 유치원 교사, 어린이집 교사, 원장, 총판 (승인 등 절차를 위한 별도 사이트 필요) * 참조 문서 : 20200717 별첨 - T셀파 개선 화면 예시 #1~4	수용	Y	BOBI10101	통합기관코드관리		BOBI10101	BO-020000			

요구사항추적표는 분석단계, 설계단계, 구현단계, 시험단계, 변경 관리로 구분하고 각 요구사항에 대한 설계/구현/시험/변경에 대한 이력을 관리 한다.

1. 분석 단계-요구사항정의서
- 요구사항 ID : 단일한 요구사항을 관리 하기 위하여 ID를 배정 한다.
- 요구사항명 : 요구사항을 간단하게 작성 한다.
- 상세내역 : 요구사항에 대한 자세한 설명
- 상태 : 수용여부를 작성한다.

2. 설계단계-화면설계서, 개발표준정의서
- 설계 여부 : 해당 요구사항이 반영된 화면설계서, 개발관련 문서 작성 여부
- 화면ID : 해당 요구사항이 반영된 화면설계서에 명시된 화면 ID 작성
- 프로그램ID : 해당 요구사항이 반영된 개발관련 문서에 명시된 프로그램 ID 작성
- 고객승인 : 해당 요구사항이 반영된 고객 승인 날자와 승인자명 작성


3. 구현단계-단위테스트 케이스 ID
- 해당 요구사항이 반영된 단위테스트 케이스 ID

4. 시험단계-통합테스트 케이스 ID
- 해당 요구사항이 반영된 통합테스트 케이스 ID

5. 변경관리-해당 요구사항의 추가/변경/삭제 된 내용 작성
- 추가/변경/삭제 : 해당 요구사항의 추가/변경/삭제 선택
- 변경일자 : 변경 일자 작성
- 변경사유 : 변경 사유 작성

WBS

프로젝트를 더 작고 관리하기 쉬운 작업으로 나누는 데 도움이 되는 시각적 도구입니다.

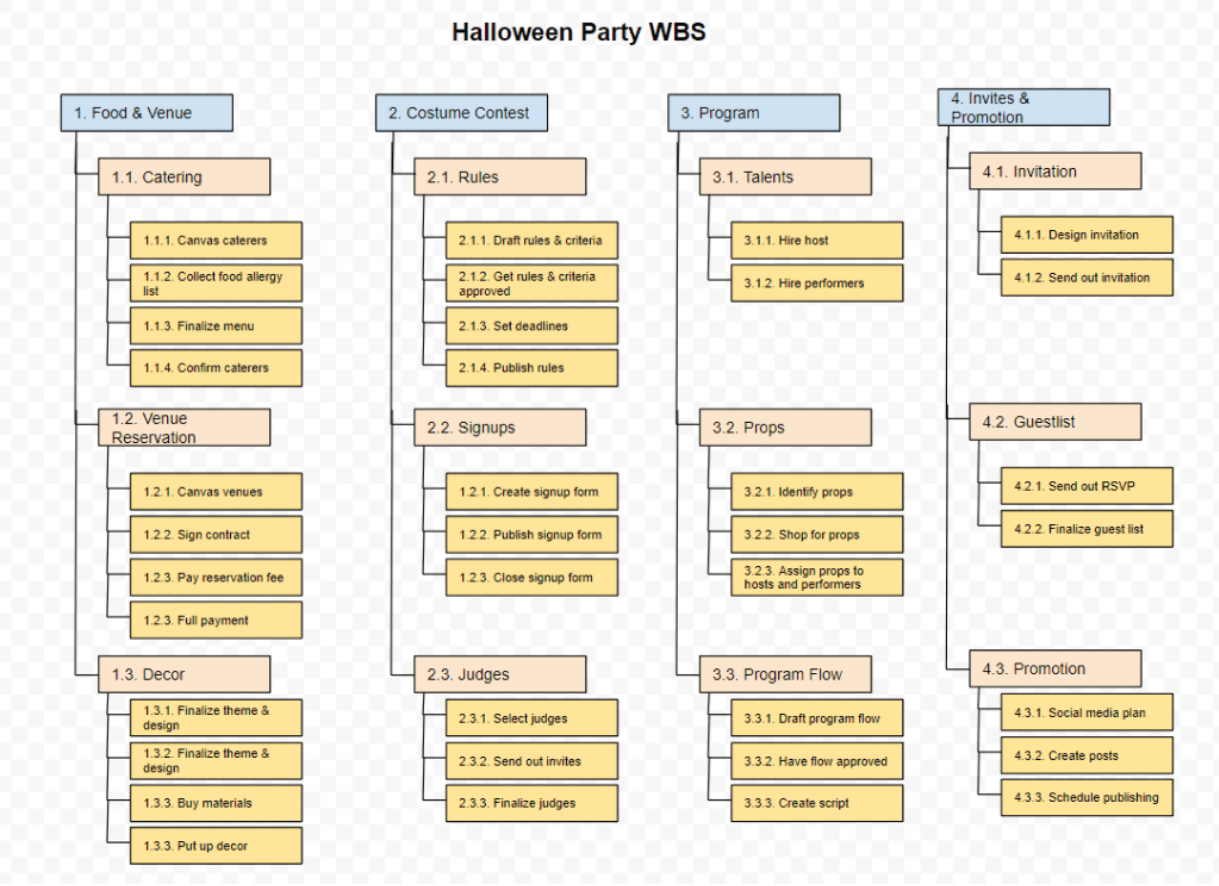

WBS (작업분류체계)

- ✓ WBS는 Work Breakdown Structure의 약자입니다.
- ✓ 프로젝트를 더 작고 관리하기 쉬운 작업으로 나누는 데 도움이 되는 시각적 도구입니다.
- ✓ WBS는 프로젝트의 최종 목표에서 시작하여 각 작업이 명확하게 정의될 때까지 점점 더 작은 조각으로 나눕니다.
- ✓ WBS는 다양한 형식으로 만들 수 있지만 일반적으로 상단에 최종 목표가 있고 하단에 가장 작은 작업이 있는 계층적 트리 구조처럼 보입니다.
- ✓ 트리의 각 수준은 서로 다른 세부 수준을 나타내며 가장 높은 수준은 주요 이정표를 나타내고 가장 낮은 수준은 특정 작업을 나타냅니다.

WBS (작업분류체계)

- ✓ 팀원들이 참여하여 의견을 수렴한다. (전문가에게 전문 분야를 맡긴다.)
- ✓ 전체 프로젝트를 프로젝트 프로세스로 나눈다
- ✓ 각 파트의 주요 업무를 세부 업무로 나눈다.
- ✓ 세부 업무는 작업 기간이 3일 이상 되지 않도록 한다. 3일이 넘어가면 WBS의 효율성이 떨어지게 된다.
- ✓ 작업 패키지(WBS 최하위 단위)를 작성한다.
- ✓ 작업자를 배치한다.
- ✓ 시작일정과 종료일정을 작성한다.
- ✓ 반복적으로 진척률을 체크 하고 팀원과 조율한다.
- ✓ 진행사항을 체크하고 보고 한다.



WBS (작업분류체계)

Sample

표지 ▾ | 개정이력 ▾ | 일정표_V1.9 ▾ | 기획_진척률 ▾ | 디자인_진척률 ▾ | 퍼블리싱_진척률 ▾ | API_개발_진척률 ▾ | 화면_개발_진척률 ▾ | 요약정보 ▾

- WBS는 기획/디자인/퍼블리싱/개발로 구분할 수 있으며 작업의 구분에 따라 추가 될 수 있다.
- 요약정보에는 프로젝트 프로세스별 가중치를 작성할 수 있으며 각 단계별 진척률을 확인할 수 있다.

기준일은 진척률을 체크하는 시점의 날자를 작성한다.

														기준일	5/31							
							가중치	목표율	완료율	편차			계획					수행				
WBS	활동	역할	산출물	담당자	Check	100.00%	100.00%	94.06%	-5.94%	지연사유	만회일정	시작일	완료일	기간	고객검수	완료율	시작일	완료일	기간	고객검수	완료율
1	착수				완료	0.40%	0.40%	0.40%	0.00%			9/1	9/24	18	9/24	100.00%	9/1	9/24	18	9/24	100.00%

1. 일정표

- WBS : 일련번호로 작성한다.
- 활동 : 프로젝트 프로세스 명 작성
- 역할 : 고객사/수행사, 기획/디자인.. 같은 작업 역할을 작성한다.
- 산출물 : 활동 진행 후 작성되는 산출물명 작성한다.
- 담당자 : 진행하는 작업자의 성명을 작성한다.
- Check : 진척률에 따라 완료, 진행중, 대기로 자동 표시 된다.
- 가중치/목표율/완료율 : 가중치는 수기로 작성해야 한다. 목표율은 계획의 완료율과 가중치로 계산되고 완료율은 수행의 완료율과 가중치로 계산된다.
- 지연사유/만회일정 : 각 활동내역에 지연되는 업무가 있을때 지연사유를 작성하고 만회할 수 있는 일정도 작성한다.
- 계획(시작일/완료일/기간/고객검수/완료율) : 각 활동에 대한 계획 일정을 작성한다.
- 수행(시작일/완료일/기간/고객검수/완료율) : 각 활동에 대한 수행 일정을 작성한다.

기획 - 수행 진척률(App/Web)					진척률	100.00%	P1	100.00%	P2	100.00%		
최종업데이트 : 2021.10.25												
구분	Depth1	Depth2	Depth3	Depth4	담당자(주/부)	진행상태	진척률	시작일	완료일	작업일	검수일	구분
	Wireframe					완료	100.00%	9/6	11/30	62	12/30	P1
	검수					완료	100.00%	11/3	11/4	2	11/4	P1

2. 각파트별 업무 일정

- 각 파트별로 작업 업무를 상세화 할 수 있습니다.

WBS (작업분류체계)

프로젝트명	프로젝트명
PM	홍길동
주관기관	회사명
계약기간	프로젝트기간

진척률	
계획	100.00%
진행	94.06%
편차	-5.94%

단계별 진척률	계획	수행	편차
착수	0.40%	0.40%	0.00%
분석	2.00%	2.00%	0.00%
설계	10.00%	10.00%	0.00%
구현	65.60%	65.19%	-0.41%
테스트	12.90%	8.59%	-4.31%
전개	7.30%	6.08%	-1.22%
검수	1.10%	1.10%	0.00%
보고	0.70%	0.70%	0.00%

구분	버전	실완료율표기
PM확인	V0.6	60%
동료검토(디자인, 개발)	V0.7~0.9	70%~90%
고객검수(솔티드)	V1.0	100%


3. 요약정보

- 프로젝트명 : 프로젝트명을 작성한다.
- PM : PM의 이름을 작성한다.
- 주관기관 : 회사명을 작성한다.
- 계약기간 : 프로젝트 기간을 작성한다.
- 진척률 (계획/진행/편차) : 일정표의 진척률 항목을 자동으로 표시 한다.
- 단계별 진척률 : 일정표의 가중치 항목을 자동으로 표시 한다.
- 작업 완료 별 진척률 체크
  - 60% : PM 확인
  - 70% ~ 90% : 동료검토
  - 100% : 고객검수(최종 검수)

Milestone


Sample

- 중요한 시점의 일정을 심플하게 작성 한다.
- 각 프로세스의 완료 시점은 명확하게 표시 한다.
- 주요 보고서에 삽입하여 보고 한다.

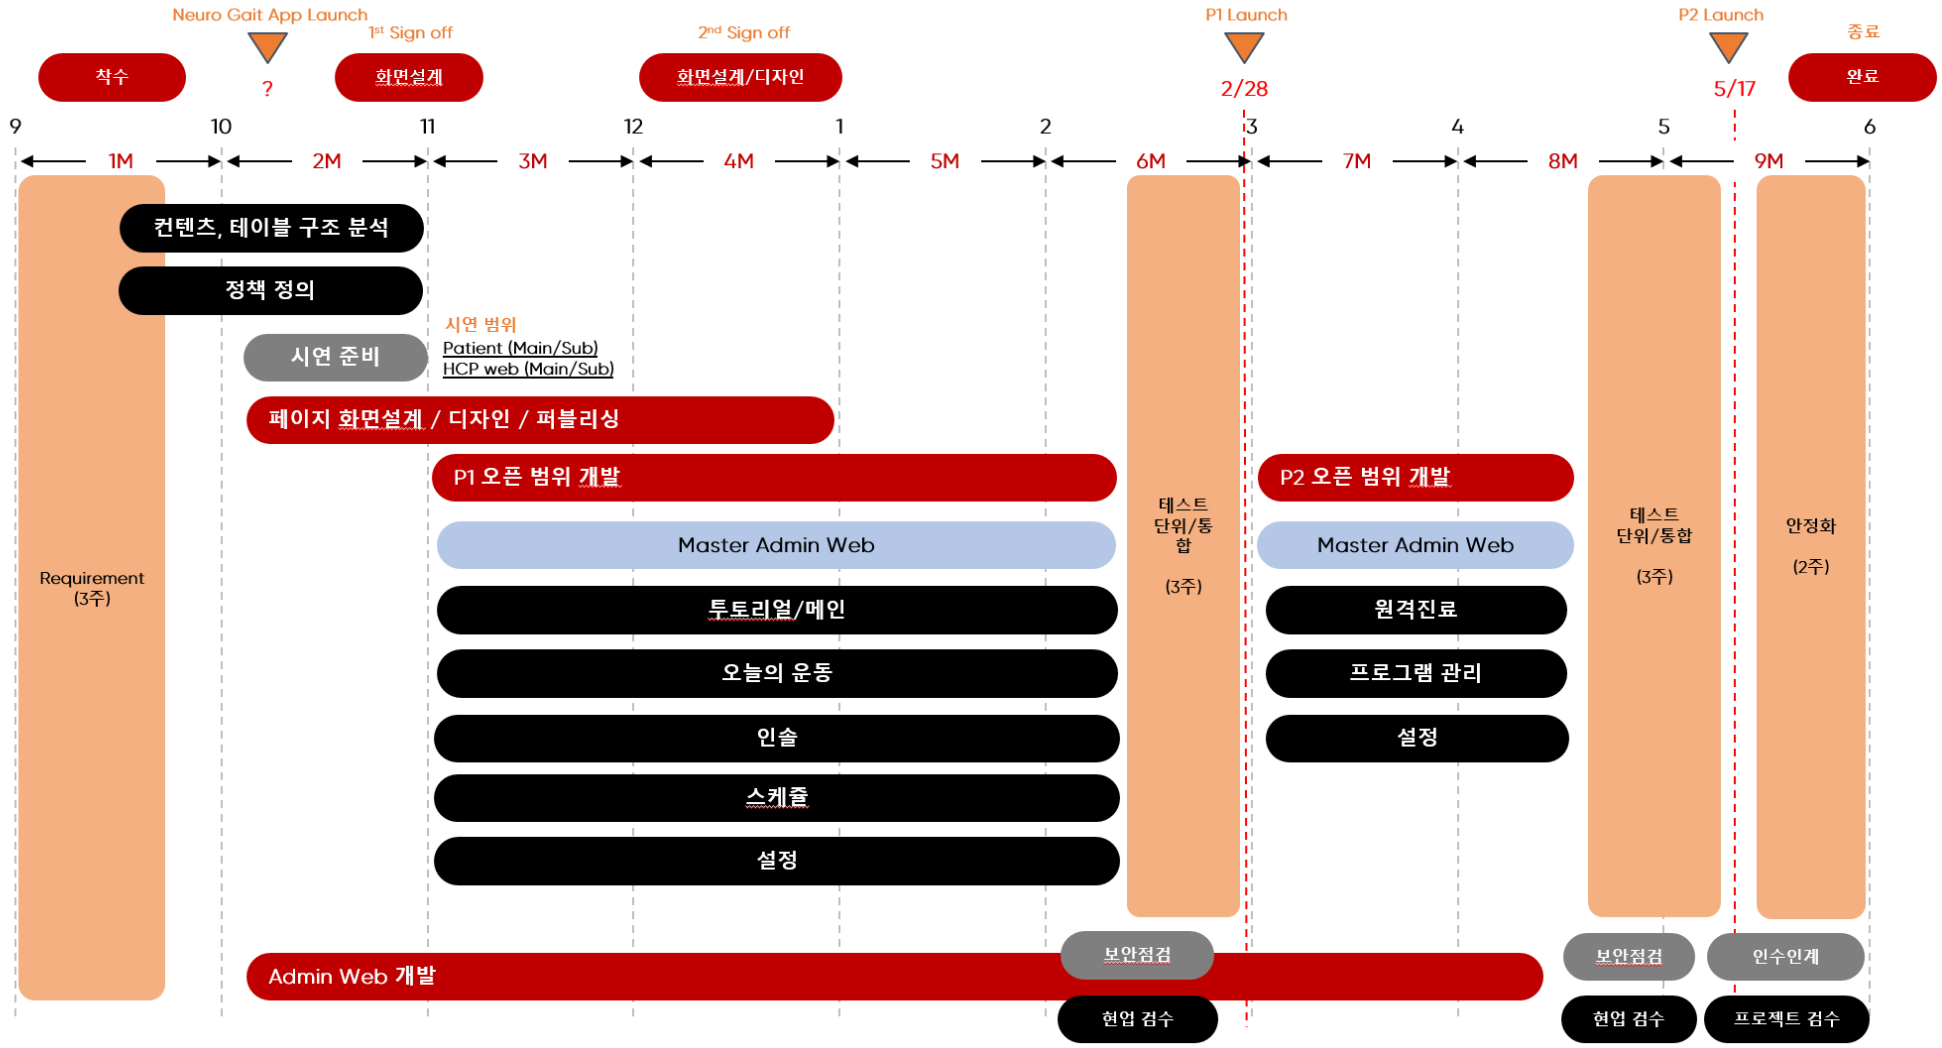

위험관리대장

"Tomorrow problems are today's risk."

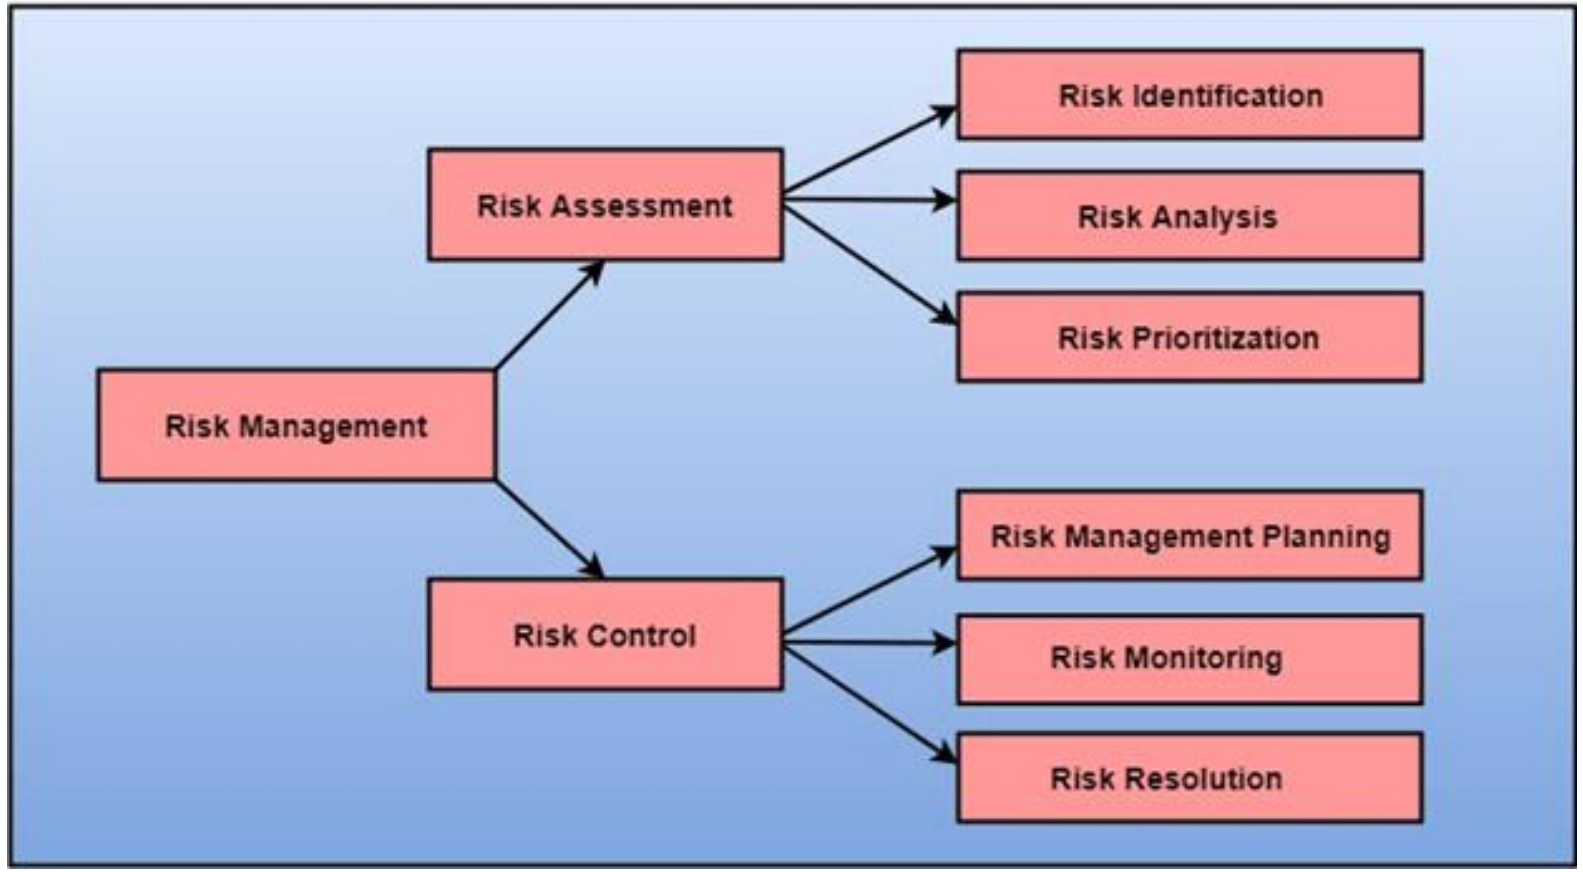

위험관리대장


Sample

위험 ID	식별일자	종료일자	위험명	발생가능성	영향도	위험등급	우선순위	담당자	위험처리 계획 및 결과	현상태	처리방법
RM-001	5/30	6/1	사업 추진 완료일 미 준수	높음	상	상	상	홍길동	사업 추진 일정에 맞는 일정 및 범위관리	종료	

- 위험ID : 일련번호로 작성한다.
- 식별일자 : 위험요소 식별일을 작성 한다.
- 종료일자 : 위험요소 종료일을 작성 한다.
- 위험명 : 위험요소 내용을 작성한다.
- 발생가능성 : 발생가능성을 선택 한다. (높음, 보통, 낮음)
- 영향도 : 위험이 이슈가 되었을때 프로젝트에 미치는 영향도를 체크 한다. (상, 중, 하)
- 위험등급 : 위험요소의 등급을 선택 한다. (상, 중, 하)
- 우선순위 : 위험조치의 우선순위를 선택 한다. (상, 중, 하)
- 담당자 : 위험처리 담당자를 작성한다.
- 위험처리 계획 및 결과 : 위험처리 계획 및 결과 내용을 작성한다.
- 현상태 : 위험요소 현재 상태를 선택 한다 (종료, 진행중)

사업수행계획서 / 착수보고서

프로젝트를 수행하기 전에 계획을 세우는 단계에서 작성하는 문서

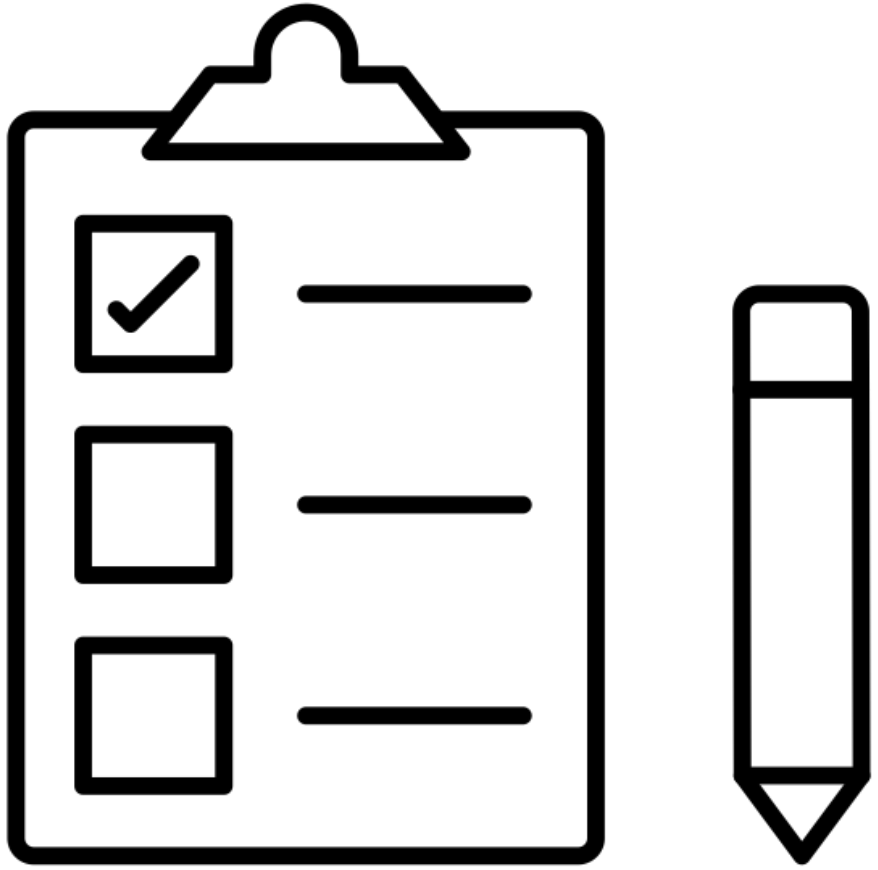

사업수행계획서 / 착수보고서

Sample


Sample

1. 작성 시점

- 사업수행계획서는 프로젝트 투입 시점에 작성하여 제출 하거나 2주 이내 작성을 요청 합니다.
- PM이 모든 내용을 이해 하고 작성해야 하며, 보통 제안서의 내용이 축약적으로 작성합니다.
- 기본적으로 사업수행계획서는 착수보고서와 내용이 동일 합니다.

2. 목차

- 사업개요 : 프로젝트에 대한 내용과 간단한 설명, 프로젝트 팀원의 조직도의 내용이 추가 됩니다.
- 사업추진 체계 및 추진일정 : 사업 추진 조직도와 추진 일정을 작성 합니다.
- 사업계획 : 사업 추진 계획을 작성 합니다.
- 산출물 계획 : 업무 기간별 산출물과 최종 보고서 제출 목록을 작성 합니다.
- 보고 계획 : 보고의 체계와 보고 일정을 작성 합니다.
- 품질관리 계획 : 품질 관리 전략과 품질보증 절차를 작성 합니다.
- 보안대책 : 보안 관리 개요와 대상별 자료 관리 대책을 작성 합니다.
- 교육계획 : 교육 훈련 조직과 교육 훈련 계획, 교육훈련 절차 및 방법을 작성 합니다.

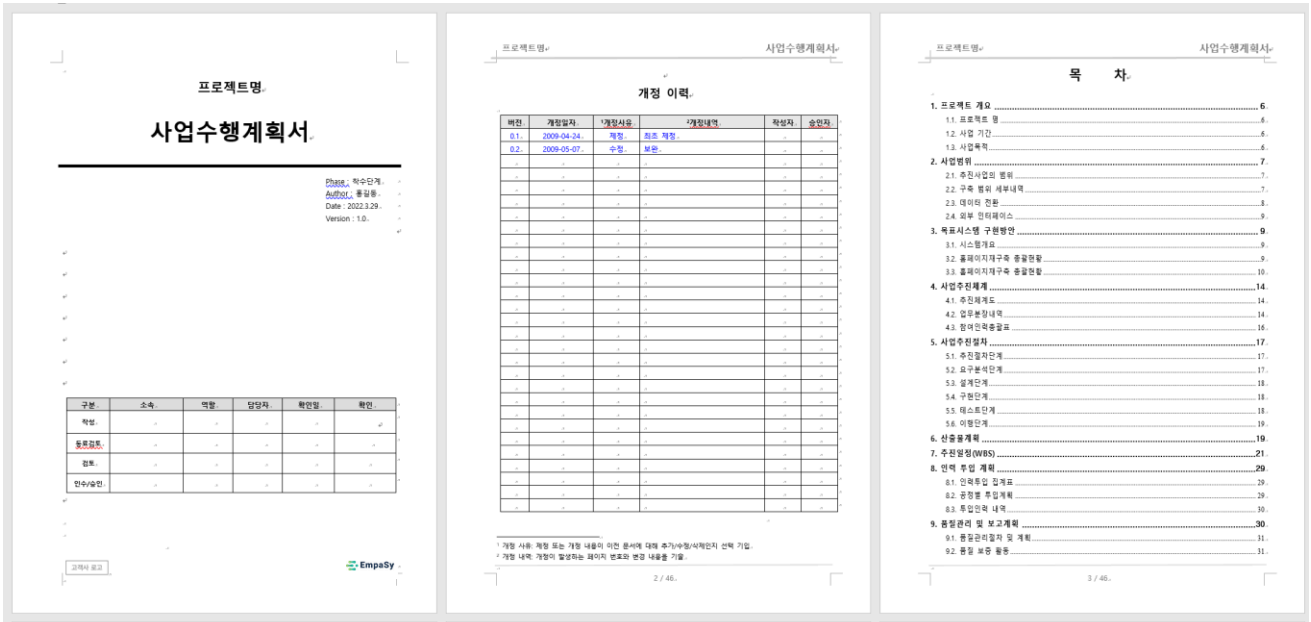




화면설계서

화면을 어떻게 표현할지를 그려놓은 와이어프레임과 기능을

구현하기 위해 작성하였던 기능 정의서를 합쳐놓은 것

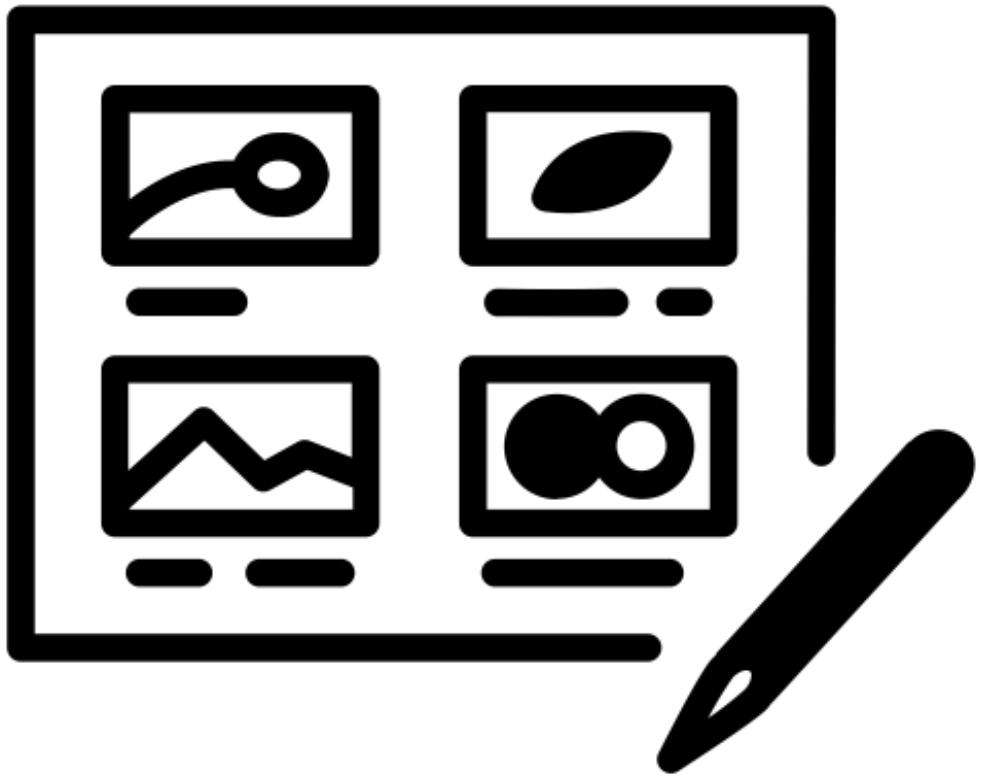

화면설계서

Sample

1. 작성 시점과 검토 시점


- 요구사항 분석이 완료 된 이후 화면설계서를 작성 합니다.
- 화면설계서는 고객과 협의 진행 전에 동료 검토가 필수 입니다. (디자인/퍼블리싱/개발 담당자와 동료 검토를 진행 합니다.)

2. 버전/수정 이력

- 버전별 변경 내역을 작성하고 수정 요청한 근거를 남긴다.


3. 화면설계서 작성

- 화면 이름 : 화면의 이름을 작성 한다.
- 화면 경로 : 화면의 메뉴구조 단위 경로를 작성 한다.
- 화면 : 와이어프레임을 추가 한다.
- Description : 각 화면에 대한 상세한 설명을 작성 한다.

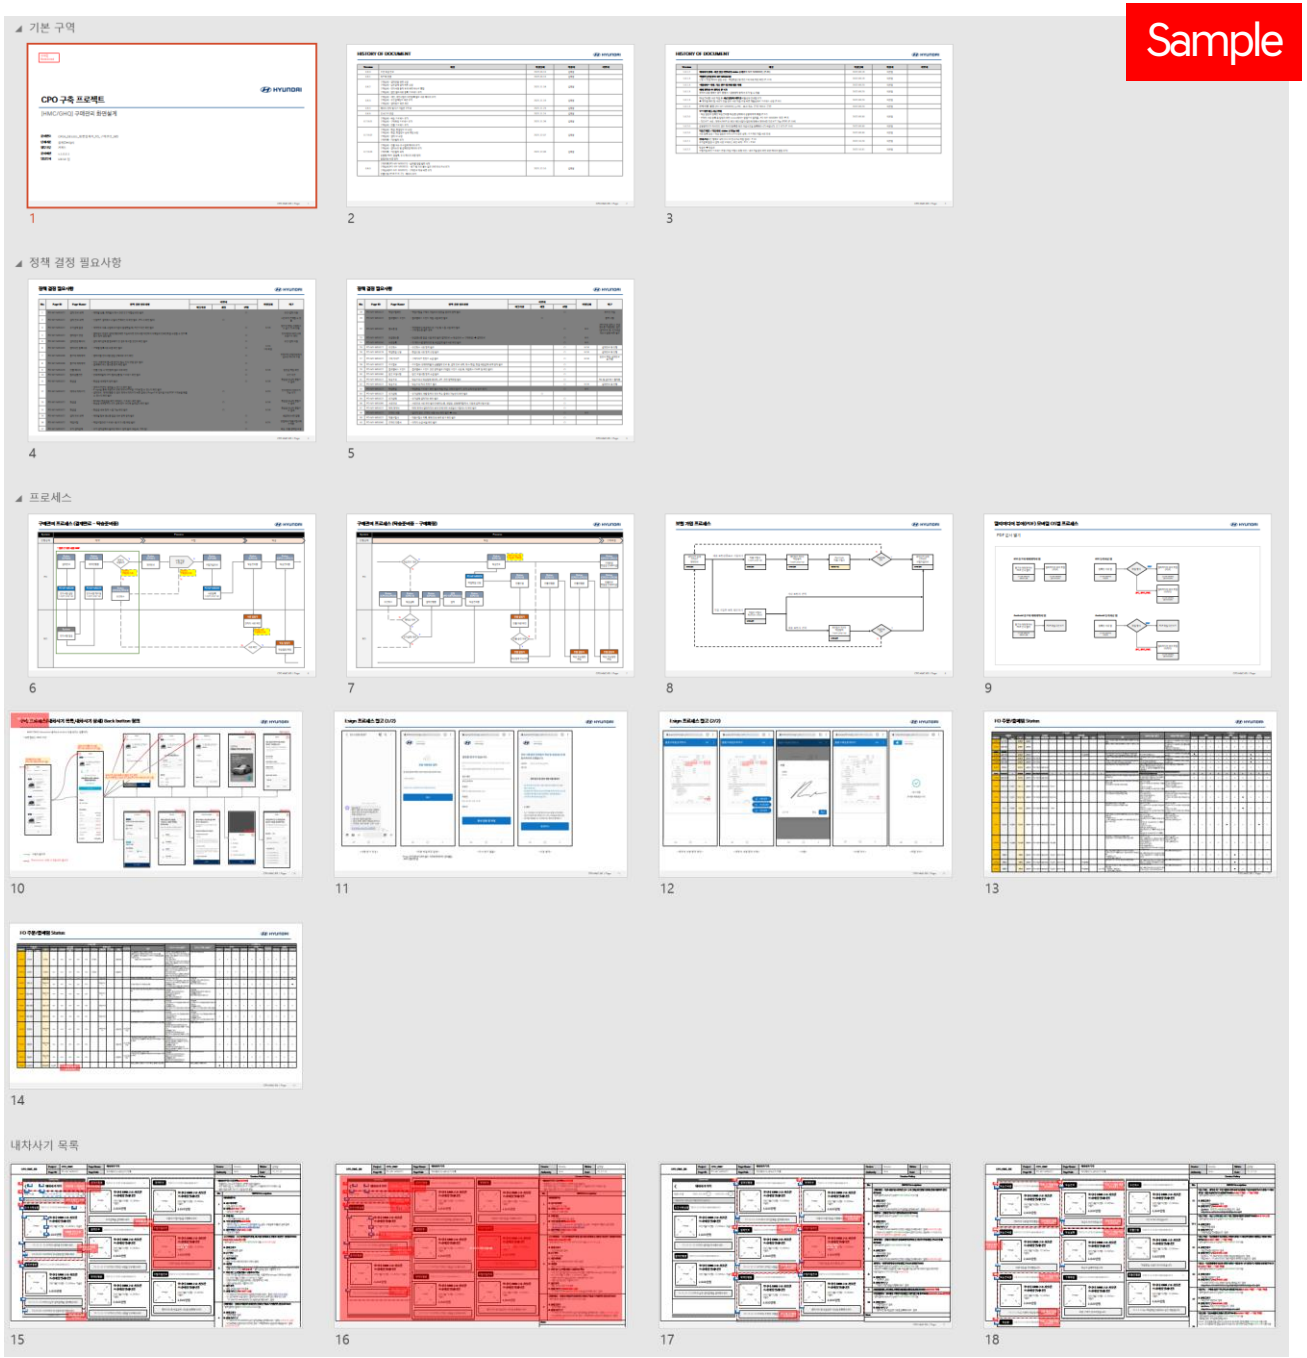

서비스 프로세스

서비스가 전달되는 절차/과정이나 활동들의 흐름

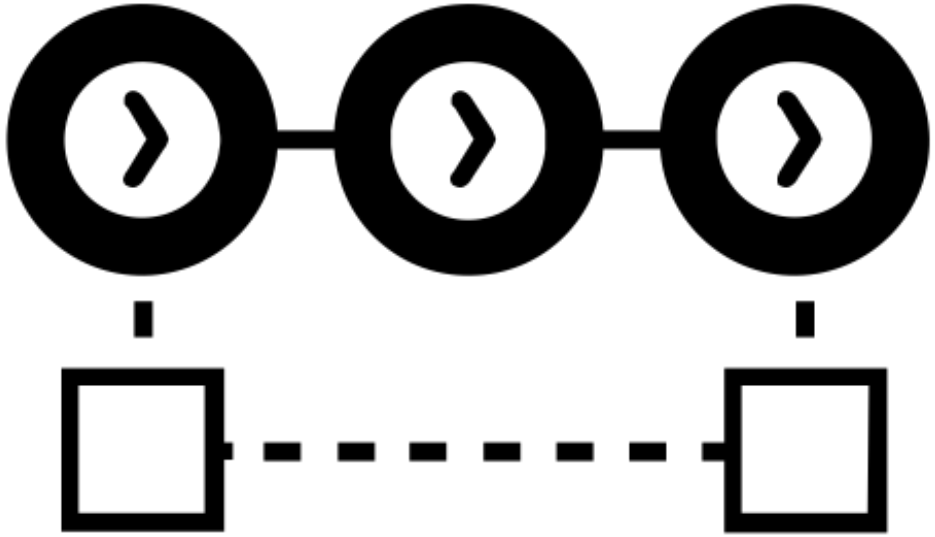

서비스 프로세스

1. 작성 시점과 검토 시점


- 화면설계서 작성 전에 전체적인 서비스의 흐름을 이해하기 위해 작성 한다.
- 서비스 프로세스는 고객과 협의 진행 전에 동료 검토가 필수 입니다. (디자인/퍼블리싱/개발 담당자와 동료 검토를 진행 합니다.)

2. 서비스 프로세스 작성


- 진행사애 : 서비스의 흐름 단위를 작성한다.
- 서비스명 : 서비스의 이름을 작성한다.

Sample

판매관리 프로세스 (시세조회 ~ 견적수신)

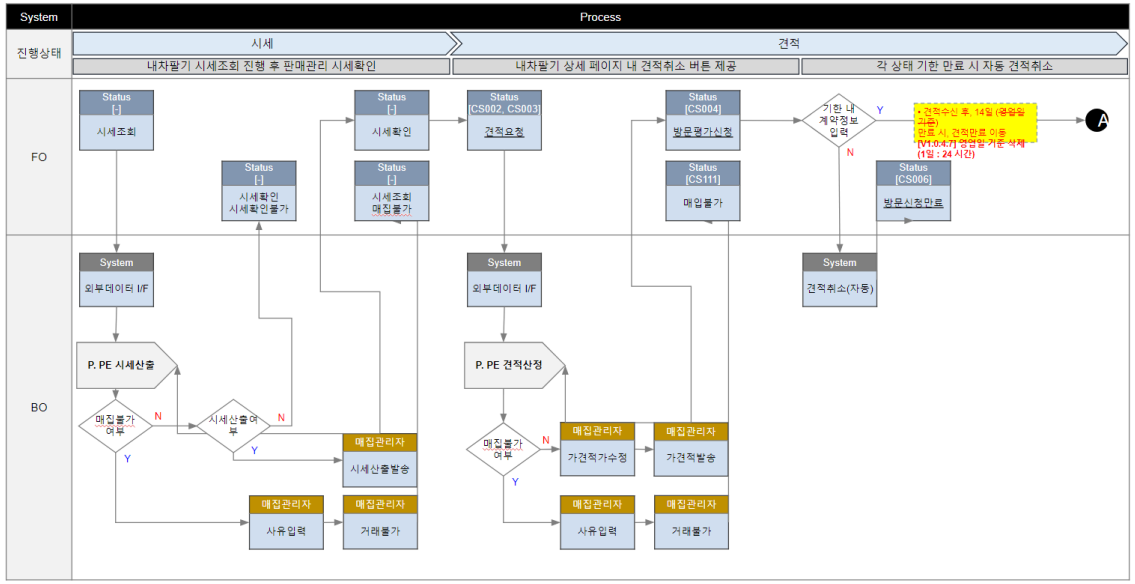

판매관리 프로세스 (방문평가요청 ~ 최종견적확인)

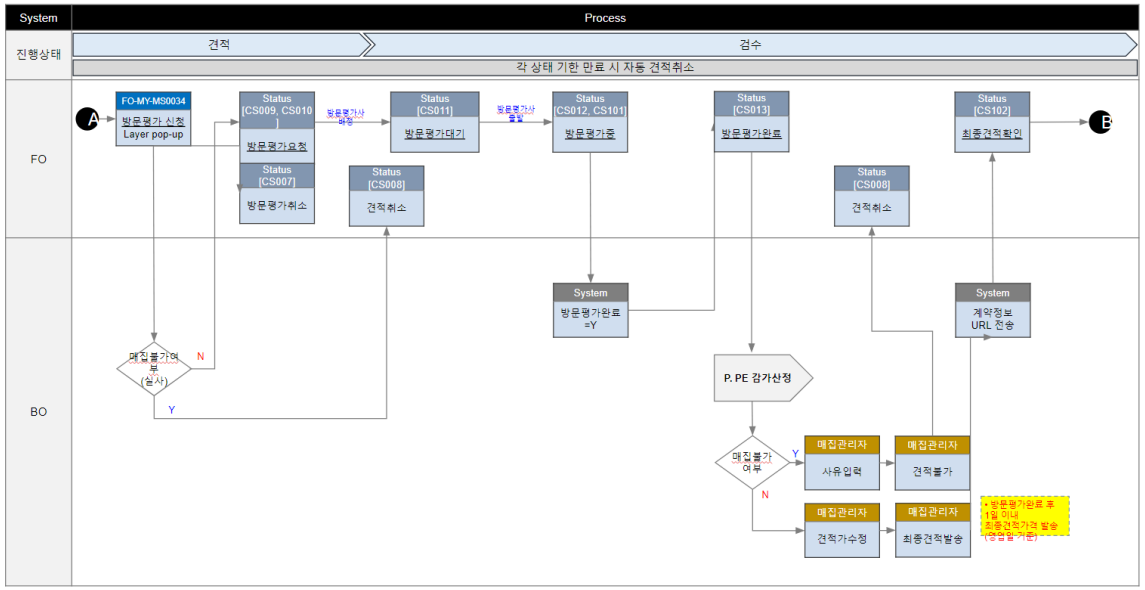

보고서 (주간/월간/완료)

이해관계자들과 커뮤니케이션 도구



주간업무보고

Sample

- 주간업무보고는 내부 보고와 고객 보고로 나누어 작성 합니다. (주간보고는 내부보고와 고객보고로 나누어 진행 합니다.)
- 전체 진척률을 작성 하여 현재 진척률을 확인합니다.
- 각 파트별 금주/차주 업무 내역을 작성하고 각 작업에 대한 진척률을 작성 합니다.
- 지연되는 업무가 있다면 업무 내용을 작성 하고 대책 방안을 마련하여 보고 합나다.
- 현업에게 수급해야 하는 콘텐츠의 경우 미수급된 항목이 있다면 작성하여 콘텐츠 수급을 요청 합니다.
- 체크해야할 사항이 있다면 체크리스트에 작성하고 체크리스트 내용을 공유 합니다.
- 이슈사항이 발행 했을때는 해결되기 전까지 주단위로 보고하여 진척 사항을 보고 합니다.
- 주간업무보고가 끝나면 주간업부보고 이후 이슈하항을 작성하여 이해관계자들과 공유 합니다.

NEUROGAIT 주간 업무보고서

프로젝트명	솔티드 원격 모니터링(App 및 Web) 시스템 개발	참여 업체	솔티드(주), (주)픽스프레임	작성자	각 파트 PL

진행단계	계획 진척율	실제 진척율	비고	
착수	100.00%	100.00%		
분석	100.00%	100.00%		
설계	100.00%	100.00%		
구현	100.00%	99.39%		
테스트	100.00%	66.66%		
전개	100.00%	83.33%		
검수	100.00%	100.00%		
보고	100.00%	100.00%		
전체 진척율	100.00%	94.08%	편차	-5.92%

기간		금주 진행 실적(2022.5.23 ~ 2022.5.27)		차주 추진 계획(2022.5.30 ~ 2022.5.31)	
구분	담당자	내용	진척율	내용	예상 진척율
관리	김상환	프로젝트 진척률 관리	상시	프로젝트(픽스프레임) 종료	100.00%
		검수 확인서(픽스프레임) 전달	100.00%		
		완료보고서(픽스프레임) 작성	100.00%		
				완료보고(픽스프레임)	100.00%
기획	정수화	QA 디버깅 항목 확인 및 대응	상시	프로젝트(픽스프레임) 종료	100.00%
	유병규	테스트	상시	테스트	상시
	제갈훈	테스트	상시	테스트	상시
디자인	박지혜	디자인 F/U	상시	디자인 F/U	상시
퍼블리싱	조영기	퍼블리싱 F/U	상시	퍼블리싱 F/U	상시
개발	강경훈				
	이용철	**HCP App, Patient App** - QA 관련 이슈 대응	상시	**HCP App, Patient App** - QA 관련 이슈 대응	상시
		HCP Web - QA 관련 이슈 대응	상시	**HCP Web** - QA 관련 이슈 대응	상시
		Master Admin API - 개발 이슈 대응	상시	**Master Admin API** - 개발 이슈 대응	상시
		스케줄링 서버 분리 작업	70.00%	**스케줄링 서버 분리 작업**	70.00%
		서버 성능 개선 작업 - CloudStorage 정보 등 서버 정보 메모리 액세스 처리	100.00%		
	최성찬	**HCP App, Patient App** - 개발 진행 관련 피드백 (상시)	상시	**HCP App, Patient App** - 개발 진행 관련 피드백 (상시)	상시
		HCP App - 1.01.09 스토어 등록 완료(https://rdm.salted.ltd/issues/6701)	100.00%		
				Patient App - Android 및 iOS 스토어 등록	0.00%
	전병용	**Patient APP Web** - 레드마인 이슈 수정	상시	**Patient APP Web** - 레드마인 이슈 수정	상시
		Patient APP Native - 레드마인 이슈 수정	상시	**Patient APP Native** - 레드마인 이슈 수정	상시
		HCP Web - 레드마인 이슈 수정	상시	**HCP Web** - 레드마인 이슈 수정	상시
		Master Admin - 알림 설정 기타 화면 연동 및 API 검증	50.00%	**Master Admin** - 알림 설정 기타 화면 연동 및 API 검증	0.00%
테스트	유희상	**HCP App - iOS** - 스토어 버전 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록 - 스테이지 버전 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록	상시	**HCP App - iOS** - 스토어 버전 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록 - 스테이지 버전 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록	상시
		Patient App - iOS,Android QA - Resolved 이슈 처리 - 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록	상시	**Patient App - iOS,Android QA** - Resolved 이슈 처리 - 특이사항 발생시 디버깅 리스트 등록	상시
		Master Admin - 기획 변경시 Test case 수정	상시	**Master Admin** - QA 진행	0.00%
		HCP Web - Resolved 이슈 처리	상시	**HCP Web** - Resolved 이슈 처리	상시
업무 지연(변경) 사유 및 대책방안		업무 지연(변경) 사유		대책 방안	
컨텐츠 수급 현황		금주 수급 요청 항목		차주 수급 예정 항목	

체크사항	**HCP Web & Patient App 오픈 일정 협의** - 전체 오픈 : 5/30 - 레드마인 일감 확인 - 기획 수정사항 확인 - 다국어(영/중) 적용 협의 **- 도메인 : salted.neurogait.ai** **Master Admin 일정 확인** - 개발 완료 : 5월 - QA : 6월 부터 진행

이슈사항	내용	대책 방안	만회 예정일


주간업무보고 이후 이슈사항	**1. 관리** - 픽스프레임 5월 용역 일정 종료로 검수확인서 전달 완료 **2. 기획** - 추가 개선사항 설계 서포트 중 - QA 지원(테스트 서포트) **3. 디자인** - 디자인 F/U **4. 퍼블리싱** - 최종 산출물 전달 완료 (강경훈이사님 검토 요청) **5. 개발** **1. 관리** - 픽스프레임 5월 용역 일정 종료로 검수확인서 전달 완료 **2. 기획** - 추가 개선사항 설계 서포트 중 - QA 지원(테스트 서포트) **3. 디자인** - 디자인 F/U **4. 퍼블리싱** - 최종 산출물 전달 완료 (강경훈이사님 검토 요청) **5. 개발** - 서버 * 서버 성능개선 : 금주 완료 예정 * 스케줄링 서버 분리 : 차주 완료 목표 - HCP App * 1.01.09 버전 마켓 등록 완료 - HCP Web * 다국어를 제외하고 모두 처리 완료 * 5/30 오픈(salted.neurogait.ai) - Master Admin * Master Admin 일정 : 5월 개발 완료 6월부터 QA 진행 * QA : 6/7 부터 가능 - Patient App 개발 * 디버깅 진행 (금주 완료 예정) * 5/30 재 오픈 **6. QA** - HCP Web 오늘 수정/삭제 확인 완료 - 개선사항/추가작업은 레드마인 일감 Postpone 로 변경 (이후 고도화 진행) **7. 공통** - 코로나 개인 위생 강화 필요

© Fixframe Inc. All rights reserved.

월간업무보고

Sample

- 월간업무보고는 주간업무보고의 내용 중 주요 결정사항, 이슈사항을 위주로 보고 합니다.
- 특히 고객의 결정사항들은 다시 한번 결정된 내용을 확인 함으로써 근거자료를 만들 수 있습니다.
- 전체 진척률은 WBS에 있는 내용을 작성 합니다.

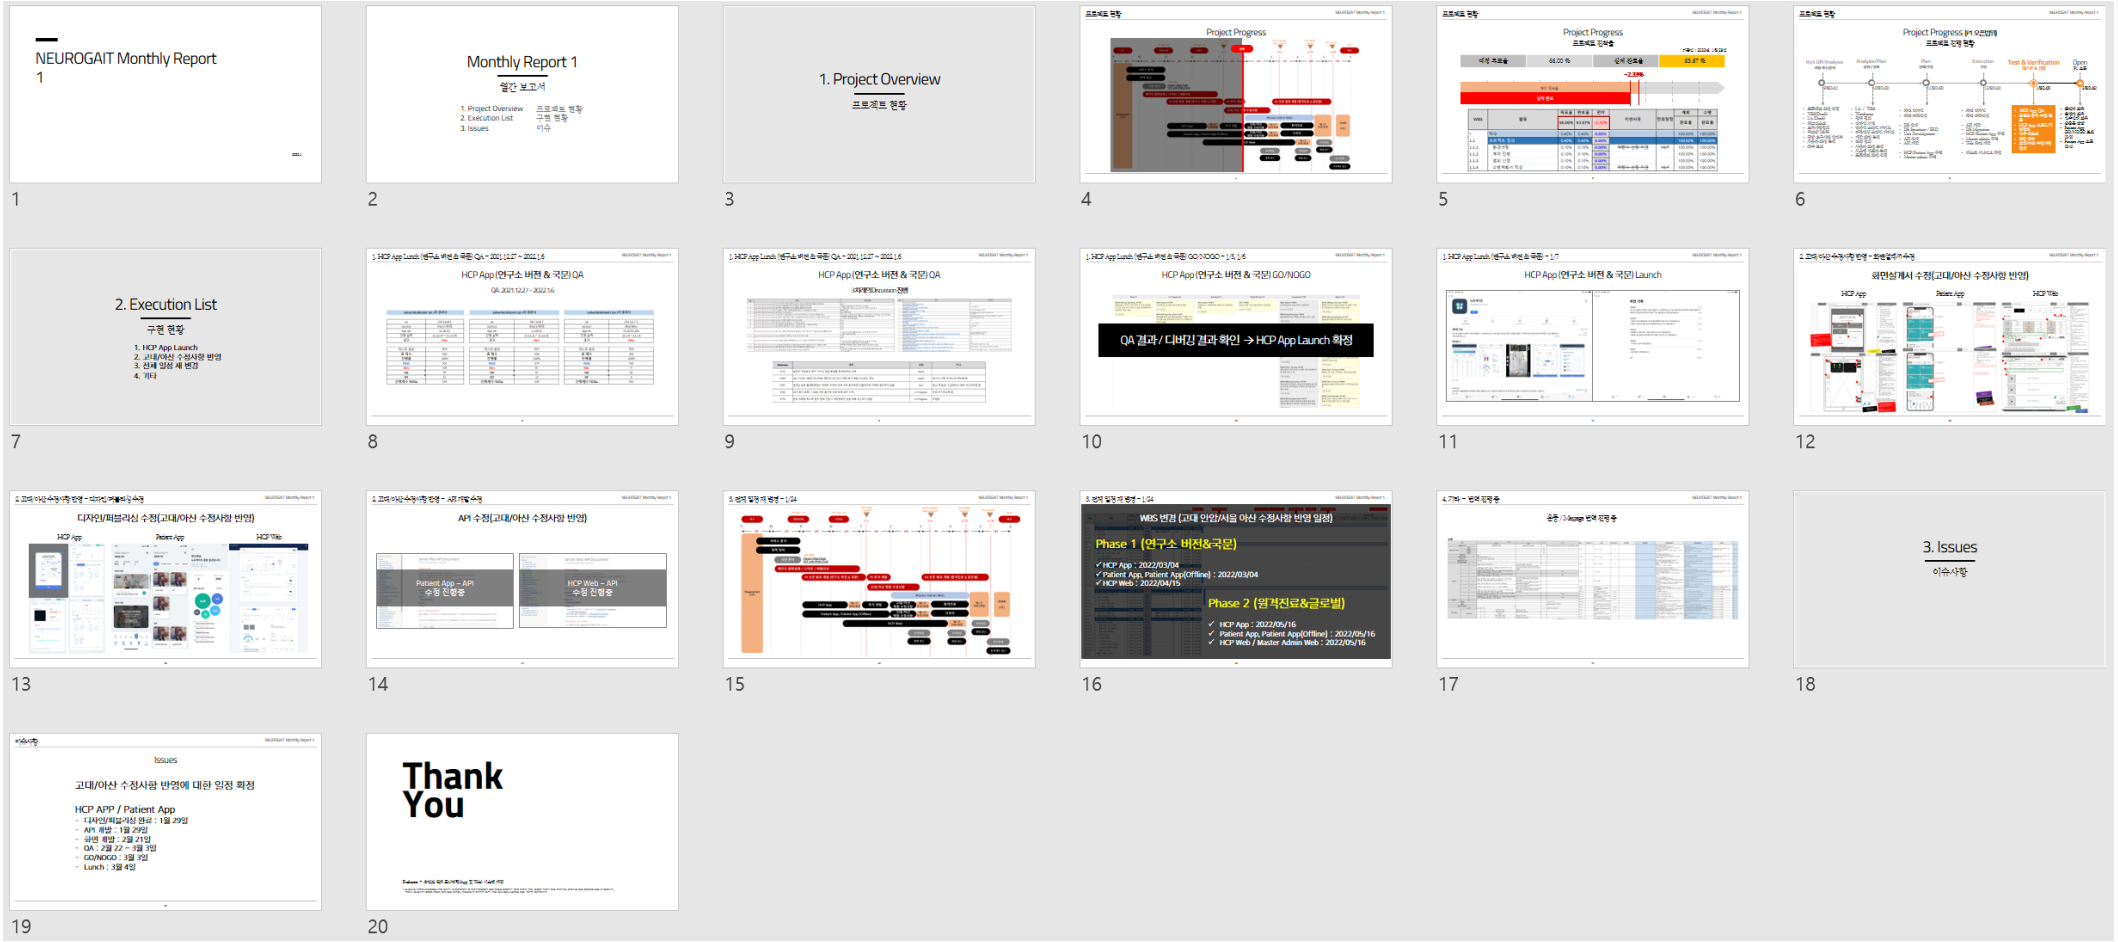

완료업무보고

Sample

- 완료보고는 전체 업무가 완료된 시점에 보고 합니다.
- 전체 범위와 프로젝트 일정 등을 보고 합니다.



Thank You

* 본 문서는 지정된 수신인만을 위한 것이며, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다.
따라서, 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제 3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
